



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS



DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

METRO

***Informe de Ejecución
del Programa de
Inversiones Públicas
No Financieras***



Vigencia 2013



República de Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Programación de Inversiones

**Informe de Ejecución del Programa de
Inversiones Públicas No Financieras**



VIGENCIA 2013



Excelentísimo Señor
JUAN CARLOS VARELA RODRÍGUEZ
Presidente de la República



Su Excelencia
DULCIDIO DE LA GUARDIA
Ministro de Economía y Finanzas

S.E. DULCIDIO DE LA GUARDIA
MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

S.E. IVÁN A. ZARAK ARIAS
VICEMINISTRO DE ECONOMÍA

S.E. EYDA VARELA DE CHINCHILLA
VICEMINISTRO DE FINANZAS

MARTHA PATRICIA DE GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL

AURELIO MEJÍA R.
DIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Octubre 2014

EQUIPO TÉCNICO

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Aurelio Mejía R. -Director

Oliver Serrano-Subdirector

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PROYECTOS

Walter Santiago

Área de Análisis de Proyectos Sociales, Administrativos y de Justicia

Katia Araúz

Vielka Serracín

Kathia Castillo

Manuel Bernal

Osvaldo Sánchez

Eladio Acosta

Edgardo Hernández

Armando Rosales

Emanuel Quiroz

Área de Análisis de Proyectos de Infraestructura, Productivos y de Ambiente

Melisa Barraza

Julio Miranda

Rodrigo Pastor

Yessenia González

Celina Flores

Yira Rodríguez

Lourdes Arjona

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Fabio Bedoya

Área de Financiamiento del Programa de Inversiones

Dalila Rodríguez

Ángela Domínguez

Giankarlo Vásquez

Lisette Gutiérrez

Área de Formulación y Seguimiento del Programa de Inversiones

Luis Carlos Batista

Tatiana Lombardo

DEPARTAMENTO DE BANCO DE PROYECTOS

Arístocles Castillo

Sección de Administración de Base de Datos y

Soporte Técnico

Águeda Rodríguez

Fanny Montenegro

Sección de Desarrollo de Sistemas de Información e Información Georeferenciada

Ernesto Bal

Katherine Centeno

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Armando Calderón

Área de Organización Procesos y Procedimientos

Evelyn Rodríguez

Área de Capacitación y Metodología

Indra Pineda

Diego Aguilar

Fernando Ruíz

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	13
I. CAPACIDAD Y EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	15
A. Capacidad de las Inversiones Públicas No Financieras	15
B. Evolución y Desempeño del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras 1995-2013	16
C. La Evaluación de la Inversión Pública: Una necesidad	19
II. PROYECTOS IMPERDONABLES	21
A. Aspectos Generales	21
B. Avance Presupuestario y Físico de los Proyectos Imperdonables	21
III. DISTRIBUCIÓN, AJUSTE Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS	27
A. Distribución de Ajustes Presupuestarios	27
1. Según Institución	27
2. Según Sector y Ubicación Geográfica	29
3. Según Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento	33
B. Ejecución Presupuestaria	34
1. Según Área Institucional	34
1.1 Gobierno Central	35
1.2 Instituciones Descentralizadas	36
1.3 Empresas Públicas	38
1.4 Intermediarios Financieros	38
2. Según Objeto de Gasto	39
3. Según Fuente de Financiamiento	40
4. Según Tipo de Inversión	42
4.1 Inversiones en Infraestructura	43
4.2 Inversiones en Equipamiento	44
4.3 Préstamos Financieros	45
IV. EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS POR SECTOR	47
A. SECTOR SALUD	49
1. Ministerio de Salud	50
2. Caja de Seguro Social	52
3. Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	53
4. Ministerio de Educación	55
B. SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA	57
1. Ministerio de Educación	58
2. Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano	60
3. Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos	60

C.	SECTOR VIVIENDA.....	61
	1. Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial	62
	2. Banco Hipotecario Nacional	62
D.	SECTOR TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL	63
	1. Ministerio de la Presidencia	64
	2. Ministerio de Desarrollo Social	64
	3. Ministerio de Economía y Finanzas	65
E.	SECTOR TRANSPORTE	66
	1. Ministerio de Obras Públicas	67
	2. Ministerio de la Presidencia	68
	3. Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre	70
	4. Autoridad de Aeronáutica Civil	70
	5. Autoridad Marítima de Panamá	71
	6. Autoridad de Turismo de Panamá	71
F.	SECTOR ENERGÍA	72
G.	SECTOR TELECOMUNICACIONES.....	74
H.	SECTOR AGROPECUARIO	75
	1. Ministerio de Desarrollo Agropecuario	76
	2. Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	77
	3. Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá	77
	4. Ministerio de la Presidencia	78
I.	SECTOR COMERCIO, INDUSTRIAS Y TURISMO	79
	1. Ministerio de la Presidencia	80
	2. Autoridad de Turismo de Panamá	81
	3. Instituto de Mercadeo Agropecuario	81
	4. Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	82
	5. Ministerio de Comercio e Industrias	82
	6. Zona Libre de Colón	83
J.	SECTOR FINANZAS	84
	1. Banco de Desarrollo Agropecuario	84
	2. Banco Hipotecario Nacional	85
	3. Instituto de Seguro Agropecuario	85
K.	SECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	86
L.	SECTOR JUSTICIA	88
	1. Ministerio de Gobierno	89
	2. Órgano Judicial	89
M.	SECTOR MINERÍA	90
N.	SECTOR PROTECCIÓN CIUDADANA	91
O.	SECTOR AMBIENTE	93

V.	PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS POR ÁREA GEOGRÁFICA	95
A.	Ejecución Presupuestaria y Física a Nivel de Sector de las Inversiones Públicas No Financieras Provinciales y Comarcales	95
	1. Provincias	96
	1.1 Bocas del Toro	97
	1.2 Coclé	98
	1.3 Colón	99

1.4	Chiriquí	100
1.5	Darién	101
1.6	Herrera	102
1.7	Los Santos	103
1.8	Panamá	104
1.9	Veraguas	106
2.	Comarcas	107
2.1	Comarca Emberá Wounaan	107
2.2	Comarca Madugandí	108
2.3	Comarca Wargandí	109
2.4	Comarca Guna Yala	110
2.5	Comarca Ngöbe Buglé	111
VI.	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FINANCIADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES	113
A.	Misiones Atendidas	113
B.	Evaluaciones de Programas y Proyectos	113
C.	Análisis de la Situación Actual de los Proyectos	113
1.	Proyectos en Formulación	113
2.	Proyectos en Ejecución	114
3.	Ejecución Presupuestaria 2013	115
4.	Ejecución de programas destacados por Sector	116
4.1.	Sector Salud	117
4.1.1	Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá	117
4.1.2	Proyecto Agua Potable y Saneamiento (PASAP)	118
4.1.3	Programa unificado de Desarrollo Sostenible en el sector de Agua y Saneamiento I y II	120
4.2	Sector Agropecuario	121
4.2.1	Productividad Rural (PRORURAL)	121
4.2.2	Proyecto de Desarrollo Participativo y Modernización Rural (PARTICIPA)	122
	CONCLUSIONES	123
	ANEXOS	125
Anexo N° 1	Situación de las Evaluaciones de los Proyectos	127
Anexo N° 2	Proyectos con Financiamiento Externos en Ejecución por Sector	128
Anexo N° 3	Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras, según Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto por Sector	140
Anexo N° 4	Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas no Financieras, según Sector e Instituciones que lo componen	150
	LISTADO DE CUADROS Y GRÁFICAS	155
	CUADROS	155
	GRÁFICAS	158
	GLOSARIO	159

INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar cumplimiento a las Normas Generales de Administración Presupuestaria, contenidas en la Ley N°71 del año 2012, por la cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2013, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección de Programación de Inversiones (DPI), en su Informe de Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras, muestra de manera detallada los recursos asignados en el Presupuesto de Inversiones a las Instituciones Públicas No Financieras por sector, su ejecución física y financiera, según los objetivos, metas y estrategias establecidas en los planes, programas y proyectos elaborados a nivel nacional.

La Ejecución de las Inversiones Públicas No Financieras, plasmadas en este documento corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013 y muestran el presupuesto asignado, su distribución, financiamiento y ejecución, complementado con cuadros, gráficas y figuras ilustrativas, con comentarios e información relevante de los proyectos. La información compilada en este informe es producto de un plan de inversiones debidamente priorizado y programado, lo cual es un elemento fundamental en el fortalecimiento del proceso de planificación que a la vez permite promover la optimización de la inversión pública.

El Sistema Integrado de Administración Financiera de Panamá (SIAFPA), que funciona en el Ministerio de Economía y Finanzas, es la entidad encargada de proporcionar los datos presupuestarios, que se utilizan para la elaboración de este informe, esta herramienta informática ha sido diseñada y desarrollada para apoyar el manejo de la administración financiera del sector público panameño de acuerdo a normativas y procedimientos legales vigentes. Para la ejecución física de los proyectos y programas, son las instituciones ejecutoras las encargadas de proporcionar la información a la vez que se complementa con visitas de inspección y monitoreo de campo, realizadas por personal técnico de la Dirección de Programación de Inversiones del MEF.

Este informe no contempla las actividades financieras realizadas por las Empresas Financieras del Estado como la Caja de Seguro Social (CSS), el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA), Banco Nacional de Panamá (BNP) y la Caja de Ahorros (CA).

Este documento, lo componen seis (6) capítulos con sus respectivos anexos, los cuales se detallan a continuación: El Capítulo 1, muestra la Capacidad y Evolución de las Inversiones Públicas No Financieras, correspondiente al período 1995 – 2013, así como la Evaluación de la Inversiones Públicas que reflejan la necesidad de la inversión en cada programa y proyecto.

En el Capítulo 2, se plasman el avance físico y financiero de los proyectos Imperdonables en diferentes sectores como: salud, educación, viviendas, seguridad, infraestructura, entre otros.

La distribución, ajustes y ejecución presupuestaria de las Inversiones Públicas No Financieras, se describe en el Capítulo 3, por institución, según sector y ubicación geográfica. También, se presenta el comportamiento de los ajustes presupuestarios por objetos del gasto, sus fuentes de financiamiento y tipo de Inversión. Con este análisis, se busca mayor eficiencia y optimizar el gasto de la inversión pública.

La ejecución física de las Inversiones Públicas No Financieras por sector se analizan en el Capítulo 4 considerando el detalle de la inversión según la clasificación de sectores establecidos por el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) e instituciones que lo componen.

El presupuesto de las Inversiones Públicas No Financieras por área geográfica (provincial y comarcal) se detallan en el Capítulo 5, considerando también la Inversión per cápita para dichas áreas, incluye a su vez, mapas que describen la posición regional, presupuesto y el número de habitantes.

El Capítulo 6 está designado a la formulación y seguimiento de la ejecución de los proyectos de Inversión Pública Financiados por los Organismos Multilaterales de Crédito. El mismo, analiza, las misiones atendidas por el Estado en materia de inversión, hace un recuento de la situación actual de los proyectos, destacando los proyectos en formulación, los que están en ejecución y su respectiva ejecución presupuestaria. Además, analiza como ha sido la distribución del financiamiento externo por sector.

CAPÍTULO I

I. CAPACIDAD Y EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS

A. CAPACIDAD DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS

La capacidad de inversión del país en los últimos años ha ido creciendo debido al incremento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que ha permitido al Gobierno Nacional, mantener durante estos 4 años un constante incremento de las inversiones tanto sociales como en infraestructura.

Esta capacidad que ha tenido el país de ejecutar su programa de inversiones está cada vez más ligada a los ingresos totales percibidos por el Gobierno Central, los cuales alcanzaron una cifra de B/. 6,916.8 millones al cierre del 2013, lo que representa un incremento de B/.426.7 millones en comparación con el año anterior.

Con respecto a los programas de inversiones financiado por los Organismos Multilaterales de Crédito, los mismos han ido disminuyendo año tras año, representando una disminución de la deuda con respecto al PIB de 43.0% al 38.3% durante el período 2010-2013, según estimaciones del MEF.

Por otro lado, la circunstancia de que la inversión del país dependa cada vez de un porcentaje menor de endeudamiento con el exterior, es un hecho favorable, ya que esto favorece la autonomía y sostenibilidad del programa de inversiones que se planea desarrollar en los próximos 5 años.

El país ha experimentado una dinamización de la economía en los últimos 4 años, ya que su PIB ha registrado tasas de crecimiento de las más altas a nivel mundial.

En resumen, se puede sostener que la cifra de B/.14,843,288.3 miles de balboas invertidos durante el período 2010-2013, ha sido la más significativa de los últimos períodos y la misma se incrementará, si el PIB sigue creciendo al ritmo que hasta ahora lo ha hecho.

La puesta en marcha de este ambicioso programa de inversiones ha repercutido positivamente en la disminución de la tasa de pobreza, ya que como mostramos en los siguientes capítulos, esta inversión se distribuye en todo el territorio nacional. La pobreza general registrada hasta hace cinco años en 33.8%, ha disminuido a 25.8% y la pobreza extrema de 15.3% a 10.6% en el año 2013, según el Informe Económico del año 2013, de la Dirección de Políticas Públicas.

Según el Informe Económico del MEF al cierre de 2013, la incidencia de no pobres en el país aumentó de 66.6% en 2009 a 74.2% en 2013, es decir 7.6 puntos porcentuales, lo que representa más de 563 mil personas. El mayor impulso se produjo en 2010, como resultado de los diversos programas de transferencias condicionadas establecidos en beneficio de la población.

El Plan Quinquenal de Inversiones (PQI), para el período 2010-2013, se programó por un monto aproximado de B/.11,277,899.5 miles, sin embargo, durante este período la inversión del Sector Público No Financiero (SPNF), ha superado lo programado en el PQI, ya que a la fecha se ha ejecutado B/.14,843,288.3, miles.

Este PQI está conformado por programas y proyectos, los cuales han sido priorizados para que los mismos vayan dirigidos a una población necesitada, midiendo además el impacto que generarán estas inversiones en dicha población, el mismo, va de la mano con las necesidades de desarrollo nacional identificadas.

De esta forma se logra resolver problemas sociales tanto en áreas rurales como urbanas y contribuir a que la distribución de los recursos sea de manera más equitativa, justa y participativa.

El gobierno ha impulsado proyectos de infraestructura de gran envergadura tanto en áreas rurales como urbanas y proyectos de interés social en todo el territorio nacional, entre los cuales se pueden mencionar, el Programa de Becas Universales, la construcción de 21 Centros de Atención Primaria de Salud Innovadora, denominados MINSA-CAPSI; la construcción de Escuelas de Excelencia; el Programa de Transferencia 120 a los 70; la construcción de grandes obras de infraestructura vial, entre otros.

Los proyectos imperdonables, distribuidos en diferentes áreas, son las grandes inversiones o megaproyectos que el gobierno nacional se propuso entregar al terminar su administración, entre ellos se destacan: La Construcción de la Primera Línea de Metro de Panamá; Construcción de la Tercera Etapa de la Cinta Costera; Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá; Diseño y Construcción de la Extensión de la Autopista Madden (15 kms); Autopista Panamá - Colón Tramo Quebrada López-Cuatro Altos; Construcción y Equipamiento de seis (6) Hospitales; y la Ampliación y Acondicionamiento de tres (3) Aeropuertos, entre otros.

Algunos de estos proyectos ya han finalizado y otros se encuentran en su etapa final de ejecución.

B. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS PERÍODO 1995 - 2013

El programa de Inversiones Públicas no Financieras durante el período (1995-2013), ascendió a B/.35,792,743.6 miles, el mismo tuvo una ejecución de B/.27,621,488.3 miles, lo que corresponde al 77.2%.

Cuadro N° 1

Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Vigencias Comprendidas entre los Años 1995 y 2013
Según Periodos de Gestión
(En miles de Balboas y porcentaje de ejecución)

Años	PRESUPUESTO		% de Ejec. Ejec. / Mod.
	Modificado	Ejecutado	
Total	35,792,743.6	27,621,488.3	77.2
1995-1999	4,771,200.0	3,068,900.0	64.3
2000-2004	5,805,200.0	3,701,700.0	63.8
2005-2009	7,903,400.0	6,007,600.0	76.0
2010-2013	17,312,943.6	14,843,288.3	85.7

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas


El presupuesto de inversiones modificado y su respectiva ejecución, por períodos administrativos de cinco años, como se aprecia en el cuadro N°1, muestra que las asignaciones presupuestarias de los tres primeros

períodos, aumentaron a niveles mínimos, mientras que para el período 2010–2013 se duplican con respecto al período anterior (2005–2009). Cabe señalar, que en el último período no se incluye el presupuesto para el 2014, el cual inicia su ejecución en enero.

El gasto de inversión pública en Panamá, ha aumentado significativamente durante los últimos años, mostrando además una gran capacidad de ejecución en todos sus proyectos, con un porcentaje de 85.7% al cierre del 2013.

En ese sentido, la inversión del Sector Público No Financiero, ejecutada por el Gobierno Nacional durante los últimos dos (2) años 2012–2013 correspondió a B/.4,621,949,8 miles, de los cuales el 61.4% fueron destinados a infraestructura.

Gráfica N° 1
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Según los Presupuestos Modificado y Ejecutado
 Vigencia Fiscal de 1995 al 2013
 (En miles de Balboas)

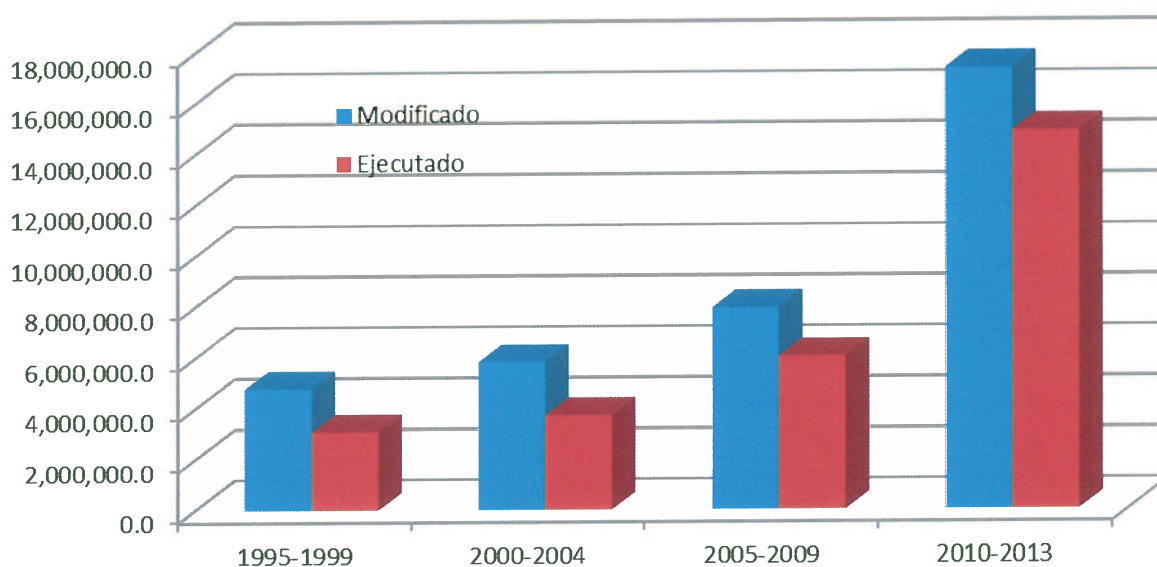

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas

La gráfica N° 1, nos muestra la ejecución en inversión pública no financiera, realizada en las cuatro (4) administraciones del período analizado.

Los Organismos Internacionales estiman que la tasa de inversión para Panamá para el período 2013-2014, será de un 31.5% del PIB, la cual es superior a la tasa promedio de América Latina, que es inferior al 25% del PIB. Esta tasa es comparable con las tasas máximas observadas en los países del sudeste asiático. Esta elevada tasa de inversión sostendrá el dinamismo económico para los años 2014 y 2015.

Los proyectos de inversión que forman parte del Plan Quinquenal de Inversiones (PQI) 2010-2014, fueron seleccionados teniendo en cuenta los objetivos nacionales y sectoriales plasmados en el Plan Estratégico de Gobierno, su vinculación con los objetivos de la Concertación Nacional para el Desarrollo y producto de las

demandas de los gobiernos locales, los cuales realizan su solicitud a las entidades respectivas y éstas a su vez, deben cumplir con los requerimientos del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP), el cual se rige por principios de economía, priorización y eficiencia durante las fases de cada proyecto de inversión pública.

Cuadro N° 2
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Según los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones
Vigencias del 2010 al 2013
(En miles de Balboas)

AÑO	PQI 2010-2014	PRESUPUESTO		
		Ley	Modificado	Ejecutado
Total	11,277,899.5	13,925,625.2	17,312,943.6	14,843,288.3
2010	2,403,302.4	2,852,773.5	3,727,587.5	3,172,017.2
2011	3,205,146.1	3,171,590.4	3,752,274.0	3,139,458.7
2012	2,990,905.1	3,765,922.2	4,288,937.4	3,736,535.0
2013	2,678,545.9	4,135,339.1	5,544,144.7	4,795,277.4


Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

La vigorosa dinámica de crecimiento que el país ha experimentado durante los últimos cuatro años, ha sido impulsada principalmente por la acumulación de factores de producción (especialmente el factor trabajo), debido al aumento de la capacidad productiva.

Lo anterior evidencia los esfuerzos del Gobierno Nacional de invertir en diversas áreas de la economía, para que el país aumente su capacidad productiva de bienes y servicios y que los frutos de estas acciones redunden en el bienestar de todos los panameños, logrando mejorar la calidad en la educación, en los servicios de salud, en la vivienda, agua potable y proporcionando un servicio de transporte público moderno, conveniente y seguro a sus usuarios.

El cuadro N°.2 y gráfica N° 2, nos muestra el comportamiento de la ejecución presupuestaria a la fecha, comparada con la programación del Plan Quinquenal de Inversiones del SPNF, para el período 2010-2013. Estos montos fueron superados por los presupuestos asignados y ejecutados durante el mismo período.

Gráfica N° 2
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Según los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones
Vigencias del 2010 al 2013
(En miles de Balboas)

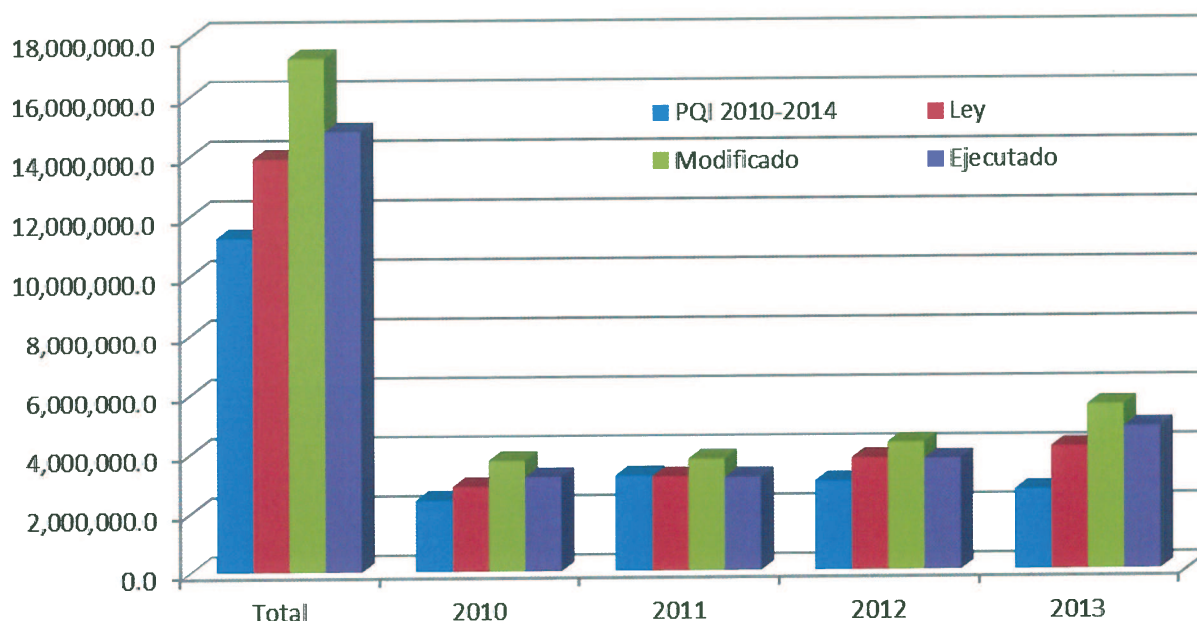

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

C. EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA: UNA NECESIDAD

A inicios del 2010, la asignación presupuestaria en materia de inversiones ascendía a B/.3,727,587.5 miles aumentando ésta a B/.5,544,144.7 miles, para el año 2013, lo que representa una tasa promedio de crecimiento anual de 10.4%.

Este incremento promedio anual de las asignaciones presupuestarias, nos muestra que las mismas deben garantizarse mediante un sistema de monitoreo y evaluación a fin de lograr impactos positivos y directos a la población.

Dentro de las inversiones que ejecuta el gobierno se contemplan proyectos generadores de bienes públicos para fortalecer la seguridad nacional, la justicia, la salud, la educación, la infraestructura, la producción agropecuaria e industrial, todos ellos encaminados a incentivar la inversión privada, además de fortalecer las principales necesidades de los pobladores, estos proyectos deben contribuir a la optimización y racionalización del uso de los fondos públicos, beneficiando a los proyectos que presenten mayor beneficio a cada Balboa invertido, para así obtener como resultado un incremento en la eficiencia de la utilización de los recursos del Estado.

Toda la inversión pública impulsa el crecimiento económico de un país, por lo tanto las políticas públicas desarrolladas por la actual administración, están enfocadas en lograr un crecimiento económico sostenido,

siendo ésta, una condición necesaria para la reducción de la pobreza y por ende la disminución de la desigualdad. Es por esto que la DPI a través de su Sistema Nacional de Inversiones Públicas, establece criterios técnicos, a fin de garantizar la ejecución de estos programas y proyectos asegurando un impacto positivo en la población, procurando que los mismos estén encaminados hacia el cumplimiento de las metas nacionales y sectoriales en concordancia con el Acuerdo de Concertación Nacional y el cumplimiento de los Objetivos del Milenio.

CAPÍTULO II

II- PROYECTOS IMPERDONABLES

A. ASPECTOS GENERALES

Los proyectos imperdonables al 31 de diciembre de 2013, se han cumplido casi en su mayoría, ello se demuestra al observar en las estadísticas el avance de ejecución de los mismos.

Estas inversiones en estos proyectos, han hecho posible que los panameños tengan a su disposición una mejor infraestructura vial, a lo largo de la geografía nacional, lo que se traduce en un mejor acceso y movilización vehicular, tanto en la capital, como en el interior del país. Actualmente, se ha modernizado el sistema de transporte público y en poco tiempo comenzará a funcionar el Metro, lo cual agilizará la movilidad de los pasajeros en la capital. Los programas de impacto social como los 100 para los 70, acciones para reducir el costo de la canasta básica familiar, la beca universal, la red de oportunidades, la construcción de viviendas dignas, entre otros, no cabe duda que han tenido un impacto positivo en el desarrollo económico y social del país, a tal punto que miles de personas dejaron de ser pobres en estos últimos 5 años.

B. AVANCE PRESUPUESTARIO Y FÍSICO DE LOS PROYECTOS IMPERDONABLES

El Plan Estratégico proyectado de 2010 al 2014, apostó en su objetivo principal, el preparar a Panamá para enfrentar los nuevos retos después de una década de rápido crecimiento. Este objetivo se ha alcanzado, gracias a la agresiva inversión pública experimentada en estos últimos cinco años, cuyo presupuesto prácticamente se duplicó en comparación a lo ejecutado en el quinquenio anterior, lo que ha sido un factor decisivo para llegar al sitio que ocupa nuestro país. El Panamá de ahora se perfila como un país pujante y moderno, admirado por el resto del mundo, pero sobre todo por nuestros hermanos latinoamericanos. Actualmente, Panamá se ubica como el segundo país con mayor crecimiento en la región.

En toda esta trascendental inversión, los proyectos imperdonables han sido los de mayor interés del Gobierno, que al 31 diciembre de 2013, se han ejecutado en un 89.0% de su presupuesto, con un avance físico que alcanza el 87.4%.

Con mucha satisfacción, se puede decir que proyectos de suma relevancia para el país ya han finalizado y están proporcionando una mejor calidad de vida y empleos a muchos panameños. Entre ellos podemos mencionar el de Renovación Urbana de Curundú; Irving Saladino; Altos de La Peña y otras barriadas de interés social. Aunado a esto, se han entregado más de 70,000 títulos de propiedad. La construcción de la extensión de la Autopista Madden en Colón; la Cinta Costera segunda etapa; la ampliación y acondicionamiento del Aeropuerto Enrique Malek en Chiriquí y los de provincias centrales y construcción del aeropuerto Enrique A. Jiménez el de Colón, son otros proyectos finalizados.

Ha habido una transformación en la red vial en todo el país, se han convertido las calles en vías modernas de alta calidad, se puede apreciar las obras terminadas a lo largo de las vías en la ciudad como son la Vía Transístmica, Israel, Ricardo J. Alfaro, Calle 50, Casco Viejo, Tocumen, como también las ampliaciones en las autopistas y los corredores. Hacia y en el interior del país también se han visto beneficiados. Una de las ampliaciones más esperada por años por los pobladores de la región de Azuero, es la de Divisa-Chitré-Las Tablas, entre otras obras que están por finalizar.

Toda esta inversión en mejoramiento de las vías de comunicación, se complementa con la introducción del nuevo sistema de buses Metro Bus, y con la construcción de las paradas. Pero será más efectiva, cuando entre a funcionar El Metro, que transportará a miles de panameños de forma rápida y segura, esta obra alcanza el 98% de avance.

La obra emblemática en materia de salud, es la Ciudad Hospitalaria que tiene un avance de 18%. Con una inversión de B/.358,148.7 miles. En construcción hay cinco (5) hospitales más, ubicados en las provincias de Colón-Colón (18.7%), Bugaba-Chiriquí (52.4%), Metetí-Darién (45.0%), La Villa-Los Santos (32.7%), y Santiago-Veraguas (77.7%). Así mismo, los Centros de Atención Primaria de Salud Innovadora (MINSA-CAPSI), ya se han entregado cuatro (4), pero están por inaugurar diez (10), el resto de los 22 proyectados, ya tienen un avance promedio de 70.0%.

Otros proyectos que tienen que ver directamente con la salud, como la cobertura en agua potable ya ha alcanzado al 91.0% de la población, con la construcción de las 4 líneas de conducción de distribución de agua en la capital y mejoras en los sistemas de abastecimiento en San Miguelito, Pedregal y la construcción, ampliación y rehabilitación de plantas potabilizadoras en todo el país.

El Saneamiento de la Bahía de Panamá, a la fecha registra un avance de 90.0%. El componente que corresponde a la construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ya finalizó, su operación inició en mayo de 2013, recibiendo 1,800 litros de aguas residuales, que se vertían a los ríos, Matías Hernández y Mataznillo, lo que contribuirá a mejorar la calidad del agua y el ambiente.

La Cadena de Frío a Nivel Nacional, proyecto prácticamente finalizado, unido a la construcción de los Mercados Públicos presenta un 87.3%, de ejecución física, son otros proyectos imperdonables que ayudaran al productor a mantener la calidad de los productos y a su comercialización.

El Centro Penitenciario la Nueva Joya con un avance físico de 85.0%, así como la construcción de los centros de Colón, Chiriquí y La Chorrera, contribuirán a disminuir el hacinamiento y facilitarán la clasificación de los privados de libertad.

Proyectos de suma importancia para muchas familias como: 100 a los 70, ampliación de la Red de Oportunidades, Ángel Guardián, se han implementado con éxito y han tenido un porcentaje de cobertura de casi 100% de población objetivo.

La transformación en la Educación es uno de los imperdonables más significativos del gobierno, para lograr esta meta, se propuso la construcción de quince (15) Escuelas Modelos o de Excelencia, ya están funcionando dos (2), en Playa Leona-La Chorrera y Pacora-Panamá; en Colón, la Abel Bravo ya tiene 86.0% de avance mientras que otras tres (3) ya presentan 75.0% de adelanto; además se han ampliado y reparado 1,024 escuelas a nivel nacional. Se ha adquirido mobiliario básico, dotado de uniformes y útiles escolares, entre otros. Este esfuerzo ha permitido un incremento en la matrícula por el orden del 14.0%.

En el siguiente cuadro, se muestra la información detallada del avance físico y presupuestario de todos los proyectos imperdonables a nivel nacional.

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección de Programación de Inversiones

Avance presupuestario y físico de los proyectos imperdonables

al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Metas	Presupuesto Modificado	Ejecutado	% Ejecución Presupuestaria	% Ejecución Física
TOTAL	1,431,153.7	1,287,999.8	90.0	87.4
Creación de la Cadena de Frío a Nivel Nacional	30,975.0	24,204.5	78.1	100.0
Desarrollo de Mercados Públicos	22,569.8	14,172.8	62.8	87.3
Desarrollo de dos (2) Mercados Públicos	130,525.0	130,225.0	99.8	87.3
Construcción de 15 Km de la 1era. Línea del Metro, Ubicado en San Miguelito y Panamá.	619,794.9	606,299.8	97.8	97.0
Construcción Primera Línea del Metro de Panamá 2	18,447.6	16,888.3	91.5	97.0
Construcción de Centro Penitenciario de La Chorrera	5,221.0	3,722.7	71.3	0.0
Construcción de Centro Penitenciario de Chiriquí	4,250.0	3,852.8	90.7	0.0
Construcción del Centro Penitenciario La Nueva Joya	54,967.3	39,965.8	72.7	85.0
Construcción de Centro Penitenciario de Colón	2,000.9	0.0	0.0	0.0
Construcción y Ampliación de Escuelas-Bocas del Toro	4,059.2	3,915.6	96.5	96.5
Construcción y Reposición Escuelas - Coclé	752.1	752.1	100.0	100.0
Construcción y Reposición Escuelas-Colón	1,441.4	681.3	47.3	47.3
Construcción y Reposición Escuelas - Chiriquí	1,648.4	1,464.2	88.8	88.8
Construcción y Reposición Escuelas - Darién	528.9	488.9	92.4	92.4
Construcción y Reposición Escuelas - Herrera	172.4	161.3	93.6	93.6
Construcción y Reposición Escuelas - Los Santos	192.7	192.7	100.0	100.0
Construcción y Reposición Escuelas - Panamá Oeste	2,070.2	1,962.3	94.8	94.8
Construcción y Reposición Escuelas - Panamá Centro	898.6	207.7	23.1	23.1
Construcción y Reposición Escuelas - San Miguelito	606.7	0	0.0	0.0
Construcción y Reposición Escuelas - Panamá Este	540.1	470.0	87.0	87.0
Construcción y Reposición Escuelas - Veraguas	1,419.9	1,016.3	71.6	71.6
Construcción y Reposición Escuelas -Guna Yala.	328.8	328.8	100.0	100.0
Reparación de Escuelas Coclé	155.0	40.0	25.8	25.8
Reparación de Escuelas - Colón	61.4	61.4	99.9	100.0
Reparación de Escuelas Chiriquí	80.0	80.0	100.0	100.0
Reparación de Escuelas de Darién	35.0	35.0	100.0	100.0
Reparación de Escuelas Herrera	56.5	54.9	97.2	97.2
Reparación de Escuelas Los Santos	205.8	185.3	90.0	90.0
Reparación de Escuelas Panamá Oeste	99.0	99.0	100.0	100.0
Reparación de Escuelas Panamá Centro	300.0	232.0	77.3	77.3

Reparación de Escuelas San Miguelito	22.9	22.7	98.8	98.8
Reparación de Escuelas Panamá Este	26.4	24.5	93.0	93.0
Reparación de Escuelas en Veraguas	601.6	548.1	91.1	91.1
Reparación de Escuelas Guna Yala	35.0	35.0	100.0	100.0
Construcción de Escuela Abel Bravo Colón No.1	3,511.7	3,511.7	100.0	100.0
Construcción de Carretera a Colón No.2	1,980.0	1,980.0	100.0	100.0
Construcción de Escuela Veraguas	2,344.0	2,040.1	87.0	87.0
Construcción de Escuela Chiriquí, Aserrío No.1	250.0	250.0	100.0	100.0
Construcción de Escuela Panamá Oeste	3,360.2	3,360.2	100.0	100.0
Construcción de Escuela IPT La Chorrera	500.0	500.0	100.0	100.0
Construcción de Escuela Colón -Cristobal	0	0	0.0	0.0
Construcción de Escuela Ustupu-Guna Yala	1,000.0	1,000.0	100.0	100.0
Construcción de Escuela Premedia y Media Rep.de Honduras	0	0	0.0	0.0
Adquisición Mobiliario Bocas del Toro	53.0	53.0	100.0	100.0
Implementación Dotación de Uniformes y Útiles Escolares	44,300.9	41,077.1	92.7	92.7
Fortalecimiento Recursos Didácticos	22,057.2	21,312.5	96.6	29.7
Fortalecimiento Formación en Nuevas Prácticas Pedagógicas	469.1	463.8	98.9	98.9
Fortalecimiento Monitoreo y Evaluación de Proyectos	150.3	150.3	100.0	100.0
Fortalecimiento Administración	3,851.5	2,785.6	72.3	72.3
Diseño y Construcción de 15 Km Autopista Madden Provincia de Colón.	0	0	0.0	100.0
Ampliación a 4 Carriles del Tramo Divisa-Chitré Ampliación a 4 Carriles del Tramo La Villa-Las Tablas	15,181.8	14,876.3	98.0	98.0
Rehabilitación de 27.4 Km de Carretera Provincia de Veraguas.	1,304.0	1,304.0	100.0	100.0
Cinta Costera 2da. Etapa (Extensión de 600 M desde el Mercado del Marisco-Casco Viejo),	45.4	0	0.0	100.0
Construcción y Equipamiento del Hospital de Metetí - Darién	30,576.4	29,459.2	96.3	45.0
Construcción y Equipamiento del Hospital de Bugaba - Chiriquí	23,945.9	21,986.5	91.8	52.4
Construcción de MINSA - CAPSI - El Empalme - Changuinola, Bocas del Toro	1,733.7	1,247.7	72.0	100.0
Construcción de MINSA - CAPSI - Cuipo de Ciricito - Colón	4,009.2	666.7	16.6	78.0
Construcción de MINSA - CAPSI - Las Tablas -Los Santos	5,184.6	1,853.6	35.8	100.0
Construcción de MINSA - CAPSI Chepigana, Santa Fe-Darién	4,494.4	1,118.3	24.9	60.4
Construcción de MINSA - CAPSI - Ocu-Herrera	5,182.8	1,682.7	32.5	100.0

Construcción de MINSA - CAPSI Pesé-Herrera	5,113.3	2,241.9	43.8	100.0
Construcción de MINSA-CAPSI en Volcán-Chiriquí	4,995.7	589.9	11.8	92.0
Construcción de MINSA - CAPSI Soná-Veraguas	4,596.5	817.7	17.8	70.0
Construcción de MINSA - CAPSI - Burunga, Arraiján	3,301.7	779.5	23.6	67.1
Construcción de MINSA-CAPSI con camas en Pedasí -Los Santos.	5,772.5	2,754.1	47.7	82.4
Construcción de MINSA - CAPSI Santiago- Veraguas	9,447.2	7,519.9	79.6	90.0
Construcción de MINSA CAPSI Río Sereno -Chiriquí	11,985.7	4,374.9	36.5	43.0
Construcción de MINSA CAPSI Dolega-Chiriquí	9,317.6	6,719.4	72.1	65.0
Construcción de MINSA CAPSI La Villa de Los Santos	9,367.2	6,628.0	70.8	73.7
Construcción de MINSA CAPSI Macaracas -Los Santos	11,906.8	9,131.4	76.7	89.7
Construcción de MINSA CAPSI Chepo, Torti-Panamá	14,202.0	7,666.4	54.0	87.4
Construcción de MINSA CAPSI Kuna Yala	4,952.6	4,393.0	88.7	38.5
Construcción de MINSA CAPSI Chorrera, El Cocó - Panamá,	9,367.2	6,799.8	72.6	82.1
Construcción de MINSA CAPSI Chorrera Puerto Caimito - Panamá,	9,582.1	4,957.0	51.7	47.1
Construcción de MINSA CAPSI Nueva Italia - Colón	2,421.5	2,293.4	94.7	23.5
Diseño y Construcción del Sistema Colector e Interceptor Este, Distrito de Panamá.	17,653.4	17,653.4	100.0	70.0
Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Costa del Este Panamá.	32,475.5	30,786.1	94.8	100.0
Tunelación e Interconexión de las Recolectoras de Desechos desde Avenida Balboa hasta Costa del Este	75,883.1	75,874.0	100.0	99.0
Diseño y Construcción de la Colectora de Juan Díaz (2da Etapa), Panamá.	6,235.6	3,370.6	54.1	0.0
Renovación Urbana de Curundú en el Corregimiento de Calidonia.	15,903.0	14,907.2	93.7	100.0
Incentivar la Construcción de Viviendas de Interés Social 5,000 Viviendas de Interés Social por Año; 5,000 Financiamientos; 5,000 Bonos de B/.5,000.00 y 5,000 Escrituras a Nivel Nacional	10,713.0	10,713.0	100.0	90.0
Levantamiento Catastro Metropolitano 1885-BID	7,630.6	3,699.0	48.5	0.0
100 a los 70.	1,718.7	1,718.7	100.0	100.0
Cumplimiento de las Leyes de Tránsito en el Sistema de Transporte Público a Nivel Nacional.	1,590.7	1,243.5	78.2	78.2
Ampliación y Acondicionamiento del Aeropuerto Enrique Malek Ubicado en la Provincia de Chiriquí.	1,688.0	1,686.0	99.9	100.0
Ampliación y Acondicionamiento del Aeropuerto Enrique A. Jiménez Ubicado en la Provincia de Colón.	20,362.4	20,362.4	100.0	100.0
Construcción de Aeropuerto en Provincias Centrales.	8,509.9	4,286.5	50.4	100.0

Perforación de Pozos	1,945.3	791.2	40.7	27.0
Mejoramiento Redes Existentes a Nivel Nacional Acueductos	5,654.0	3,755.9	66.4	0.0
Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Conte G.	3,099.5	3,099.2	100.0	100.0
Construcción Sist. de A. Potable Panamá-Colón-Chorrera-Arraiján	0.0	0	0.0	100.0
Construcción Línea Paralela Chilibre-Tinajita	116.6	114.3	98.0	54.0
Construcción Sistema de Abast Agua Potable-Tonosí	375.0	0	0.0	0.0
Construcción de Nuevo Sistema de Abast. de Agua-Antón	95.4	95.4	100.0	0.0
Construcción Dolega-Los Algarrobos, Chiriquí. línea de 8"y 6"PVC	57.7	57.7	99.9	100.0
Ampliación Sistema de Abast Agua Pot-San Carlos y Alred.	47.4	47.4	100.0	100.0
Mejoramiento Sistema de Acueducto. San Miguelito	157.3	104.8	66.6	0.0
Mejoramiento Suministro e Inst. tuberías-Costa Del Este	2,416.0	2,415.8	100.0	99.8
Construcción Sistema de Abast. de Agua Chorro Blanco	3,502.4	3,497.6	99.9	95.0
Construcción Línea de Conducción, Chilibre-Sabanita	1,977.9	1,977.9	100.0	41.0
Construcción Línea de Conducción, Laguna Alta-Chorrera	224.7	213.3	94.9	99.0
Mejoramiento Toma Cruda y Planta Potabilizadora - Pacora	153.7	24.5	15.9	100.0
Reposición De Línea de Conducción-Mount Hope, Cuatro Altos	1,035.1	1,026.9	99.2	100.0
Mejoramiento Suministro de Agua Potable-Urb. Dos Mares	0.6	0	0.0	0.0
Ampliación Planta potabilizadora. Chame, Bejuco, Coronado y Gorgona	883.9	882.1	99.8	99.7
Construcción de Planta Potabilizadora de Aguadulce	178.5	175.6	98.4	64.0
Mejoramiento al Acueducto de las Garzas - Prov. de Panamá	167.5	167.5	100.0	100.0
Ampliación al Acueducto de las Comunidades: Santa.Cruz y La Primavera	50.0	0	0.0	0.0
Capacitación Mi Primer Empleo	5,797.3	5,090.8	87.8	100.0
Desarrollo de Panamá como Centro de Eventos Internacionales	3,882.7	3,576.9	92.1	60.0
Desarrollo de Panamá como Marca País	2,066.0	1,848.2	89.5	50.3

CAPÍTULO III

III. DISTRIBUCIÓN, AJUSTE Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS

A. DISTRIBUCIÓN DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS

La Ley 71 de 18 de octubre de 2012, por medio de la cual se dicta el presupuesto General del Estado, para la vigencia fiscal 2013, instituye que el mismo puede sufrir modificaciones en traslados de partidas, créditos adicionales y modificaciones presupuestarias entre instituciones, en relación a las necesidades que se vayan presentando. Es por esta razón, que el Presupuesto Ley de Inversiones Públicas No Financieras para la vigencia fiscal 2013, el cual ascendía a B/.4,135,339.1 miles en su presupuesto inicial, ha mostrado modificaciones al 31 de diciembre de 2013, en 34.1%, aumentando a B/.5,544,144.7 miles.

1. SEGÚN INSTITUCIÓN

Para cumplir con los objetivos trazados fue necesario hacer ajustes presupuestarios por el orden de B/.1,408,805.6 miles, distribuidos de la siguiente manera: B/.1,062,163.2 miles o 75.4% al Gobierno Central, B/.293,095.3 miles o 20.8% a las Instituciones Descentralizadas, B/.51,967.0 miles o 3.7% a las Empresas Públicas y B/.1,580.2 miles o 0.1% a los Intermediarios Financieros. Ver cuadro N°3.

Cuadro N° 3

Distribución de Ajustes Presupuestarios de Inversiones Públicas No Financieras

Según Área Institucional e Instituciones

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

TOTAL	1,408,805.6
GOBIERNO CENTRAL	1,062,163.2
Asamblea Nacional	50,755.8
Contraloría General de la República	2,252.9
Defensoría del Pueblo	0.0
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	49,439.7
Ministerio de Comercio e Industrias	7,943.0
Ministerio de Desarrollo Social	-1,392.4
Ministerio de Economía y Finanzas	217,195.1
Ministerio de Educación	86,631.5
Ministerio de Gobierno	36,712.2
Ministerio de Obras Públicas	246,829.7
Ministerio de Relaciones Exteriores	11,196.2
Ministerio de Salud	46,956.3
Ministerio de Seguridad Pública	69,560.2

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	0.0
Ministerio de Vivienda	77,612.1
Órgano Judicial	3,732.2
Presidencia de la República	147,788.8
Procuraduría de la Administración	217.1
Procuraduría de la Nación	1,901.3
Tribunal de Cuentas	74.5
Tribunal Electoral	6,757.0
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	293,095.3
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	-188.2
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	-14.6
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia	6.8
Autoridad de Turismo de Panamá	15,108.5
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	65,249.5
Autoridad Nacional de Aduanas	541.9
Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá	756.6
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	3,707.8
Autoridad Nacional de Titulación de Tierras	0.0
Autoridad Nacional del Ambiente	1,888.8
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	14,028.2
Caja del Seguro Social	129,610.3
Centro Nacional de Estudio en Técnicas de Imágenes Moleculares (CENETIN)	-4.0
Dirección General de Contrataciones Públicas	125.0
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)	11,669.2
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud	0.0
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	698.1
Instituto Nacional de Cultura	3,176.6
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano	2,570.8
Instituto Nacional de la Mujer	-2.5
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	0.0
Instituto Panameño de Deportes	4,010.3
Instituto Panameño de Rehabilitación Especial	514.3
Registro Público de Panamá	4,168.0
Secretaría Nacional de la Discapacidad	275.6
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	265.0
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)	20,150.0
Sistema Estatal de Radio y Televisión	2,219.3
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	11.1
Universidad Autónoma de Chiriquí	0.0
Universidad de Panamá	11,263.1
Universidad Especializada de las Américas	290.0
Universidad Marítima Internacional de Panamá	0.0

Universidad Tecnológica de Panamá	1,000.0
EMPRESAS PÚBLICAS	51,967.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	0.0
Autoridad Aeronáutica Civil	26,787.8
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (AAUD)	0.0
Autoridad Marítima de Panamá	2,758.0
Empresa de Generación Eléctrica	0.0
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	-5,274.3
Instituto de Mercadeo Agropecuario	20,506.6
Lotería Nacional de Beneficencia	931.6
Zona Libre de Colón	6,257.3
INTERMEDIARIOS FINANCIEROS	1,580.2
Banco de Desarrollo Agropecuario	-2,040.0
Banco Hipotecario Nacional	284.2
Instituto de Seguro Agropecuario	3,336.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Dada la magnitud de las obras que lleva el Gobierno Central, le correspondió el mayor ajuste B/.1,062,163.2 miles o (75.4%), recayendo principalmente en los Ministerios de Obras Públicas (MOP); Economía y Finanzas (MEF); Presidencia; Educación (MEDUCA) y Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), representando en su orden (23.2%, 20.4%, 13.9%, 8.2% y 7.3%). Además, se les ajustó el presupuesto al resto de las Instituciones que tienen que ver con el Gobierno Central. Solo sufrió una disminución leve el Ministerio de Desarrollo Social (0.1%).

Con respecto a los ajustes realizados a las Instituciones Descentralizadas, los mismos representaron el 20.8%. Le correspondieron mayores asignaciones a la Caja de Seguro Social (CSS) y a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), con (44.2% y 22.3% respectivamente). También se beneficiaron la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT), Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y la Universidad de Panamá, con montos que oscilaron entre B/. 20,150.0 y B/.11,263.1 miles.

Los ajustes presupuestarios para las Empresas Públicas, ascendieron a B/.51,967.0 miles o (3.7%), distribuidos de la siguiente manera Autoridad de Aeronáutica Civil (51.5%), el Instituto de Mercadeo Agropecuario (39.5%) y Zona libre de Colón (12.0%), mientras que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales se vio reducido en 10.1%.

Por su parte en el área Institucional de los Intermediarios Financieros, el que recibió el mayor ajuste fue el Instituto de Seguro Agropecuario, con un ajuste de B/.3,336.0 miles.

2. SEGÚN SECTOR Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

El manual de Clasificador Sectorial de Inversiones Públicas elaborado por la Dirección de Programación de Inversiones del MEF, según ley, agrupa sectorialmente los proyectos de inversión, en función de la actividad económica, el impacto y los beneficios que estos proyectos representan y no en función del área sectorial o institucional a la que pertenece la institución ejecutora del mismo.

En el Cuadro N° 4, se presenta la clasificación por Sector No Financiero y la distribución de los ajustes presupuestarios según cada sector al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 4
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Distribución de Ajustes Presupuestarios, según Sector
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector No Financiero / TOTAL	1,408,805.6
Administración y Servicios Generales	170,558.0
Agropecuario	49,296.8
Ambiente	2,138.8
Educación y Cultura	113,626.0
Energía	13,305.1
Finanzas	753.8
Industria, Comercio y Turismo	74,704.5
Justicia	38,437.9
Minería	168.1
Protección Ciudadana	85,736.4
Salud	196,823.0
Telecomunicaciones	2,082.2
Trabajo y Bienestar Social	476,478.9
Transporte	109,177.8
Vivienda	75,518.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Al sector Trabajo y Bienestar Social, le correspondió la tercera parte del ajuste presupuestario cuando alcanzó 33.8% o B/.476,478.9 miles convirtiéndose en el de mayor ajuste. En su mayoría, este ajuste correspondió a créditos extraordinarios asignados a proyectos ejecutados por el PAN dirigidos al Fortalecimiento de Infraestructura Social y Programas de Desarrollo Social.

En tanto, al sector Salud le correspondió B/.196,823.0 miles o 14.0%. El 65.0% corresponde a créditos extraordinarios y traslados de partidas dirigidos a la CSS para la Rehabilitación del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid; Construcción de la Policlínica Gustavo A. Ross en la Ciudad de David; Actualización del Sistema Informático, otra cantidad fue destinada a la compra de maquinaria y equipo.

El 24% corresponde a la suma de los créditos y traslados realizados al MINSA, para el pago del primer grupo de 10 MINSA-CAPSI, de los cuales se han entregado 4 y para la Construcción del Hospital de Bocas del Toro; entre otros.

Durante la vigencia 2013, el Sector de Administración y Servicios Generales, recibió créditos extraordinarios por B/.170,558.0 miles de dólares. Entre las entidades con mayor aprobaciones de créditos extraordinarios encontramos al Ministerio de la Presidencia con B/.105,557.4 miles de dólares para programas como Desarrollo de Proyectos Logísticos, Restauración de antiguo edificio del Colegio Javier, Suministros y

Equipos, Capacitación Asamblea Juvenil y el Fortalecimiento de la Administración. Otra de las entidades beneficiadas fue el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Unidad Administrativa de Bienes Revertidos (UABR) con B/.32,013.9, miles en concepto de créditos extraordinario debido a la falta de presupuesto para dicha vigencia. Además, la Secretaria Nacional de Ciencias y Tecnologías recibió B/ 11,343.2 miles para la Construcción de su edificio y la Autoridad de Innovación Gubernamental con B/ 14,259.1 miles para el desarrollo de proyectos como: Panamá sin Papel, Gobierno Electrónico y la Red Nacional de Multi servicios.

El Sector Educación y Cultura, tuvo un ajuste presupuestario de B/.113,626.0 miles o 8.1%. Las instituciones que recibieron montos elevados en el traslado de créditos fueron: El Ministerio de Educación, para los programas como: Reparaciones Menores por Provincia, Construcción y Reparación de Escuelas, Construcción de Escuelas de Excelencia y Nutrición Escolar, seguida del IFARHU con los programas de Beca de Asistencia y Auxilio Económico, Becas Nuevas y Becas SENACYT; por último tenemos a la Universidad de Panamá con el programa de Mantenimiento de Diversas Áreas del Campus Central.

El Sector Transporte, registró un ajuste de B/. 109,177.8 miles o 7.7%. Este incremento se debió a la asignación de recursos adicionales para el Programa de Habilitación de la Infraestructura de los Aeropuertos Scarlett Martínez en Río Hato y Enrique Jiménez en Colón. Por otro lado, la Autoridad del Tránsito incrementó su presupuesto al reforzar los proyectos de Adquisición de Terrenos Empresa FANALCA, S.A., Subsidio de Rutas Troncales y el proyecto de Desarrollo Tecnológico de Registro Único Vehicular. En cuanto a la red vial, el incremento se dio para cubrir proyectos en ejecución tales como: Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá, Ampliación de la vía Divisa – Las Tablas y otros proyectos a nivel nacional.

Para la vigencia fiscal el sector Protección Ciudadana, presentó ajustes al presupuesto ley por unos B/.85,736.4 miles, debido a créditos extraordinarios para fortalecer proyectos en las instituciones que lo integran: Ministerio de Seguridad Pública B/.67,213.9 miles; para la ejecución de Proyecto de Rehabilitación de Edificio de Migración y Naturalización B/.2,346.0 miles, Construcción de Edificaciones del Servicio Aeronaval B/.5,014.0 miles, Construcción del Nuevo Centro de Docencia de Policía B/.2,105.0 miles, Ampliación del Sistema Troncal de Comunicaciones de la Policía B/.11,870.0 miles, Construcción y Reparaciones de Infraestructura a nivel nacional B/.15,455.0 miles, Fortalecimiento y Apoyo Logístico B/. 26,541.0 miles, entre otros. Se le asignó al Ministerio de la Presidencia B/.15,886.5 miles para fortalecer el proyecto de Implementación de los Sistemas de Seguridad y Anti-Explosivos por B/.14,314.0 miles, etc.

El incremento del presupuesto en el sector vivienda correspondió a los ajustes para fortalecer el Programa de Construcción de Vivienda y Asistencia Habitacional, mediante traslado interinstitucional por B/.42,518.3 miles y créditos adicionales por B/.33,000.0 miles, para honrar los compromisos de pago pendientes en los proyectos imperdonables: Irving Saladino y Renovación Urbana de Curundú, además de grandes obras como la Urbanización Manaca, Residencial Nueva Providencia, Urbanización La Pintada, Ave Fénix del Chorrillo y el Fondo Solidario de Vivienda. Igualmente, se atendieron los damnificados de Colón y Panamá Oeste; y el financiamiento de los subsidios, arrendamientos y atención inmediata de los sucesos ocurridos en la vigencia 2013, sobre todo en Panamá y Colón. Esto se debe a que el presupuesto ley aprobado para el año 2013, fue insuficiente para cumplir con compromisos de avance obras de los proyectos de continuidad.

El Sector Comercio, Industria y Turismo a diciembre del 2013, presentó un aumento significativo de B/. 74,704.5 miles. Los mayores impactos en el ajuste presupuestario, fueron dados por algunos programas y proyectos ejecutados por las diversas instituciones dentro del sector, entre ellos: El Desarrollo de la Cadena de Frío, Difusión del Turismo a Nivel Internacional, Difusión de la Publicidad Institucional, Implementación del Plan Maestro de Turismo Sostenible, Jumbo Tiendas, Implementación de las Jumbo Ferias, Asistencia al

Programa de Ferias al Productor, Festival de Cine de Panamá y el proyecto de Fondo de Desarrollo Cinematográfico y Audiovisual, representando un 85.8% de los ajustes presupuestarios en el sector.

El Sector Agropecuario, presentó un incremento de B/.49,296.8 (3.5%), que corresponde a los créditos extraordinarios solicitados para el proyecto de Competitividad Agropecuaria, el cual consiste en apoyar, mediante la asistencia financiera, a los productores para que puedan hacerle frente a los desafíos que genera el proceso de apertura comercial. Otros proyectos que presentaron incremento en su presupuesto fueron los Sistemas de Riego de Tonosí y Alto Bambito.

El sector Justicia, que presenta para la vigencia 2013, ajuste en su presupuesto por el orden de B/.38,437.9 miles, es producto de incrementos vía créditos extraordinarios a las entidades que lo integran tales como: el Ministerio de Gobierno, B/.32,554.8 miles para apoyar proyectos como la culminación de la Construcción del Centro Penitenciario la Nueva Joya por B/.29,967.0 miles, Construcción del Centro Penitenciario de la Chorrera por B/.2,470.0 miles, entre otros, y el Órgano Judicial, para el proyecto Mejoramiento de los Edificios del Órgano Judicial, por B/.3,078.0 miles, entre otros. Sectores como: Energía, Ambiente Telecomunicaciones, Finanzas y Minería, recibieron ajustes pero en menor escala.

Cuadro N° 5

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Distribución de Ajustes Presupuestarios, Según Ubicación Geográfica

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Sector No Financiero / TOTAL	1,408,805.6
Bocas del Toro	39,403.4
Chiriquí	24,092.7
Coclé	61,883.3
Colón	135,966.8
Comarca de Madugandí	400.0
Comarca de Wargandi	0.0
Comarca Emberá Wounaan	195.8
Comarca Guna Yala	-5,076.8
Comarca Ngöbe Buglé	3,999.7
Darién	19,945.8
Herrera	23,175.1
Los Santos	54,010.1
Panamá	1,002,197.6
Veraguas	48,612.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En cuanto a los ajustes según su ubicación geográfica al 31 de diciembre de 2013, presentados en el cuadro N° 5, los de mayor cuantía fueron destinados a la provincia de Panamá (71.1%), debido a que en esta provincia se están desarrollando programas y proyectos que tienen incidencia a nivel nacional, en el resto, el ajuste se distribuyó de la siguiente manera: Colón (B/. 135,966.8 miles ó 9.7%), Coclé (61,883.3 miles ó

4.4%), Los Santos (B/.54,010.1 miles ó 3.8%), Veraguas (B/.48,612.2 ó 3.5%), Bocas del Toro (B/.39,403.4 ó 2.8%). El resto de la distribución osciló entre (B/.1.7 y 1.3%) para las provincias de Chiriquí (B/.24,092.7), Herrera (B/.23,175.1) y Darién (19,945.8). Entre las Comarcas se realizaron pocos ajustes presupuestarios y en el caso de Guna Yala, el presupuesto presentó una leve disminución de 0.4%.

1. SEGÚN OBJETO DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas, según el Objeto del Gasto, como se define en el Manual de Clasificación Presupuestaria del Gasto Público, funciona como regulador y garantiza que los montos establecidos a cada objeto de gasto, sean efectivamente consignados a los fines establecidos. Por su parte, la Fuente de Financiamiento, identifica los gastos que son cubiertos con un determinado objeto del ingreso.

CUADRO N° 6
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Distribución de Ajustes Presupuestarios, según Objeto del Gasto
 Al 31 de diciembre de 2013
 (En miles de Balboas)

Objeto del Gasto / Total	1,408,805.6
Servicios Personales	19,796.4
Servicios No Personales	206,424.0
Materiales y Suministros	130,433.4
Maquinaria y Equipo	247,872.0
Inversión Financiera	47,385.6
Obras y Construcciones	426,390.0
Transferencias Corrientes	61,274.5
Transferencias de Capital	155,318.7
Asignaciones Globales	113,910.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas

En el cuadro N° 6, se presentan los ajustes presupuestarios según objeto del gasto, aprobados al 31 de diciembre de 2013. Dada la trascendencia de los trabajos de infraestructura que se desarrollan en el país, una tercera parte de la distribución de los ajustes, se destinaron a Obras y Construcciones (B/.426,390.0 miles ó 30.3%), otra cantidad considerable se destinó a Maquinaria y Equipo (B/.247,872.0 miles ó 17.6%), en tanto, se le asignó a Servicios no Personales (B/.206,424.0 miles ó 14.7%), Transferencia de Capital (B/.155,318.7 miles ó 11.0%) Materiales y Suministro (B/.130,433.4 ó 9.3%) y a Asignaciones Globales, (B/.113,910.9 ó 8.1%). El resto de los ajustes se distribuyeron entre Servicios Personales, Inversiones Financieras y Transferencias Corrientes, sumando (B/.128,456.5 ó 9.1%).

Cuadro N° 7
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Distribución de Ajustes Presupuestarios, según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento / Total	1,408,805.6
Ingresos Corrientes	874,808.7
Recursos de Patrimonio	172,534.4
Crédito Interno	119,241.0
Crédito Externo	-2,945.1
Donaciones	22,095.9
Transferencia de Capital	128,856.9
Fondo Fiduciario	-11,460.0
Fideicomiso e Ingresos del Canal	102,051.0
Crédito Externo	3,623.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Como se observa en el Cuadro N° 7, los principales ajustes al presupuesto fueron posibles por las entradas generadas por: los Ingresos Corrientes (B/.874,808.7 miles ó 62.1%), Recursos del Patrimonio (B/.172,534.4 miles ó 12.3%), Transferencias de Capital (B/.128,856.9 miles ó 9.1%), Crédito Interno (B/.119,241.0 miles ó 8.5%) y Fideicomisos e Ingresos del Canal (B/.102,051.0 miles ó 7.2%). También aportó aunque en menor cuantía, los ingresos provenientes de Donaciones B/.22,095.9 y los de Crédito Externo B/.3,623.0. Mientras que se vieron disminuidos los aportes procedentes del Fondo Fiduciario.

B. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

La ejecución del presupuesto conlleva una serie de actividades, dirigidas a cumplir con los programas y proyectos que se establecen en un período establecido. Este período culmina con 86.5% de ejecución al 31 de diciembre de 2013.

En promedio la ejecución presupuestaria entre 2010 y el 2013 fue de 85.7%, por encima de la del quinquenio anterior que fue de 76.0%. Esta alta ejecución ha sido posible, por el esfuerzo y esmero de todo el equipo gubernamental.

1. SEGÚN ÁREA INSTITUCIONAL

El Gobierno Nacional, ha ejecutado al 31 de diciembre de 2013, una serie de programas y proyectos, donde las instituciones han sido un ente indispensable para el buen funcionamiento y éxito de los mismos, cumpliendo con su objetivo primordial de suplir las necesidades de la población y por ende el logro de la distribución equitativa de los recursos.


Cuadro N° 8
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Área Institucional
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Área Institucional	PRESUPUESTO 2013				% de Ejec. Ejec / Mod	% de Part. x Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	4,135,339.1	1,408,805.6	5,544,144.7	4,795,277.4	86.5	100.0
Gobierno Central	3,299,280.6	1,062,163.2	4,361,443.8	3,889,019.8	89.2	78.7
Instituciones Descentralizadas	567,796.0	293,095.3	860,891.3	683,450.0	79.4	15.5
Empresas Públicas	196,994.2	51,967.0	248,961.2	187,446.3	75.3	4.5
Intermediarios Financieros	71,268.3	1,580.2	72,848.5	35,361.2	48.5	1.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Como se muestra en el Cuadro N°8 y Gráfica N°3, el Gobierno Central, ejecutó el 89.2%, (B/.3,889,019.8 miles) del presupuesto. Las Instituciones Descentralizadas ejecutaron (B/.683,450 miles ó 79.4%), mientras que las Empresas Públicas (B/.187,446.3 miles ó 75.3%) y con un porcentaje de ejecución por debajo de la mitad se encuentran los Intermediarios Financieros.

Gráfica N° 3
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Área Institucional
Al 31 de Diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

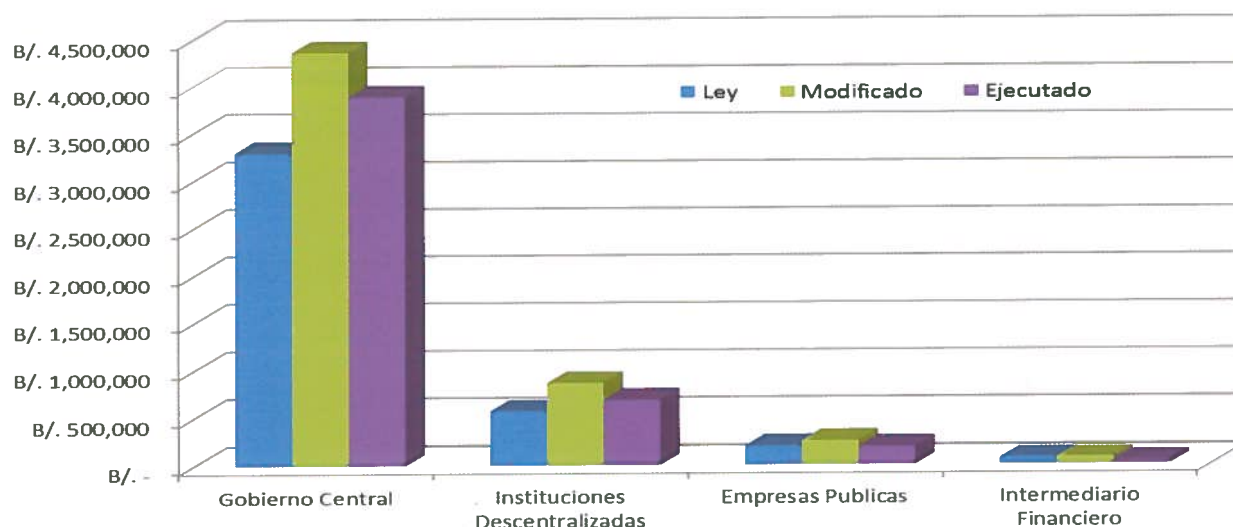

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

1.1 Gobierno Central

Al Gobierno Central le correspondió un presupuesto modificado de B/.4,361,443.8, al 31 de diciembre de 2013, desglosado entre las veintiuna (21) Instituciones que lo componen. Ocho de estas instituciones (38.1%), han ejecutado el presupuesto en un rango de 92.0% y 99.9%, mientras que otras ocho más ya lo han hecho entre 75.0% y 91.0%. Por la magnitud de la obra insigne del Gobierno (El Metro) y las obras

sociales que ejecuta la Presidencia de la República le correspondió el mayor monto (B/.1,500,048.6 miles o 34.4%), así mismo, al Ministerio de Obras Públicas que también lleva un peso considerable en las obras de infraestructura vial, se le asignó del presupuesto de Inversiones, modificado (B/.944,478.0 miles o 21.7%). Instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Desarrollo Social tuvieron una participación considerable en el presupuesto de inversiones de las Instituciones que componen el Gobierno Central, como se observa en el Cuadro N°9.

Cuadro N° 9
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Instituciones del Gobierno Central
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	3,299,280.6	1,062,163.2	4,361,443.8	3,889,019.8	89.2	100.0
Asamblea Nacional	4,885.0	50,755.8	55,640.8	50,418.4	90.6	1.3
Contraloría General de la República	738.6	2,252.9	2,991.5	329.8	11.0	0.1
Defensoría del Pueblo	282.5	0.0	282.5	208.1	73.7	0.0
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	49,557.2	49,439.7	98,996.9	71,692.3	72.4	2.3
Ministerio de Comercio e Industrias	12,732.5	7,943.0	20,675.5	18,394.7	89.0	0.5
Ministerio de Desarrollo Social	178,838.5	-1,392.4	177,446.1	170,405.7	96.0	4.1
Ministerio de Economía y Finanzas	210,309.1	217,195.1	427,504.2	326,343.2	76.3	9.8
Ministerio de Educación	160,992.2	86,631.5	247,623.7	221,169.2	89.3	5.7
Ministerio de Gobierno	47,900.0	36,712.2	84,612.2	63,049.1	74.5	1.9
Ministerio de Obras Públicas	697,648.4	246,829.7	944,478.0	877,721.6	92.9	21.7
Ministerio de Relaciones Exteriores	7,784.9	11,196.2	18,981.1	5,338.2	28.1	0.4
Ministerio de Salud	367,780.3	46,956.3	414,736.6	317,620.6	76.6	9.5
Ministerio de Seguridad Pública	124,133.8	69,560.2	193,694.0	160,980.3	83.1	4.4
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	1,394.5	0.0	1,394.5	1,289.9	92.5	0.0
Ministerio de Vivienda	51,332.2	77,612.1	128,944.3	120,907.5	93.8	3.0
Órgano Judicial	19,301.1	3,732.2	23,033.3	15,146.9	65.8	0.5
Presidencia de la República	1,352,259.8	147,788.8	1,500,048.6	1,448,313.8	96.6	34.4
Procuraduría de la Administración	19.4	217.1	236.5	236.3	99.9	0.0
Procuraduría de la Nación	8,495.0	1,901.3	10,396.3	9,776.0	94.0	0.2
Tribunal de Cuentas	362.8	74.5	437.3	401.7	91.9	0.0
Tribunal Electoral	2,533.0	6,757.0	9,290.0	9,276.4	99.9	0.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

1.2 Instituciones Descentralizadas

Las Instituciones Descentralizadas juegan un papel de suma importancia en la ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas no Financieras, dado el trabajo que desarrollan, ya sea por mandato de la Ley, la Constitución o el Poder Central. Las instituciones que componen esta área producen bienes o servicios que no compiten en el mercado; por lo tanto, su función es la de llenar una necesidad pública, con su labor llegan a todos los estratos y comunidades. Son treinta y cuatro (34) Instituciones las que componen esta

área, a las mismas se les asignó un presupuesto al 31 de diciembre de 2013, de B/.860,891.3 miles, de esta suma se ejecutó el 79.4%.

Cuadro N° 10
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Instituciones Descentralizadas
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	567,796.0	293,095.3	860,891.3	683,450.0	79.4	100.0
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	19,916.0	-188.2	19,727.8	18,169.5	92.1	2.3
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	1,683.8	-14.6	1,669.2	952.3	57.1	0.2
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia	0.0	6.8	6.8	6.8	100.0	0.0
Autoridad de Turismo de Panamá	28,075.9	15,108.5	43,184.4	35,565.9	82.4	5.0
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	27,807.7	65,249.5	93,057.1	87,044.3	93.5	10.8
Autoridad Nacional de Aduanas	1,680.0	541.9	2,221.9	762.0	34.3	0.3
Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá	0.0	756.6	756.6	25.3	3.3	0.1
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	6,236.4	3,707.8	9,944.2	8,261.4	83.1	1.2
Autoridad Nacional de Aduanas	9,244.3	0.0	9,244.3	4,993.8	54.0	1.1
Autoridad Nacional del Ambiente	17,875.2	1,888.8	19,764.0	14,306.9	72.4	2.3
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	10,000.0	14,028.2	24,028.2	23,614.6	98.3	2.8
Caja del Seguro Social	100,051.1	129,610.3	229,661.4	129,529.0	56.4	26.7
CENETIN	6.0	-4.0	2.0	0.0	0.0	0.0
Dirección General de Contrataciones Públicas	5,505.0	125.0	5,630.0	1,075.0	19.1	0.7
IFARHU	241,143.3	11,669.2	252,812.5	235,729.2	93.2	29.4
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud	1,263.0	0.0	1,263.0	1,136.1	89.9	0.1
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	3,284.3	698.1	3,982.4	2,910.7	73.1	0.5
Instituto Nacional de Cultura	4,750.5	3,176.6	7,927.1	6,866.6	86.6	0.9
Instituto Nacional de Formación Profesional y Cap. para el Des. Humano	34,039.7	2,570.8	36,610.5	24,961.0	68.2	4.3
Instituto Nacional de la Mujer	172.0	-2.5	169.5	130.0	76.7	0.0
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	630.0	0.0	630.0	0.0	0.0	0.1
Instituto Panameño de Deportes	3,500.0	4,010.3	7,510.3	4,575.1	60.9	0.9
Instituto Panameño de Rehabilitación Especial	1,116.0	514.3	1,630.3	1,616.7	99.2	0.2
Registro Público de Panamá	13,318.9	4,168.0	17,486.9	14,361.1	82.1	2.0
Secretaría Nacional de Discapacidad	1,893.0	275.6	2,168.6	1,915.6	88.3	0.3
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	752.6	265.0	1,017.6	811.6	79.8	0.1
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)	21,350.0	20,150.0	41,500.0	40,939.4	98.6	4.8
Sistema Estatal de Radio y Televisión	970.0	2,219.3	3,189.3	3,130.1	98.1	0.4
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	225.0	11.1	236.1	185.5	78.6	0.0
Universidad Autónoma de Chiriquí	2,430.5	0.0	2,430.5	2,034.3	83.7	0.3
Universidad de Panamá	2,067.0	11,263.1	13,330.1	12,431.3	93.3	1.5
Universidad Especializada de las Américas	2,789.4	290.0	3,079.4	2,385.2	77.5	0.4
Universidad Marítima Internacional de Panamá	557.5	0.0	557.5	357.2	64.1	0.1
Universidad Tecnológica de Panamá	3,462.0	1,000.0	4,462.0	2,666.6	59.8	0.5

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Como se muestra en el Cuadro N°10, varias Instituciones han ejecutado el presupuesto en más del 90.0%, podemos mencionar a la ACODECO (100.0%) y otras como la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), el Instituto Panameño de Rehabilitación Especial (IPHE), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT) y el Sistema de Radio y Televisión prácticamente alcanzan el 100%. Otras instituciones ya han ejecutado entre el 70.0% y 90.0% de su presupuesto. Sólo tres instituciones están por debajo del 35.0% de ejecución, éstas son: la Autoridad Nacional de Aduanas, la Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá y la Dirección General de Contrataciones Públicas.

1.3 Empresas Públicas

El área de las Empresas Públicas la componen nueve (9) instituciones, que han ejecutado el presupuesto modificado en 75.3%, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) con 97.6%, es el de mayor ejecución, lo cual ha redundado en beneficio de los consumidores. A esta institución se le asignó el 20.5% del presupuesto. Correspondió al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales el mayor porcentaje de partición 34.2%, del cual ejecutó el 67.0%. Ver Cuadro N° 11.

Cuadro N° 11
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Empresas Públicas
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	196,994.2	51,967.0	248,961.2	187,446.3	75.3	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	6,526.8	0.0	6,526.8	1,176.2	18.0	2.6
Autoridad Aeronáutica Civil	21,451.2	26,787.8	48,239.0	38,624.2	80.1	19.4
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (AAUD)	22,750.0	0.0	22,750.0	16,420.4	72.2	9.1
Autoridad Marítima de Panamá	14,233.5	2,758.0	16,991.5	13,145.8	77.4	6.8
Empresa de Generación Eléctrica	1,000.0	0.0	1,000.0	262.9	26.3	0.4
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	90,338.7	-5,274.3	85,064.4	56,990.5	67.0	34.2
Instituto de Mercadeo Agropecuario	30,455.6	20,506.6	50,962.2	49,716.4	97.6	20.5
Lotería Nacional de Beneficencia	238.5	931.6	1,170.1	849.9	72.6	0.5
Zona Libre de Colón	10,000.0	6,257.3	16,257.3	10,260.0	63.1	6.5

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Las Empresas Públicas ejecutaron gran parte del presupuesto (75.3%), sin embargo, la Autoridad de Aeronáutica Civil y la Empresa de Generación Eléctrica, muestran una baja ejecución (18.0% y 26.3% respectivamente).

1.4 Intermediarios Financieros

Los intermediarios Financieros son entidades del Estado dedicadas principalmente a la aceptación de depósitos a la vista, a plazo o de ahorro, que incurren en pasivos y adquieren activos financieros en el mercado.

Las instituciones que componen el área de Intermediarios Financieros, se les practica un control constante sobre sus gastos, se excluye las operaciones financieras. La aprobación presupuestaria, depende de las autoridades pertinentes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de la fiscalización de la Contraloría General de la República.

Tres (3) instituciones integran esta área que tiene una media de ejecución de 48.5%, destacándose el Instituto de Seguro Agropecuario, con una ejecución, de 92.7%. Ver Cuadro N° 12.

Cuadro N° 12
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Intermediarios Financieros
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	71,268.3	1,580.2	72,848.5	35,361.2	48.5	100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	61,904.0	-2,040.0	59,864.0	25,613.2	42.8	82.2
Banco Hipotecario Nacional	5,753.8	284.2	6,038.0	3,306.5	54.8	8.3
Instituto de Seguro Agropecuario	3,610.5	3,336.0	6,946.5	6,441.5	92.7	9.5

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2. SEGÚN OBJETO DEL GASTO

Al clasificar el presupuesto según objeto del gasto, en función de los bienes y servicios que se adquieran, avala un control jurídico contable más efectivo, se ayuda a establecer la composición de los gastos públicos y a determinar la estructura de la demanda gubernamental.


Al 31 de diciembre de 2013, el presupuesto modificado de acuerdo al Objeto del Gasto, se destinó primordialmente a las Obras y Construcciones (B/.3,066,695.0 miles o 55.3%), las mismas presentaron un avance de 88.0%. En el Cuadro N° 13 y Gráfica N° 4, se muestra el porcentaje de avance que posee cada categorización. Prácticamente la ejecución presupuestaria para este período ha cumplido con eficiencia los programas y proyectos programados, al observar que en cuatro (4) de los nueve (9) objetos del gasto ya casi se logra el 100% de ejecución y los cinco restantes ya están por encima del (80.0%), exceptuando por poco el de Inversión Financiera (75.4%) y Maquinaria y Equipo (78.9%).

Cuadro N° 13
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Clasificación del Gasto según su Objeto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,135,339.1	1,408,805.6	5,544,144.7	4,795,277.4	86.5	100.0
Servicios Personales	61,401.1	19,796.4	81,197.5	67,573.8	83.2	1.5
Servicios No Personales	288,164.5	206,424.0	494,588.5	396,374.0	80.1	8.9
Materiales y Suministros	100,343.3	130,433.4	230,776.6	193,540.4	83.9	4.2
Maquinaria y Equipo	326,112.5	247,872.0	573,984.5	452,935.9	78.9	10.4
Inversión Financiera	166,209.9	47,385.6	213,595.5	161,154.2	75.4	3.9
Obras y Construcciones	2,640,304.9	426,390.0	3,066,695.0	2,699,949.3	88.0	55.3
Transferencias Corrientes	355,055.5	61,274.5	416,330.0	382,752.5	91.9	7.5
Transferencias de Capital	188,571.4	155,318.7	343,890.1	319,508.6	92.9	6.2
Asignaciones Globales	9,176.0	113,910.9	123,086.9	121,488.7	98.7	2.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Gráfica N° 4
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Clasificación del Gasto según su Objeto
Al 31 de Diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

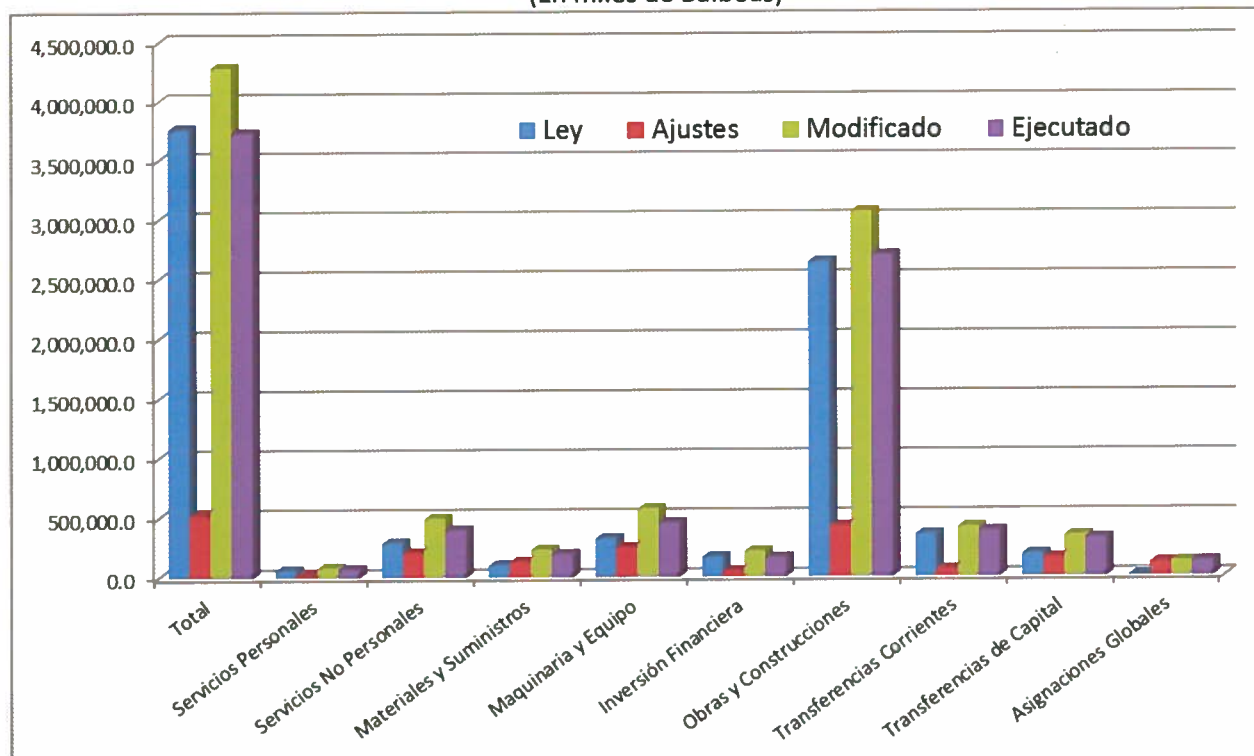

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

3. SEGÚN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

El origen de los recursos financieros que están ligados a un gasto en particular, se identifica por la Fuente de Financiamiento.

El Presupuesto de Inversiones Públicas no Financieras, se sufraga con aportes provenientes de diversas fuentes de financiamiento, tal como se aprecia en el Cuadro N° 14, en este caso, son los Ingresos Corrientes los de mayor peso. Al 31 de diciembre de 2013, su contribución en las Inversiones significaron 67.7% del total. También tuvieron una importante participación, los fondos provenientes del Fideicomiso e Ingresos del Canal que aportaron el 9.3%, así como, las transferencias de capital y los fondos procedentes de Crédito Externo con (7.9% y 6.5% respectivamente) como los de mayor relevancia.

Cuadro N° 14
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,135,339.1	1,408,805.6	5,544,144.7	4,795,277.4	86.5	100.0
Ingresos Corrientes	2,879,838.3	874,808.7	3,754,647.0	3,279,919.5	87.4	67.7
Recursos de Patrimonio	62,680.7	172,534.4	235,215.1	170,155.5	72.3	4.2
Crédito Interno	46,977.3	119,241.0	166,218.3	135,195.0	81.3	3.0
Crédito Externo	359,895.8	677.9	360,573.7	280,861.7	77.9	6.5
Donaciones	30,772.9	22,095.9	52,868.8	38,468.0	72.8	1.0
Fideicomiso e Ingresos del Canal	414,937.9	102,051.0	516,988.9	493,888.4	95.5	9.3
Fondo Fiduciario	30,524.5	-11,460.0	19,064.5	14,739.6	77.3	0.3
Transferencia de Capital	309,711.7	128,856.9	438,568.5	382,049.8	87.1	7.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

A excepción del Fondo Fiduciario que vio reducido su presupuesto en 37.5%, al resto de las fuentes de financiamiento se les realizó ajustes que significaron hasta casi tres veces su valor inicial.

El comportamiento de los porcentajes de participación en el presupuesto ejecutado de cada una de las fuentes de financiamiento, se presentan en el Cuadro N° 15.

Para más detalles de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones No Financieras, según Fuente de Financiamiento y Objeto del Gasto, ver Anexo N°3.

Cuadro N° 15
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Participación Porcentual en el Presupuesto Ejecutado, Según las Fuentes de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En porcentaje)

Fuente de Financiamiento	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado
Total	100.0	100.0	100.0	100.0
Ingresos Corrientes	69.6	62.1	67.7	68.4
Recursos de Patrimonio	1.5	12.2	4.2	3.5
Crédito Interno	1.1	8.5	3.0	2.8
Crédito Externo	8.7	0.0	6.5	5.9
Donaciones	0.7	1.6	1.0	0.8
Fideicomiso e Ingresos del Canal	10.0	7.2	9.3	10.3
Fondo Fiduciario	0.7	-0.8	0.3	0.3
Transferencia de Capital	7.5	9.1	7.9	8.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

4. SEGÚN TIPO DE INVERSIÓN

Dado la cantidad de infraestructuras que se desarrolla en el país, la asignación en el presupuesto fue mayor en lo correspondiente a este rubro el cual ocupó el 69.4% del total. Por otro lado, en este período hubo modificaciones al presupuesto hasta cuatro (4) veces más que el presupuesto Ley, podemos mencionar las inversiones destinadas al Desarrollo Comunitario, como también en las inversiones dirigidas a la Asistencia Técnica que triplicó lo asignado por Ley.


Cuadro N° 16
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Tipo de Inversión
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Tipo de Inversión	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,135,339.1	1,408,555.6	5,543,894.7	4,795,027.4	86.5	100.0
Infraestructura	3,209,727.5	636,108.8	3,845,836.3	3,285,289.4	85.4	69.4
Gestión Institucional	186,618.7	121,527.7	308,146.4	223,789.5	72.6	5.6
Subsidio	319,331.9	59,179.2	378,511.1	367,913.2	97.2	6.8
Equipamiento	159,826.2	73,652.8	233,479.0	198,587.8	85.1	4.2
Desarrollo Comunitario	102,344.0	474,797.2	577,141.2	568,543.4	98.5	10.4
Financieros	86,244.0	-3,581.7	82,662.3	49,006.9	59.3	1.5
Nutrición	30,399.7	11,000.9	41,400.6	34,869.2	84.2	0.7
Capacitación	24,121.9	22,073.3	46,195.2	40,090.5	86.8	0.8
Estudio	3,736.2	1,959.9	5,696.1	4,957.5	87.0	0.1
Asistencia Técnica	4,780.3	14,184.1	18,964.4	18,497.5	97.5	0.3
Conservación Ambiental	5,163.0	-2,174.2	2,988.8	681.0	22.8	0.1
Restauración	3,045.6	-172.3	2,873.3	2,801.4	97.5	0.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El porcentaje de ejecución según el tipo de inversión en su mayoría ha sobrepasado el 85.0% y otros están por el orden del 97.5% de ejecución, por lo que se puede decir que ha sido eficaz la ejecución. Los montos y porcentajes de ejecución y participación en el presupuesto, se aprecian en el Cuadro N° 16 y Gráfica N°5.

Gráfica N° 5
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Tipo de Inversión
 Al 31 de Diciembre de 2013
 (En miles de Balboas)

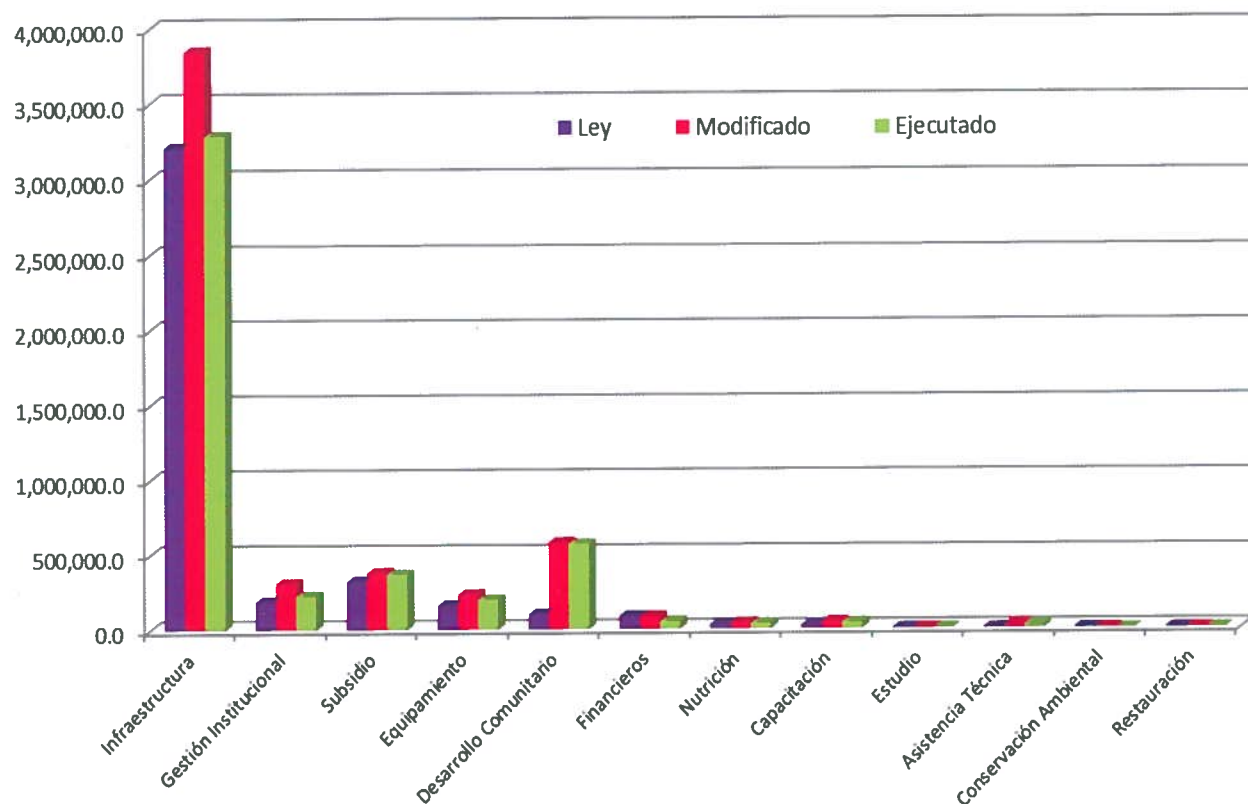

4.1 Inversiones en Infraestructuras

Las inversiones en infraestructura prevén que las instalaciones que se construyan o se mejoren, cuenten con las condiciones óptimas para lograr que la población objetivo, reciba los beneficios que sin duda redundan en una mejor calidad de vida.


El presupuesto de Inversiones Públicas, según los proyectos de infraestructura se han ejecutado en 85.4%, siendo los de Infraestructura Productiva donde se concentra más de la mitad de la asignación presupuestaria (52.2%), con una ejecución de 92.6%, la inversión en infraestructura Institucional alcanzó 29.0% de participación presupuestaria y la Infraestructura Social se le asignó B/.721,606.9 miles o 18.8% del presupuesto total y ya se ha ejecutado en 79.7%, como se aprecia en el Cuadro N° 17 y Gráfica N° 6.

Cuadro N° 17
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos de Infraestructura
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Tipo de Proyecto de Infraestructura	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	3,209,727.5	636,108.8	3,845,836.3	3,285,289.4	85.4	100.0
Infraestructura Institucional	681,664.9	433,116.1	1,114,780.9	850,302.9	76.3	29.0
Infraestructura Productiva	1,961,366.2	48,082.2	2,009,448.4	1,859,795.1	92.6	52.2
Infraestructura Social	566,696.5	154,910.5	721,606.9	575,191.4	79.7	18.8

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Gráfica N° 6
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Según Proyectos de Infraestructuras
Al 31 de Diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

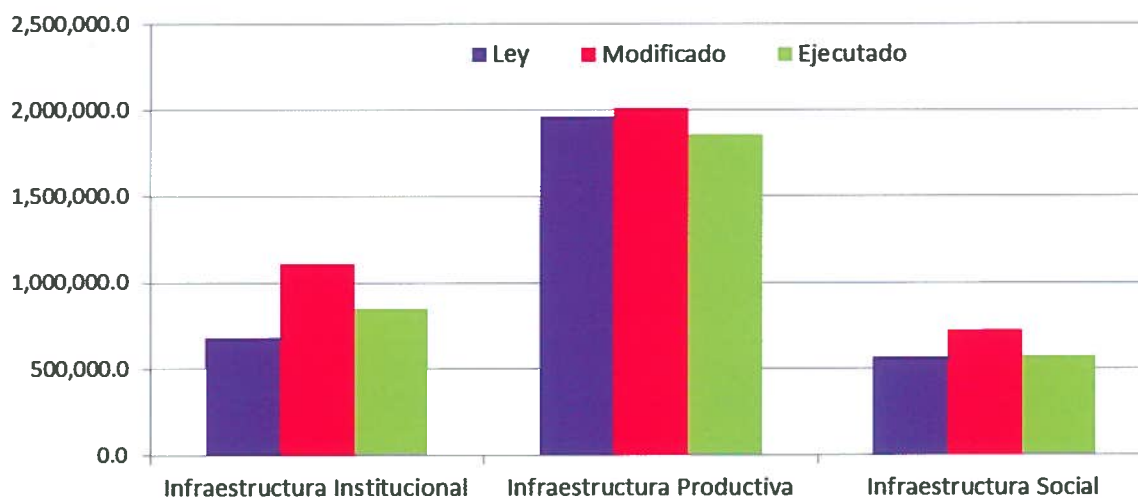

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas

4.2 Inversiones en Equipamiento

Con igual criterio que el de las inversiones en infraestructura, la inversión en equipamiento, busca propiciar y complementar con el equipamiento de bienes y servicios, todo lo necesario para que el requerimiento de la población sea compensado.


En este sentido, se ha invertido en el Equipamiento Institucional la suma de B/.186,891.6 miles o el 80.0% de lo destinado a este rubro, donde ya se ha ejecutado en 91.4%. El Equipamiento Social y Productivo globalmente significaron el 20.0% de la asignación y han ejecutado sus proyectos en 58.4% y 63.3% respectivamente como se representa en el Cuadro N° 18. En la Gráfica N° 7 se muestra el comportamiento o variaciones que se aplicaron al presupuesto según los Proyectos de Equipamiento.

Cuadro N° 18
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos de Equipamiento
Al 31 de diciembre de 2013

Tipo de Equipamiento	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	159,826.2	73,652.8	233,479.0	198,587.8	85.1	100.0
Equipamiento Institucional	124,179.7	62,711.8	186,891.6	170,848.7	91.4	80.0
Equipamiento Productivo	5,537.4	5,158.9	10,696.3	6,772.8	63.3	4.6
Equipamiento Social	30,109.1	5,782.1	35,891.1	20,966.3	58.4	15.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Gráfica N° 7
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Proyectos de Equipamientos
Al 31 de Diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

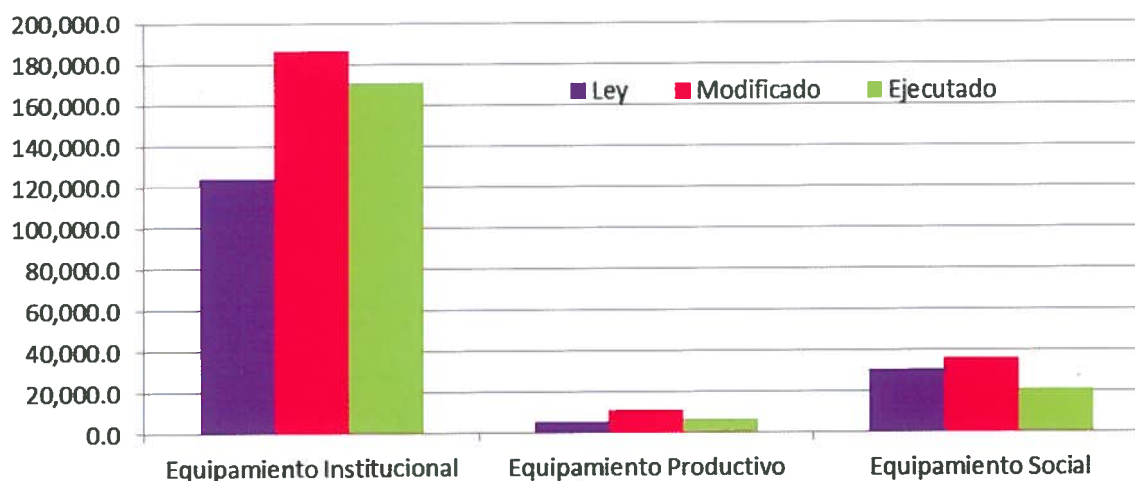

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas

4.3 Préstamos Financieros

Las Finanzas dirigidas al sector agropecuarios con un porcentaje medio de ejecución 49.4%, se le asignó 72.6% del presupuesto. En lo que respecta a las Finanzas para el sector educación, se ejecutó el 91.8% y tuvo una participación en el presupuesto de 21.6%. El resto de las inversiones según tipo de préstamo financiero, se destinó para viviendas (5.8%) y logró una ejecución de 61.7%. El Cuadro N°19 y el Gráfico


N°8 ilustran cómo se comportaron los ajustes al presupuesto, donde los préstamos destinados al sector agropecuario, recibieron un ajuste a favor por B/.1,586.3 miles y se vieron reducidos en los préstamos dirigidos al sector educación y vivienda

Cuadro N° 19
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Tipo de Préstamo Financiero
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Tipo de Préstamo	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	86,244.0	-3,581.7	82,662.3	49,006.9	59.3	100.0
Financiamiento Agropecuario	58,394.0	1,586.3	59,980.3	29,629.9	49.4	72.6
Financiamiento para Educación	22,850.0	-4,999.0	17,851.0	16,396.1	91.8	21.6
Finanzas para Vivienda	5,000.0	-169.0	4,831.0	2,980.9	61.7	5.8

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Gráfica N° 8
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Según Tipo de Préstamo Financiero
Al 31 de Diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

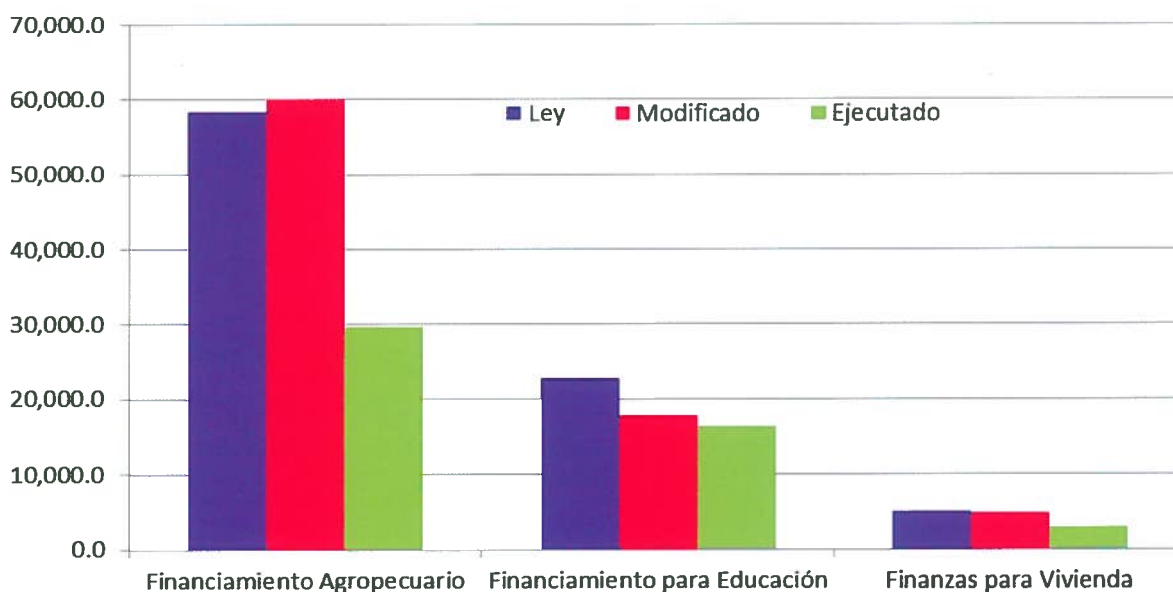

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas

CAPÍTULO IV

IV. EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS POR SECTOR

En los 15 sectores de las actividades económicas del país, se desarrollan los programas y proyectos que componen el presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Al 31 de diciembre del 2013 el presupuesto modificado ascendió a B/5,544,144.7 miles, ejecutándose un 86.5% del mismo, lo que se traduce en una ejecución promedio de B/.8.6 balboas de cada B/10.00 balboas presupuestados.

El Sector Trabajo y Bienestar Social tuvo una ejecución de 97.7%, mostrando una capacidad de ejecución muy eficaz, los sectores de Vivienda, Telecomunicaciones y Transporte reflejaron un comportamiento cuasi similar (95.1%,93.3% y 91.8% respectivamente).

En el sector de Finanzas y Minería la ejecución alcanzo 48.8% y 53.5% respectivamente, debido a que los proyectos que componen estos sectores han tenido un proceso más complicado para su ejecución.


Cuadro N° 20
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector Económico
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	% de Ejec.	% de Part.
Total	4,135,339.1	1,408,805.6	5,544,144.7	4,795,277.4	86.5	100.0
Administración y Servicios Generales	225,630.7	170,558.0	396,188.7	301,939.0	76.2	7.1
Agropecuário	55,712.3	49,296.8	105,009.2	76,476.2	72.8	1.9
Ambiente	17,875.2	2,138.8	20,014.0	14,556.9	72.7	0.4
Educación y Cultura	447,737.9	113,626.0	561,363.9	497,845.5	88.7	10.1
Energía	12,387.8	13,305.1	25,692.8	19,820.0	77.1	0.5
Finanzas	70,968.3	753.8	71,722.1	35,035.6	48.8	1.3
Industria, Comercio y Turismo	252,853.2	74,704.5	327,557.7	294,603.2	89.9	5.9
Justicia	66,303.3	38,437.9	104,741.1	75,410.0	72.0	1.9
Minería	32.5	168.1	200.6	107.4	53.5	0.0
Protección Ciudadana	128,026.6	85,736.4	213,763.0	177,943.8	83.2	3.9
Salud	678,519.4	196,823.0	875,342.4	641,274.2	73.3	15.8
Telecomunicaciones	665.0	2,082.2	2,747.2	2,563.7	93.3	0.0
Trabajo y Bienestar Social	304,678.7	476,478.9	781,157.6	763,147.1	97.7	14.1
Transporte	1,821,816.1	109,177.8	1,930,994.0	1,773,141.8	91.8	34.8
Vivienda	52,132.2	75,518.3	127,650.5	121,413.0	95.1	2.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En el cuadro N° 20 y Gráfica N°9, se muestra como ha sido la distribución del presupuesto según cada sector, además, de los ajustes y porcentajes de participación de cada uno en el monto del presupuesto.

Gráfica N° 9
Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector Económico
Al 31 de diciembre del 2013
(En miles de Balboas)

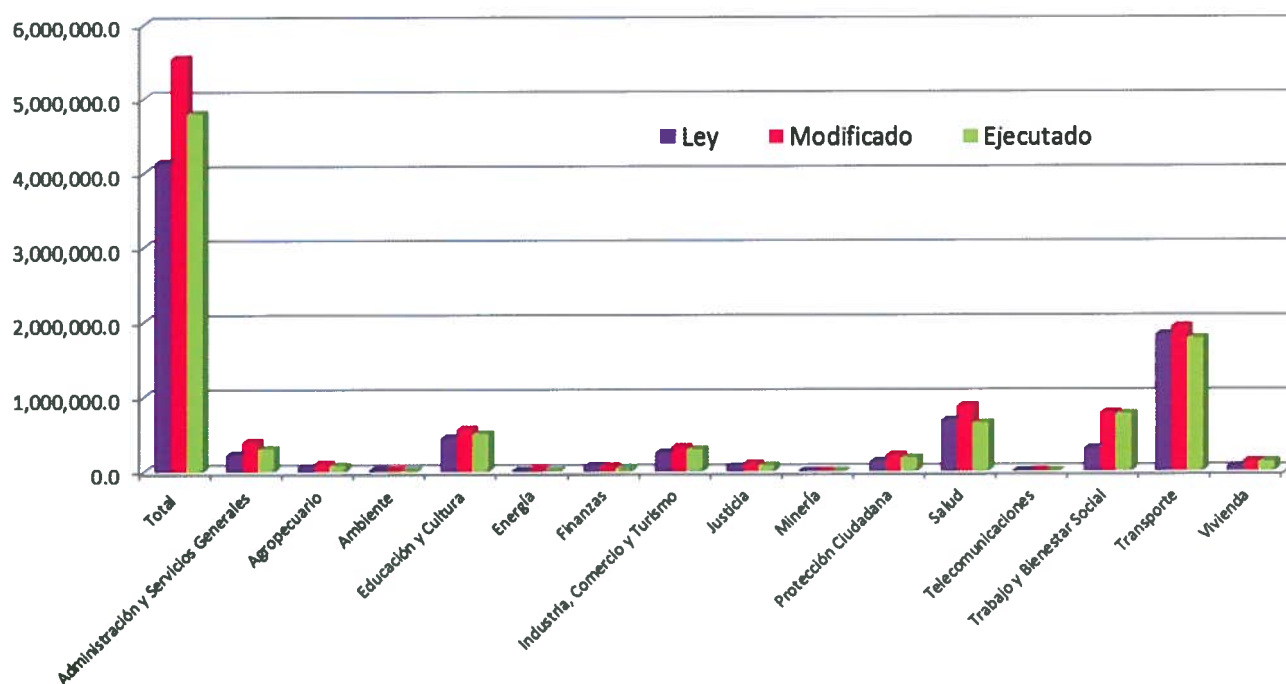

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

A continuación se describe en detalle, cómo se ha llevado a cabo la ejecución del programa de Inversiones Públicas No Financieras en cada sector.

A. SECTOR SALUD



El Sector Salud es fundamental para el bienestar de la población del país, es por eso que el Estado ha creado grandes programas y proyectos a fin de fortalecer las instituciones encargadas de velar por la salud de los panameños.

Las principales inversiones se han focalizado en programas de nutrición y agua potable. Otra gran parte de dicho presupuesto se ha destinado a proyectos de infraestructuras, con un alto nivel de tecnología, los cuales buscan brindar atención médica en diferentes regiones del país, tanto en las áreas rurales como urbanas. Las inversiones en infraestructuras se desarrollan en distintos niveles dependiendo de su grado de complejidad en lo que se refiere a los distintos tipos de servicios que se brindan en cada uno de ellos.

Gracias a esto, en los últimos años la salud de los panameños ha mejorado notablemente. Así por ejemplo, la esperanza de vida al nacer ha aumentado, en gran parte gracias a una reducción importante de la mortalidad de los niños menores de cinco años. Este mejoramiento en los índices sociales, se debe en parte al resultado de un aumento en el acceso a servicios de salud, a una disminución de factores de riesgo, y a estrategias multisectoriales.

Entre las instituciones que tienen actividades con influencia directa en este sector, se encuentran el Ministerio de Salud, la Caja de Seguro Social, El Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Economía y Finanzas; entre otras, donde las dos primeras, lideran este sector de acuerdo a su participación en el presupuesto modificado, con un 47.4% y 25.8% respectivamente. Ver Cuadro N°. 21.

Cuadro N° 21
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Salud, Según Institución
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado
Total	678,519.4	196,823.0	875,342.4	641,274.2	73.3	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	3,598.8	0.0	3,598.8	368.5	10.2	0.4
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliar	22,750.0	0.0	22,750.0	16,420.4	72.2	2.6
Caja del Seguro Social	98,766.1	127,163.3	225,929.4	127,640.4	56.5	25.8
CENETIN	6.0	-4.0	2.0	0.0	0.0	0.0
Instituto Conmemorativo Gorgas de E	1,263.0	0.0	1,263.0	1,136.1	89.9	0.1
Instituto de Acueductos y Alcantarilla	90,338.7	-5,274.3	85,064.4	56,990.5	67.0	9.7
Ministerio de Economía y Finanzas	270.0	0.0	270.0	266.4	98.7	0.0
Ministerio de Educación	11,895.6	9,167.3	21,062.9	20,434.6	97.0	2.4
Ministerio de Salud	367,780.3	46,956.3	414,736.6	317,620.6	76.6	47.4
Presidencia de la República	80,409.2	16,874.5	97,283.7	97,259.2	100.0	11.1
Sescretaria Nacional de Ciencia, Tecn	1,000.0	1,500.0	2,500.0	2,500.0	100.0	0.3
Zona Libre de Colón	441.8	439.9	881.6	637.5	72.3	0.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

En cuanto a la ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2013, este sector alcanzó un 73.3%, destacándose por su desempeño el Ministerio de la Presidencia y la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SENACYT), ambas con una ejecución presupuestaria del 100.0%, seguidas del Ministerio de Economía y Finanzas con 98.7% y el Ministerio de Educación con 97.0%.

A continuación se detallan los proyectos más significativos del Sector Salud por institución:

1. Ministerio de Salud (MINSAL)

- Proyecto Saneamiento de la Bahía de Panamá, el cual busca mejorar las condiciones sanitarias, particularmente en barrios de bajos ingresos, disminuyendo la contaminación de los cauces y ríos urbanos en el área metropolitana y de la Bahía de Panamá.
- Construcción del Hospital de Bugaba, dispondrá de 133 camas, ubicado el corregimiento de la Concepción, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí. El proyecto contribuirá a mejorar la accesibilidad y operatividad de los servicios de salud e incrementará la capacidad resolutoria de la red hospitalaria, con base en la satisfacción de las necesidades sentidas y demandas priorizadas. La población beneficiada directamente con este proyecto es de 106,119 habitantes, que corresponden a los Distritos de Bugaba, Renacimiento y los Corregimientos de Cordillera y Paraíso en el Distrito de Boquerón.

Cuadro N° 22
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Obras de Infraestructuras del Sector Salud (Imperdonables)
 Al 31 de diciembre de 2013
 (En miles de Balboas)

PROYECTO	Monto Original del Contrato (sin itbms)	Avance Físico %	Presupuesto Ejecutado
Construcción de Hospitales	358,148.7		51,445.6
Construcción y Equipamiento del Hospital de Manuel Amador Guerrero -Colón	110,500.0	18.7	0.0
Construcción y Equipamiento del Hospital de Anita Moreno - Los Santos	59,500.0	32.7	0.0
Construcción y Equipamiento del Hospital de Chicho Fábrega -Veraguas *	120,998.7	77.7	0.0
Construcción y Equipamiento del Hospital de Darién - Metetí.	36,550.0	45.0	29,459.2
Construcción y Equipamiento del Hospital de Bugaba - Chiriquí	30,600.0	52.4	21,986.5
Construcción de MINSA - CAPSI	159,296.1		74,235.3
MINSA-CAPSI El Tigre de los Amarillos	6,139.9	70.1	817.7
MINSA CAPSI Ocu-Herrera	5,345.0	100.0	1,682.7
MINSA CAPSI Pesé-Herrera	5,346.4	100.0	2,241.9
MINSA CAPSI Volcán	7,423.1	92.0	589.9
MINSA CAPSI El Empalme	5,345.1	100.0	1,247.7
MINSA CAPSI Santa Fé	8,513.9	60.4	1,118.3
MINSA CAPSI Cuipo	5,175.8	78.0	666.7
MINSA-CAPSI Burunga	6,139.9	67.1	779.5
MINSA-CAPSI Las Tablas, Los Santos	5,360.5	100.0	1,853.6
MINSA-CAPSI, Pedasí	6,725.4	82.4	2,754.1
MINSA-CAPSI Río Sereno	8,693.6	43.0	4,374.9
MINSA-CAPSI Dolega	9,100.0	88.0	6,719.4
MINSA-CAPSI Nueva Italia	9,200.0	23.5	2,293.4
MINSA-CAPSI Macaracas	11,644.1	89.7	9,131.4
MINSA-CAPSI Tortí	10,300.0	82.4	7,666.4
MINSA-CAPSI Llano Cartí	11,591.9	38.5	4,393.0
MINSA-CAPSI Carlos Santana	9,267.2	90.0	7,519.9
MINSA-CAPSI La Villa	9,267.2	73.7	6,628.0
MINSA-CAPSI El Coco	9,267.2	82.1	6,799.8
MINSA-CAPSI Puerto Caimito	9,450.0	47.1	4,957.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

* Incluido el ITBMS

No se ha incluido los montos adendados a los contratos en la columna de costo

Avance Físico reportado por el MINSA, al 31 de diciembre del 2013.

- La Construcción del Hospital de Darién, contará con 133 camas, con sus especialidades básicas. Ubicado en la Comunidad de San Vicente, en el corregimiento de Metetí, a orillas de la carretera Panamericana. Este proyecto beneficiará a 55,145 habitantes de la población de Darién, las Comarcas Emberá-Wounaan y Kuna de Wuargandi. Indirectamente se beneficiará a la población aledaña del corregimiento de Chepo y Tortí.
- La Construcción del Hospital Anita Moreno de Los Santos, consiste en la construcción de una instalación que cumpla con los criterios de atención de especialidades médicas y psiquiátricas,

mejorando la accesibilidad y operatividad de los servicios, basados en la demanda de las necesidades de la población. El proyecto está ubicado en el corregimiento de La Villa, Distrito de Los Santos, Provincia de Los Santos.

- Construcción de 20 Centros de Atención Primaria de Salud Innovadora (CAPSI), desarrollados en las distintas regiones de salud del país. Los CAPSI, serán instalaciones de salud del primer nivel de atención, con mayor grado de complejidad, las cuales buscan desarrollar un nuevo modelo de atención incorporando recursos humanos, así como también tecnología de información y comunicación. Estos centros de atención facilitarán a la población una atención continua e integrada a la red de servicios a nivel regional y nacional, en el marco de la Estrategia Renovada de Atención Primaria de Salud, acorde al modelo de atención individual, familiar, comunitaria y ambiental. Todas estas nuevas instalaciones serán adecuadas en base a criterios de ubicación geográfica, población y perfil epidemiológico. Ver Cuadro N°22.

2. Caja de Seguro Social

- Construcción Nuevo Complejo Hospitalario (Ciudad Hospitalaria): Este megaproyecto cuenta con un avance físico de 18%, tendrá la capacidad de ofrecer servicios de atención a largo plazo a más de 3 millones de usuarios; dentro de la nueva infraestructura y su componente de hospitalización médico-quirúrgico, se pretende construir de cuatro a cinco torres, cada una de ellas con su propia estructura de gestión administrativa y las suficientes camas, con la comodidad requerida para hospitalización en la Torre Clínica, Torre Quirúrgica y en la Torre Gineco-Materno-Neonatal, para observación en el Cuarto de Urgencias. Además, se cuenta con el Hospital de Especialidades Pediátricas, el Instituto de Cardiología, el Centro Ambulatorio de Tratamiento Médico-quirúrgico, lo que incluye: Hospital de Día, Cirugía Ambulatoria y Clínica del Paciente Diabético.
- Proyecto Centro Hospitalario Especializado - David, Chiriquí, conformado por tres infraestructuras vinculadas funcional y arquitectónicamente entre sí, y comprende las siguientes instalaciones:
 - a) El actual Hospital Regional Dr. Rafael Hernández
 - b) Una nueva torre Quirúrgica: tiene como fin poder asegurar la atención oportuna, eficaz y con nueva tecnología de punta, para la población de la Provincia de Chiriquí y de la población aledaña referida a este sistema de salud, para los próximos 20-30 años.
 - c) Nueva Torre de Consulta Externa Especializada: Consiste en construir una Torre de Consulta Externa Especializada, en los actuales terrenos del Hospital Regional Dr. Rafael Hernández. Se proyecta la construcción de consultorios, los cuales, darán respuesta al aumento en la demanda de atención hasta el 2030. La nueva instalación contará con espacios adecuados para las salas de espera, más amplitud para los depósitos, mayor número de estacionamientos, tanto para los usuarios internos, como los externos. Cada servicio contará con cubículos para realizar los procedimientos que requieran, este proyecto cuenta con un avance físico de 30.0%.
- El Centro Recreacional del Adulto Mayor de la Seguridad Social, surge del interés de la actual administración de la CSS por dotar de un local moderno y espacioso, con todas las comodidades a los jubilados y pensionados, para que puedan desarrollar actividades sustitutivas y de recreación; de esta manera, como miembros de la tercera edad, pueden tener una vivencia placentera que contribuirá a mejorar su calidad de vida. Presenta un avance físico de 43.0%.

- Construcción del Centro de Formación y Recreación (CEFRE) en Las Cumbres, el cual albergará instalaciones para formación, adiestramiento, convivencia deportiva y cultural. Este Centro será el club familiar de todos los colaboradores y contará con un auditorio y salones equipados, así como áreas deportivas para el fútbol, tenis, bola suave y natación. Este proyecto presenta un avance físico del 90.0%.

3. Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN)

El IDAAN, continúa con la dotación de servicios de agua potable, con el objetivo de mejorar la calidad de la salud, bienestar y progreso del país. Son muchos los proyectos de inversión que ha desarrollado el IDAAN a lo largo de este año.

El Plan Estratégico del Gobierno Nacional que estableció como meta, aumentar la cobertura de agua en el país a 90.0% se cumplió ya que se cubrió el 91.0% de la población, este logro fue posible por las oportunas inversiones dirigidas al IDAAN.

Para garantizar la consecución de esta meta, se continúa la ejecución de programas y proyectos de agua potable. Es preciso resaltar, que para este fin se adquirieron los recursos financieros necesarios a través de tres financiamiento que suman B/.180,000.0 miles, con un compromiso de contrapartida local por B/.45,000.0 miles, sumando un total de B/.230,000.0 miles a ejecutarse en un período de cuatro (4) años (2012-2015).

Estas inversiones se ejecutan a través de los siguientes programas:

- Programa de Mejoramiento de Agua y Saneamiento de la Zona Metropolitana de Panamá y Colón (Proyecto Metro-Agua), cuyo objetivo es el de aumentar la calidad, cobertura y eficiencia de los servicios de abastecimiento de agua potable y saneamiento para zonas de bajos ingresos en la Región Metropolitana de Panamá y Colón, beneficiando a 520,912 habitantes. El financiamiento es del Banco Mundial por B/.40,000.0 miles y una contrapartida local de B/.10,000.0 miles. Dentro de este programa se ejecutan los siguientes proyectos:

Nombre del Proyecto	% Física Acumulada	Monto del Contrato (en miles de B/.)
TOTAL		31,989.5
1. Elaboración del Plan Maestro de Alcantarillado Sanitario y Pluvial en la Provincia de Colón.	10.0	690.7
2. Proyecto Línea de 24" (PP-Chilibre a TA-Pedernal). El Banco Mundial financiará el 80% de este contrato (B/.8,718.3).	10.0	10,897.8
3. Consultoría de los Diseños del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Chilibre Centro	15.0	149.5
4. Consultoría de los Diseños de la Red de Distribución de Acueducto de Chilibre-Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal)	15.0	191.9
5. Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el Distrito de Colón. El avance físico corresponde a la ejecución de la Fase I: Diagnóstico y Diseño.	64.0	17,650.6
6. Supervisión técnica, administrativa, ambiental y social del Contrato "Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el Distrito de Colón".	64.0	2,408.9

- Programa Multifase de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento del IDAAN. Fase I, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por un monto de B/.40,000.0 miles y una contrapartida local de B/.10,000.0 miles. El objetivo es mejorar la calidad de vida de la población, por medio del mejoramiento de los servicios de agua potable y la construcción de sistemas de alcantarillado en ciudades de las provincias centrales y del occidente del país, así como el mejoramiento de los servicios de agua potable en las ciudades de Arraiján y La Chorrera, que forman parte del área metropolitana de la Ciudad de Panamá, el cual beneficiará a 460,000 habitantes. Los proyectos en ejecución son:

Nombre del Proyecto	% Física Acumulada	Monto del Contrato (en miles de B/.)
Provincia de Chiriquí		15,034.7
Rehabilitación en los sistemas de agua potable de Concepción y Volcán.	5.0	5,777.4
Rehabilitación en los sistemas de agua potable de Potrerillos y Dolega.	46.0	3,565.7
Línea de Conducción del Tramo PTAP Algarrobos - Tanques de San Cristóbal, Distrito de David.	41.0	5,691.6
Provincia de Los Santos		3,462.3
Rehabilitación de los sistemas de agua potable y alcantarillado de Pedasí.	3.0	3,462.3
Provincia de Panamá		14,116.0
Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera y Arraiján.	25.0	6,747.7
Construcción de la red de impulsión de bombeo a los tanques de Arraiján y nuevos tanques en Burunga.	20.0	5,043.5
Suministro e instalación de medidores.	100.0	1,849.9
Suministro e instalación de válvulas de control y reguladores de inspección.	100.0	474.9

- Mejoramiento del Sector de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Panamá, financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por un monto de B/.100,000.0 miles y una contrapartida local de B/.25,000.0 miles. El objetivo es mejorar las condiciones de vida de la población de la Provincia de Panamá, mediante la expansión y el mejoramiento sostenible de la cobertura, calidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Beneficiará a 1,300,000 residentes.

- Los proyectos en ejecución bajo este programa son:

Nombre del Proyecto	% Física Acumulada	Monto del Contrato (en miles de B/.)
Provincia de Panamá		13,888.8
1. Construcción del Alcantarillado Sanitario del Mamcy, Sector N° 1 y N° 2, Calle Turín, Distrito San Miguelito. (Incluye supervisión).	85.0	602.3
2. Mejoras de Estaciones de Bombeo de la Nueve de Enero, Distrito de Panamá y San Miguelito.	95.0	216.1
3. Consultoría de Diseño de la Línea de Impulsión La Chorrera-Capira.	90.0	304.6
4. Nueva Red de Agua Potable: Línea 16 de Chilibre – Don Bosco. En ejecución la Fase I: Servicios de diseños y planos finales.	20.0	2,199.6
5. Consultoría para los Estudios y Diseños Finales de Obras y Mejoras del Acueductos y Alcantarillado de la Ciudad de Panamá.	85.0	1,479.4
6. Diseño y construcción de puntos críticos del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Panamá. Etapa I: Nodo 180 y Nodo calle 7ma	20.0	2,032.0
7. Construcción de Red de Matriz Altos de San Francisco - Chorrera y su supervisión	80.0	814.3
8. Mejoras al Sistema de Alcantarillado y Acueducto del Distrito de San Miguelito (Sectores de la Urbanización de la Puñda, Churrascho, Carlos Ramos y Don Bosco).	10.0	1,156.3
9. Rehabilitación y limpieza de tanques sépticos e IMHOFF. Distrito de Panamá y San Miguelito.	10.0	3,195.2
10. Monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión ejecutados bajo el Programa de IDAAN-CAF	60.0	1,889.0

Otros proyectos de importancia que se ejecutan son:

- La construcción de Pozos a Nivel Nacional, proyecto que se realiza en aquellas comunidades que no cuentan con el suministro de agua potable. Al finalizar la vigencia fiscal 2013, el proyecto contó con un presupuesto modificado de B/.1,945.27 miles, presentando una ejecución presupuestaria de 40.7% y ejecución física de 49.0%.
- Rehabilitación y Optimización de la Planta Potabilizadora de Sabanitas "Antonio Yopez De León". El proyecto cuenta con un presupuesto modificado para el año 2013 de B/.2,771.19 miles. Tiene un avance presupuestario de 99.6% y un avance físico de 99.70%.
- Mejoramiento de Redes existentes de Acueducto a Nivel Nacional, el cual consiste en la adquisición de materiales para reparación y mantenimiento. El proyecto cuenta con un presupuesto modificado de B/. 5,654.02 miles, una ejecución presupuestaria de 66.4%.

4. Ministerio de Educación

Con el programa de Alimentación Complementaria, el Ministerio de Educación (MEDUCA), busca proveer alimentos preparados a los escolares como complemento de su dieta, con la finalidad de que los estudiantes cuenten con los nutrientes necesarios y así poder garantizarles una buena nutrición y por ende el buen desempeño en las actividades y estudios. El objetivo de este programa, es el de beneficiar a

496,192 estudiantes a nivel nacional, el mismo se desarrolla en las modalidades: Bebidas Lácteas Fortificadas, Galletas Nutritivas y Crema Enriquecida. En el Cuadro N° 23 se muestra la cantidad de productos entregados a los estudiantes a lo largo del año, cumpliendo así con la meta establecida. El detalle de los beneficiarios se muestra en el Informe de Ejecución del Primer Semestre 2013 de la DPI.

Cuadro N° 23

Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras

Alimentos entregados en centros escolares

Al 31 diciembre de 2013

(Porcentaje de ejecución)

Modalidades	Productos Lácteos	Unidades de Galletas	Envases de 5 Libras de Crema
Programado	22,141,455	39,734,686	487,576
Ejecutado	22,141,456	39,734,686	487,577
Porcentaje de Ejecución	100.0	100.0	1.0

B. SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA



El plan de gobierno 2009-2014, contempla dentro de la Estrategia Social, dos importantes ejes como prioritarios: Formación de Capital Humano para el Desarrollo e Inclusión Social. Estos ejes para el Sector Educación plasman objetivos como: i) desarrollar una educación de calidad y de punta con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres; ii) capacitación laboral que mejore las competencias de los trabajadores y las trabajadoras en los sectores prioritarios para el desarrollo.

Para lograr estos objetivos, la estrategia impulsa programas y proyectos educativos, que son desarrollados por las diferentes instituciones que participan dentro de este Sector, siendo alrededor de 17 instituciones y de las cuales el Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (IFARHU) y el MEDUCA son las que tienen mayor participación.

Con respecto al MEDUCA, a través de sus programas y proyectos se incluye Inversión en infraestructura, en los cuales se desarrollan nuevos diseños arquitectónicos que suplirán las necesidades educativas actuales y cónsonas con ofertas de calidad y mejora de la gestión pedagógica. También promueve la transformación e innovación curricular en la Educación Media, y la coordinación de la dotación de libros, uniformes y útiles escolares, de los que se espera se beneficie toda la población estudiantil del nivel básico.

En cuanto al IFARHU, se amplía el programa de becas estudiantiles del nivel básico, a través del Programa de Becas Universales.

A este importante Sector se le asignó recursos por B/.444,737.9 miles y recibió ajustes presupuestarios por el orden de B/.113,626.0 miles, incrementando el presupuesto ley a un presupuesto modificado de B/.561,363.9 miles. La ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión en este Sector al 31 de diciembre de 2013, representó un 88.7% del presupuesto modificado. Ver Cuadro N° 24.

Cuadro N° 24
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Educacion y Cultura - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado
Total	447,737.9	113,626.0	561,363.9	497,845.5	88.7	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	1,200.0	0.0	1,200.0	350.0	29.2	0.2
IFARHU	241,143.3	11,669.2	252,812.5	235,729.2	93.2	45.0
Instituto Nacional de Cultura	4,750.5	3,176.6	7,927.1	6,866.6	86.6	1.4
Instituto Nacional de Formación Profesional	34,039.7	2,570.8	36,610.5	24,961.0	68.2	6.5
Instituto Panameño de Deportes	3,500.0	4,010.3	7,510.3	4,575.1	60.9	1.3
Instituto Panameño de Habilitación Especial	1,116.0	514.3	1,630.3	1,616.7	99.2	0.3
Ministerio de Desarrollo Social	797.0	879.5	1,676.5	1,488.9	88.8	0.3
Ministerio de Economía y Finanzas	250.0	550.0	800.0	800.0	100.0	0.1
Ministerio de Educación	149,096.7	77,464.2	226,560.8	200,734.6	88.6	40.4
Presidencia de la República	100.0	232.9	332.9	331.1	99.5	0.1
Sistema Estatal de Radio y Televisión	480.0	258.3	738.3	705.0	95.5	0.1
Universidad Autónoma de Chiriquí	2,430.5	0.0	2,430.5	2,034.3	83.7	0.4
Universidad de Panamá	2,067.0	11,263.1	13,330.1	12,431.3	93.3	2.4
Universidad Especializada de las Américas	2,747.7	0.0	2,747.7	2,160.8	78.6	0.5
Universidad Marítima Internacional de Panamá	557.5	0.0	557.5	357.2	64.1	0.1
Universidad Tecnológica de Panamá	3,462.0	1,000.0	4,462.0	2,666.6	59.8	0.8
Zona Libre de Colón	0.0	36.9	36.9	36.9	100.0	0.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Las mayores asignaciones presupuestarias correspondieron al IFARHU 45.0% y al MEDUCA con 40.4%. En cuanto a la ejecución presupuestaria, las instituciones que alcanzaron altos porcentajes fueron: Zona Libre de Colón 100.0%, Ministerio de Economía y Finanzas 100.0%, Ministerio de la Presidencia 99.5%, Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) 99.2%, Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) 95.5%, Universidad de Panamá 93.3%, Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano (IFARHU) 93.2%, Ministerio de Desarrollo Social 88.8%, Ministerio de Educación 88.6%, Universidad Autónoma de Chiriquí 83.7%, Universidad Especializada de las Américas 78.6%.

Los programas y proyectos más destacados de este sector por institución son:

1. Ministerio de Educación:

- Escuelas de Excelencia, programa formado por proyectos dirigidos a dar soluciones a la problemática de la demanda estudiantil en el país, para ofrecer una educación más equitativa. Estas Escuelas, forman parte del esquema renovado que se aplicará a los centros educativos para impulsar el desarrollo del proceso a nivel nacional. Se estima que con este programa por cada escuela se benefician 2,000 estudiantes.

Seguidamente se muestra el porcentaje de avance físico de cada una de las Escuelas de Excelencia al 31 de diciembre de 2013.

Escuelas Excelencia	Avance Físico
1. La Chorrera (Playa Leona)	100.0%
2. Pacora (China-Taiwan)	100.0%
3. Centro Educativo Abel Bravo	86.0%
4. Comarca Ngäbe Buglé (El Peñón)	75.0%
5. La Chorrera (Instituto Profesional y Técnico)	74.0%
6. Comarca Emberá Wounaan (Lajas Blancas)	73.0%
7. Veraguas (Instituto Profesional y Técnico)	20.0%
8. Chiriquí (Aserrió N°1)	En proceso de adquisición de terreno
9. Colón (Carretera a Colón N°2)	
10. Panamá Oeste	
11. Colón (Cristóbal-Colón)	
12. Pacora (Escuela Premedia y Media República de Honduras)	Se está trabajando en los procesos técnicos para la adquisición del Terreno.
13. Arraiján (Hijo del Carpintero)	En procesos de selección de la empresa a construir.
14. Guna Yala (Gardí Sugdug)	Se entregó la orden de proceder el 06/05/2013
15. Guna Yala (Ustupu)	En evaluación de propuesta

- **Dotación Gratuita de Mochilas, Libros, Útiles, Bonos y Laptops (media) a Nivel Nacional:** Este proyecto está enfocado a apoyar a los estudiantes de la educación básica general de las escuelas oficiales del país con bonos, útiles escolares, libros y textos, como incentivo y promoción de una educación mejor para todos. Se han entregado 46,300 computadoras portátiles a estudiantes a nivel nacional, representando un 100.0% de lo programado para el año 2013. En cuanto a los bonos, se han distribuido 753,164, representando un (93.0%) de un total de 810,000 bonos planificados.
- **Transformación Curricular:** El objetivo es de mejorar la calidad del aprendizaje, mediante la implementación de un enfoque metodológico indagatorio, basado en la formación por competencia e inteligencia múltiple. Los estudiantes podrán desarrollar y movilizar conocimientos, habilidades y destrezas, que les permitirán una formación integral para su adecuado desenvolvimiento personal y una convivencia social. Proyectos que se desarrollan bajo este programa son:

Fortalecimiento de Recursos Didácticos: De los 58 centros escolares planificados para la dotación con equipo educacional y recreativo se dio cobertura a 3 Escuelas Modelos, las que representan un 3.3% del total. Se beneficiaron 32 Centros de transformación Curricular con recursos didácticos y tecnológicos, completándose con una ejecución de 100.0%. Se planificaron 129 centros pilotos para la transformación curricular, los cuales se dotarán con mobiliario y equipo. De éstos, se han ejecutado 34, representando un 26.4%.

Formación en Nuevas Prácticas Pedagógicas: Entre las actividades a desarrollar están la capacitación a 2,207 docentes, directores y supervisores, equipamiento de los colegios de

media y la dotación de textos y recursos didácticos, entre otras, representando 100.0% de ejecución física.

2. Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (INADEH)

El INADEH, comprometido con la capacitación profesional del recurso humano panameño, lleva a cabo la ejecución de distintos proyectos a nivel nacional, principalmente en capacitación. Sin embargo, el funcionamiento de los centros de capacitación a nivel nacional requiere de un fuerte apoyo en cuanto a la dotación de equipo, herramientas especializadas y mobiliario para talleres, ya que los equipos que hay en los diversos centros de formación profesional se encuentran desgastados, por esta razón el proyecto más relevante para esta institución es:

- Fortalecimiento de Equipos y Herramientas a los Centros de Formación Profesional a Nivel Nacional, presenta un presupuesto modificado al final el segundo semestre de la vigencia 2013 de B/.3,869.90 miles y un avance presupuestario de 91.4%. Con este proyecto se benefician directamente un aproximado de 81,300 personas e indirectamente 322,200 personas.

3. Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU)

Entidad encargada en planificar la formación y aprovechamiento del capital humano, a través de becas o créditos a estudiantes destacados y profesionales talentosos para financiar estudios de grado, posgrado y educación continua, para el desarrollo integral del país.

Los principales proyectos que desarrolla el IFARHU:

- Programa de Becas Universales, el cual consiste en un apoyo económico de ciento ochenta balboas B/.180.00 anuales, otorgados a cada estudiante de Básica General y Media que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley. El programa alcanzó un avance de 89.0% de ejecución presupuestaria al cierre de 2013, y benefició a 478,574 estudiantes.
- Becas Vigentes, este programa consiste en un financiamiento no reembolsable de estudio de educación básica general, media y superior, se beneficiaron 132,631 estudiantes y alcanzó un avance de 100% de ejecución presupuestaria.
- Becas nuevas, se beneficiaron 86,597 estudiantes a nivel nacional. Además, el programa presentó un 97.0% de ejecución presupuestaria.

C. SECTOR VIVIENDA



La vivienda constituye una necesidad básica fundamental en la vida de los hogares y personas, que va mucho más allá del simple alojamiento, razón por el cual el sector vivienda constituye una de las piezas claves que trabajan en pro del bienestar de la población y cuya finalidad primordial es la de brindar atención mediante el desarrollo de programas de viviendas accesibles y seguras

Con el objeto de disminuir el déficit habitacional que enfrenta el país y proporcionar una solución habitacional digna y decorosa, el Estado ejecuta una política de vivienda encaminada a impulsar un desarrollo sostenible de programas y proyectos habitacionales integrales que beneficien a la población de bajo ingresos, localizadas en áreas semi-urbanas próximas a las ciudades, en áreas campesinas e indígenas rurales que se consideran de atención prioritaria.

La política de vivienda en el país ha ido evolucionando a través del MIVIOT directamente involucrado en la construcción y el financiamiento de vivienda por medio del Banco Hipotecario Nacional, ente regulador y facilitador del sector. Los cambios legales, el apoyo continuo del estado y el crecimiento sostenido del sector privado, supone una respuesta a la necesidad como familia de adquirir una propiedad.

Cuadro N° 25
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Vivienda - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	52,132.2	75,518.3	127,650.5	121,413.0	95.1	100.0
Banco Hipotecario Nacional	300.0	542.2	842.2	41.4	4.9	0.7
Ministerio de Economía y Finanzas	500.0	0.0	500.0	464.1	92.8	0.4
Ministerio de Vivienda	51,332.2	74,976.1	126,308.3	120,907.5	95.7	98.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El sector vivienda, conformado por tres (3) instituciones, ejecutó al 31 de diciembre de 2013, el 95.1% de su presupuesto asignado, correspondiéndole al Ministerio de Vivienda la ejecución de un 95.7 %, el Ministerio de Economía y Finanzas un 92.8%, mientras el Banco Hipotecario se quedó rezagado con un 4.9% de ejecución. Ver Cuadro N°25.

Los programas que se desarrollan en este sector, por institución son:

1 – Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial

En el programa de Construcción de Viviendas, se desarrollan importantes proyectos de vivienda accesibles para familias de bajos ingresos procurándoles una mejor calidad de vida y además dando una solución progresiva del problema habitacional en el país. Entre los proyectos más relevantes están:

Nombre del Proyecto	Ubicación	Descripción	Beneficiarios	Avance Físico %
Renovación Urbana de Curundú	Panamá, Curundú	Contempla la construcción de 26 torres habitacionales, con 1008 apartamento infraestructuras para el drenaje sanitario, pluvial y la red de agua potable, edificios de comercios, Centro Cultural y el Centro de Capacitación del INADEH.	5,000 personas.	100.0
Proyecto Irving Saladino	Colón, Sabanita	Contempla un complejo habitacional de treinta y seis (36) edificios dividido en cuatro (4) manzana con áreas verdes e infraestructura completa. El proyecto cuenta con un total de 500 apartamentos	2,500 personas	100.0
Residencial Nueva Providencia	Colón, Nueva Providencia	Contará con 500 soluciones distribuidas en 25 edificios de 20 apartamentos cada uno.	2,500 personas	80.0
Proyecto Urbanización Manaca	Chiriquí	Construcción de 362 viviendas sobre terreno de 13.8 hectáreas. Además se contemplan áreas para uso comunal, recreativas, Infraestructura para la red de agua potable, almacenamiento, planta de tratmientos de aguas servidas, calles, entre otros.	362 familias	85.0
Proyecto Alto de la Peña	Los Santos	Contempla la construcción de 72 soluciones de vivienda, con infraestructura, planta de tratamiento de aguas servidas, calle, veredas parques e Infoplaza.	72 familias	100.0
Urbanización COOBANA	Bocas del Toro	Este proyecto solucionará el problema habitacional de trabajadores y socio de la Cooperativa Bananera	50 familias	65.0
Urbanización La Pintada	Coclé, Pintada	Consiste en la construcción de 68 viviendas con infraestructura planta de tratamiento, calles y veredas.	68 familias	70.0
Urbanización Brisas de Soná	Veraguas	Contempla la construcción de 105 viviendas en Soná, incluye calle e infraestructura para red de aguas potables, planta de tratamiento de aguas servidas	105 familias	60.0

Adicionalmente a través del Fondo Solidario de Vivienda, se ha entregado al 31 de diciembre un total de 1,494 bonos familiares y se han emitido unas 11,065 resoluciones de aprobación de bonos, por un monto de B/.58,807.2 miles.

2 - Banco Hipotecario Nacional

El Banco Hipotecario Nacional, desarrolla el proyecto “Adquisición de Fincas”, con el propósito de legalizar el estatus de las fincas y terrenos facturados, expropiados e invadidos que beneficiarán aproximadamente a 1,500 familias. Al 31 de diciembre, su ejecución fue menor al 1.0%, esto se debe a que se está a la espera del pago de las escrituras legales.

D. SECTOR TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL



Los programas y proyectos que sustenta la cartera del plan de inversiones en el Sector Trabajo y Bienestar Social es diversa y amplia, sin embargo todo el esfuerzo de estas iniciativas de inversión tiene un solo objetivo permanente, el cual es, procurar el ofrecimiento de las herramientas básicas necesarias para promover la estabilidad social de la población más necesitada de nuestro país.

Cuadro N° 26
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	304,678.7	476,478.9	781,157.6	763,147.1	97.7	100.0
Caja del Seguro Social	1,285.0	2,447.0	3,732.0	1,888.5	50.6	0.5
Instituto Nacional de la Mujer	172.0	-2.5	169.5	130.0	76.7	0.0
Ministerio de Desarrollo Social	178,041.5	-2,271.9	175,769.6	168,916.8	96.1	22.5
Ministerio de Economía y Finanzas	67,460.0	138,860.6	206,320.6	198,366.5	96.1	26.4
Ministerio de Gobierno	5,000.0	-2,429.5	2,570.5	2,564.1	99.8	0.3
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	1,394.5	0.0	1,394.5	1,289.9	92.5	0.2
Presidencia de la República	47,798.4	337,740.2	385,538.6	384,895.1	99.8	49.4
Secretaría Nacional de la Discapacidad	1,893.0	275.6	2,168.6	1,915.6	88.3	0.3
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	752.6	265.0	1,017.6	811.6	79.8	0.1
Tribunal Electoral	0.0	26.0	26.0	26.0	100.0	0.0
Universidad Especializada de las Américas	41.7	290.0	331.7	224.4	67.7	0.0
Zona Libre de Colón	840.0	1,278.5	2,118.5	2,118.5	100.0	0.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Durante el año 2013, el sector en referencia presentó un presupuesto Ley de B/.304,678.7 miles, un modificado de B/.781,157.6 miles y un ejecutado de B/.763,147.1 miles de balboas que representa el 97.7% de porcentaje de ejecución. Dichas inversiones fueron ejecutadas por 12 instituciones donde sobresalen por sus montos asignados, el Ministerio de la Presidencia 49.4%, Ministerio de Economía y Finanzas 26.4% y el Ministerio de Desarrollo Social 22.5%, agrupados estos tres ministerios, tendrían el 98.3% del presupuesto modificado total del Sector. Ver Cuadro N°26.

Entre los proyectos más importantes por su monto asignado (con asignaciones mayores de B/.15,000.0 miles) se destacan por institución los siguientes:

1- Ministerio de la Presidencia

El Ministerio de la Presidencia alcanzó un 49.4% de participación en el presupuesto modificado del sector, entre los proyectos tenemos:

- Fortalecimiento de la Infraestructura Social, con un 53.0% de ejecución física;
- Desarrollo Proyectos Sociales, con un 100.0% de ejecución física;
- Equipamiento y Suministros a Comunidades Marginadas, con un 100.0% de ejecución física;
- Fortalecimiento y Promoción de la Cultura y el Deporte, con un 96.0% de ejecución física,
- Fortalecimiento de la Administración de Proyectos, con un 100.0% de ejecución física, y
- Mejoramiento del Hogar, con un 66.0% de ejecución física.

Considerando los proyectos de acuerdo al porcentaje de avance físico, los que muestran los mayores porcentajes de avances, están vinculados con la ejecución de infraestructura social, orientados con el desarrollo de las comunidades a nivel nacional; brindando apoyo a familias en condiciones vulnerables para el mejoramiento y/o construcción de viviendas, que le permitan mejorar sus condiciones de vida. Igualmente se prevé la dotación de insumos, equipos y materiales relacionados con el mejoramiento del hogar; fortalecer las actividades deportivas y culturales a nivel nacional como una medida para reducir o mitigar los efectos de la delincuencia juvenil y mejorar la calidad de vida de los jóvenes a través del mejoramiento y construcción de instalaciones deportivas y/o culturales en las comunidades; además, brindar el apoyo para el desarrollo de estas actividades.

2- Ministerio de Desarrollo Social

Entre sus proyectos están:

El Programa B/.100 a los 70, con avance físico de 100%, consiste en la entrega de asistencia económica de B/.100.00 cada dos meses, a 84,166 adultos mayores de 70 años o más, sin pensión ni jubilación, que se encuentren en condiciones de riesgo social, vulnerabilidad, marginación o pobreza, para mejorar su calidad de vida. Entre las actividades más significativas está la relacionada con la administración del padrón de beneficiarios activos, donde durante el periodo octubre-diciembre, de 2013, se registraron 1,776 inscripciones nuevas, traslados por cambios de residencia y de entidad bancaria y entradas de beneficiarios provenientes de otros pagos; 2,474 exclusiones por fallecimientos, renunciaciones, suspensiones y traslados por cambio de áreas de difícil acceso a áreas urbanas, rurales accesibles a sucursales y viceversa.

Programa de Manejo del Sistema de Protección Social (Transferencia), con un 100.0% de ejecución física. Es importante resaltar, que como parte de los trabajos de seguimiento, se lleva a cabo la revisión bimestral noviembre-diciembre y se realiza el 6to pago de TMC (Transferencias Monetarias Condicionales), para un total de 72,563 hogares beneficiarios, en 585 corregimientos del país. Este proyecto contempla tres sistemas de pago, para las áreas de difícil acceso, a las cuales se les entrega el pago directo a los hogares. Con este pago se benefician 37,857 hogares en 147 corregimientos de difícil acceso. 26,758 hogares en 102 corregimientos recibieron la entrega manualmente (sobres) en la modalidad MIDES-Móvil; 8,077 hogares en 36 corregimientos, recibieron el pago a través de Dispensadores de Dinero ATM y 3,101 hogares en 9 corregimientos, recibieron su pago a través del sistema biométrico.

El proyecto de Fortalecimiento Cohesión Social en Panamá, tiene un 99.0% de ejecución física, con el mismo se ha mantenido el proceso de coordinación y gestión con entidades que tienen programas sociales dirigidos a sectores vulnerables de la población del área de intervención del Proyecto, a través de visitas a alguna de las instituciones que participan del Comité Técnico Metodológico (CTM). Otra de las actividades realizadas en este proyecto, lo constituye la plataforma de concertación y consensos interinstitucionales. A la fecha, han estado participando 12 instituciones del Estado, con presencia en el área, las cuales ejecutan programas sociales dirigidos a sectores vulnerables. Estas instituciones son: MIDA, ANAM Comarcal, INADEH, ATP, AMP, AMPYME, IPACOO Comarcal, IDIAP, ARAP, MIVI Comarcal, MIDES Comarcal y Gobernación Comarcal.

3-Ministerio de Economía y Finanzas

En noviembre de 2012, la Asamblea Nacional aprobó la ley 84, que establece la creación del Programa Nacional para el Desarrollo Local (PRONADEL) que estará adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por conducto de la Dirección de Planificación Regional y transferirá anualmente 110 mil balboas a cada una de las juntas comunales y 30 mil balboas a las alcaldías, que reúne los recursos de PRODEC, PROINLO y POC que funcionaron hasta diciembre 2012. Su asignación a nivel de programa nacional alcanza para el año 2013, la suma de B/.70,700.0 miles.

La ejecución de las obras van dirigidas a obras productivas, sociales, viales y ambientalmente sostenibles, que contribuyan al desarrollo socioeconómico y cultural de los habitantes de las comunidades, así como el suministro de bienes, equipos y servicios que permitan el funcionamiento adecuado de las obras que se ejecuten a nivel local, en acción coordinada entre los representantes de corregimientos, los consejos municipales, las alcaldías y el MEF.

E. SECTOR TRANSPORTE



El sector transporte, ha presentado una tendencia positiva y de continuo crecimiento en los últimos años, respaldada por las inversiones en programas y proyectos ejecutados por entidades que comprenden este sector.

Con estas inversiones se ha logrado optimizar la capacidad vial existente lo que promueve el crecimiento del transporte de carga terrestre en Panamá trasladando mayor cantidad de mercancías a nivel nacional y a destinos en Centroamérica, México e incluso a EE.UU. Aunado a esto, el plan de reordenamiento vial llevado a cabo en la ciudad capital busca una integración total de las vías, sin semáforos, mejorando la conexión entre los puntos Norte y Sur de la ciudad capital, como es el caso del Corredor Vía Brasil, tramos I y II.

Por otro lado, la implementación del Sistema de Transporte Masivo (Metro) y la modernización del Sistema de Transporte Colectivo (Metrobús), constituyen una alternativa socialmente atractiva para la población metropolitana, dándole al transporte público una nueva imagen y comodidad al usuario tanto nacional como extranjero; los que además tendrán mayor accesibilidad a lugares turísticos, como el Museo de Gheri o de la Biodiversidad, con la creación de nuevas rutas como: la de Calzada de Amador y la Terminal de Albrook-Eclusas de Miraflores.

Cuadro N° 27

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Transporte - Según Instituciones

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	1,821,816.1	109,177.8	1,930,994.0	1,773,141.8	91.8	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	578.0	0.0	578.0	0.0	0.0	0.0
Autoridad Aeronáutica Civil	21,451.2	26,787.8	48,239.0	38,624.2	80.1	2.5
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	27,807.7	63,695.8	91,503.5	85,490.6	93.4	4.7
Autoridad Marítima de Panamá	14,233.5	2,758.0	16,991.5	13,145.8	77.4	0.9
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	2,610.2	-102.7	2,507.5	1,960.5	78.2	0.1
Ministerio de Economía y Finanzas	7,724.8	88,785.3	96,510.1	55,700.3	57.7	5.0
Ministerio de la Presidencia	1,045,760.0	-320,786.7	724,973.3	696,851.2	96.1	37.5
Ministerio de Obras Públicas	697,648.4	246,829.7	944,478.0	877,721.6	92.9	48.9
Zona Libre de Colón	4,002.5	1,210.6	5,213.1	3,647.6	70.0	0.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Al 31 de diciembre de 2013, el presupuesto modificado para el Sector Transporte ascendía a B/.1,930,994.0 miles, del mismo se ejecutó el 91.8%. Ver cuadro N°27.

El Sector Transporte está conformado por 9 instituciones; 4 pertenecen al Gobierno Central, 4 a Instituciones Descentralizadas y 1 forma parte de las Empresas Públicas.

Es importante destacar, que el mayor porcentaje del presupuesto de inversiones de este Sector recae en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) con 48.9%. Esto debido a importantes proyectos de viabilidad que se están ejecutando como el “Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá”, el cual cuenta con nueve (9) proyectos de infraestructura vial, orientados a disminuir el congestionamiento, tiempo de viaje y el costo de operación vehicular.

Por otro lado, el Ministerio de la Presidencia, ocupa el segundo lugar, con una participación dentro del presupuesto del sector de 37.5%. Su principal proyecto es la Construcción de la Primera Línea del Metro de Panamá.

Las instituciones con mayor porcentaje de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2013 fueron: El Ministerio de la Presidencia, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de Obras Públicas con 96.1%, 93.4% y 92.9% respectivamente.

1. Ministerio de Obras Públicas

El Ministerio de Obras Públicas es el ente encargado del planeamiento, estudio, diseño, ampliación, reparación de la infraestructura vial del país. Es por ello que los últimos años han venido desarrollando proyectos de gran envergadura que permitan mejorar la movilidad urbana.

Actualmente el MOP ejecuta el proyecto “Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá”, el cual está compuesto por las siguientes obras:

Nombre de Proyecto	Monto de Contrato (En Miles de Balboas)	Avance físico/ Dic. 2013 (%)
Reordenamiento Vial-Ciudad de Panamá (MOP):	1,705,417.6	
Construcción Viaducto en Avenida Omar Torrijos - Paseo Andrews	22,500.0	100.0
Construcción Viaducto en Avenida de Los Mártires	29,300.0	100.0
Construcción de Viaducto en Avenida Nacional - Avenida Omar Torrijos	24,740.0	100.0
Mejoramiento y Ensanche de Vialidad Integradora de Barriadas de Tocumen	35,925.0	82.0
Reordenamiento Vial-Ciudad de Panamá (Llave en Mano):		
Construcción y Ensanche Avenida Domingo Díaz (Vía Tocumen)	237,571.3	52.0
Estudios, Diseños, Construcción y Financiamiento de Obras del Corredor Vía Brasil (Tramo I)	216,919.3	99.0
Cruce Vial en la Intersección de Vía Brasil - Avenida Ricardo J. Alfaro		
Cruce Vial en la Intersección de Vía Brasil - Avenida Simón Bolívar		
Estudios, Diseños, Construcción y Financiamiento de Obras del Corredor Vía Brasil (Tramo II)	180,732.2	95.0
Cruce Vial en la Intersección de Vía Brasil - Calle 50		
Cruce Vial en la Intersección de Vía Brasil - Vía Israel		
Construcción Obras para la Preservación del Patrimonio Histórico de Panamá	175,582.8	98.0
Construcción interconexión Ave. Balboa - Puente de Las Américas (Cinta Costera 3)	782,146.9	88.0

Por otro lado, en el interior del país, se están llevando a cabo proyectos, algunos finalizaron a la fecha de cierre de este informe:

- Ampliación de la Carretera David – Boquete, con una inversión de B/.124,203.5 miles y un avance físico de 100%.
- Rehabilitación y Ensanche Carretera La Villa – Las Tablas, con una inversión de B/.86,806.3 miles y un avance físico de 93.0%.
- Rehabilitación y Ensanche de la Carretera Divisa – Chitré, con una inversión de B/.117,559.2 miles y un avance físico de 98.0%.
- Ampliación y Rehabilitación de la Autopista Arraiján - La Chorrera, con una inversión de B/.170,985.3 miles y un avance físico de 95.0%.
- Rehabilitación del Camino CPA - Rodeo Viejo – Soná, con una inversión de B/.43,930.8 miles y un avance físico de 100%.

2. Ministerio de la Presidencia

La Construcción de la Primera Línea del Metro de Panamá, es ejecutada por la Secretaría del Metro, adscrita al Ministerio de la Presidencia. La obra es construida por el Consorcio Línea Uno, conformado principalmente, por la Empresa Española FCC y la Empresa Brasileña Odebrecht.

Se estima que El Metro de Panamá inicie operaciones en el mes de abril de 2014. Dicho proyecto valorado en B/.1,882.0 miles, tienen un avance físico acumulado de 97.0% al 31 de diciembre de 2013, en donde cada una de las fases se han realizado de manera adecuada y oportuna durante toda la etapa de construcción.

A continuación, se presenta una tabla actualizada con los porcentajes de avance de cada una de las macro actividades del proyecto, en el último cuatrimestre de 2013:

Actividad	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Variación % Sep - Dic
Ingeniería	94.5	94.9	95.5	95.5	1.0
Obras Civiles	96.7	97.4	98.0	98.5	1.8
Sistemas Auxiliares	70.3	73.3	77.0	78.0	7.7
Sistema Integral Ferroviario	81.2	86.9	91.0	95.0	13.8
Material Rodante	94.3	95.6	97.0	97.0	2.7
Total	93.1	94.6	95.7	97.0	3.9

Fuente: Secretaría del Metro / Project Manager.

Como se puede observar la mayor variación del cuatrimestre corresponde al Sistema Integral Ferroviario con 13.8% y los Sistemas Auxiliares con 7.7%.

Los datos aportados son estimaciones realizadas por el Project Manager en base a las inspecciones realizadas en campo. El Sistema Integral Ferroviario ha sido uno de los componentes con mayor porcentaje de avance, principalmente por el periodo de pruebas en el que se encuentran varios sistemas, entre ellos, el control de trenes. El componente de menor avance es el de Sistemas Auxiliares, los cuales se encuentran aún en su debido proceso de instalación. Todos los demás componentes presentan un avance acorde a su programación.

Además, se presenta, un análisis general sobre el avance total acumulado hasta el 31 de diciembre del 2013 y su porcentaje de variación en relación al mes anterior.

Año 2013 / Mes	Avance Acumulado %	Variación %
Septiembre	93.1	-
Octubre	94.6	1.5
Noviembre	95.7	1.1
Diciembre	97.0	1.3

Entre el mes de septiembre y octubre, se dio la variación porcentual más alta del cuatrimestre (1.5%), mientras que el porcentaje de variación más bajo se dio entre octubre y noviembre con 1.1%, como se observa en la tabla anterior.

Al finalizar el año 2013, se mantienen los trabajos del complejo ferroviario “Patios y Talleres”, estaciones subterráneas y pozos, estaciones elevadas y viaducto. La culminación de estos trabajos, permitirá dar inicio a la operación comercial de la Línea Uno del Metro de Panamá.

A manera de ejemplo se citan algunos trabajos que se realizan en las 13 estaciones ubicadas entre Albrook y Los Andes:

- Instalación de vidrios en barandillas, escaleras centrales y de accesos.
- Instalación de cerramiento de vidrio en pabellones de accesos.
- Instalación de rejillas y remates de falso techo en nivel de vestíbulo y accesos.
- Instalación de cortina de aire.
- Instalación de mangueras y extintores contra incendios.
- Instalación de sistema de gas y de ventilación menor.
- Canalización para alumbrado e instalación de luminarias.
- Restitución de aceras. Colocación de adoquines y postes de alumbrado.
- Construcción de escaleras en la salida de emergencia.
- Instalación de estructura y paneles de acero vitrificado.
- Instalación de falso techo en nivel vestíbulo.
- Colocación de cerámica esmaltada en paredes de baños.
- Instalación de peldaños de terrazo en escalera centrales.
- Verificación de esperas, puesta tierra e instalación de ductos bajo andén.
- Instalación de sistema de gas y tuberías contra incendios.
- Cableado hasta los chillers y tuberías de agua fría.
- Pulido y abrillantado de terrazo en nivel andén e intermedio.
- Pintado de pilares de acero en nivel intermedio.

- Ejecución de bases y montaje de chillers.
- Restitución y apertura de vía.
- Construcción de bordillo y colocación de adoquines.
- Construcción de losa vestíbulo y rampa de escaleras en acceso.
- Montaje de escaleras mecánicas en accesos.

3. Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre

El presupuesto de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) recibió ajustes por la suma de B/.63,695.8 miles distribuidos en los siguientes proyectos: Adquisición de Terreno, para la construcción las Zonas Pagas, Subsidio Rutas Troncales, Indemnizaciones Especiales y Desarrollo Tecnológico del Registro Único Vehicular.

Entre los proyectos más relevantes que está ejecutando esta Institución, podemos mencionar:

- Adquisición de Terrenos – con un avance físico de 90.0%. Cabe resaltar, que la ATTT ha cumplido con todos los trámites para la adquisición de los terrenos y mejoras de las Terminales de: Ojo de Agua, La Cabima, El Chorrillo, Los Pueblos y La Doña; quedando pendientes los patios de: Santa Librada y Torrijos Carter.
- Habilitación y Construcción de Paradas: Forma parte de los proyectos imperdonables que se ejecutan actualmente. Durante la vigencia fiscal 2013, logró un avance físico del 88.1%, que comprende la instalación de campamentos en áreas seleccionadas, cerramiento perimetral de obras de ocho (8) Zonas Pagas en el Distrito de Panamá y 62 Paradas Típicas en el Distrito de San Miguelito y el proceso de indemnizaciones (pagos) para los trabajadores.

4. Autoridad de Aeronáutica Civil

El presupuesto de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC) recibió un ajuste por la suma de B/.26,787.8 miles, los cuales fueron utilizados para la ejecución y finalización de las obras de los Aeropuertos Internacionales considerados como imperdonables.

Construcción de los Aeropuertos Internacionales:

- Estudio, Diseño y Construcción del Aeropuerto Enrique A. Jiménez: Ubicado en la Provincia de Colón, Ciudad de Colón. Inaugurado el 30 de agosto de 2013, cuenta con modernas instalaciones además de una Torre de Control y la extensión de pista a 2,700 metros lineales. El proyecto tuvo un costo total de B/.58,349.3 miles.
- Construcción del Aeropuerto Scarlett Martínez: Ubicado en la Provincia de Coclé – Río Hato Inaugurado el 13 de noviembre de 2013, este proyecto contempla la construcción del edificio terminal, torre de control, edificio de salvamento extinción de incendio, observatorio meteorológico, cercado perimetral, plataforma, estacionamientos y todo acondicionado para recibir vuelos internacionales; con un costo total de B/.17,300.0 miles.
- Construcción y Remodelación del Aeropuerto Enrique Malek: Ubicado en la Provincia de Chiriquí, Ciudad de David, se firmó el acta de aceptación final el 5 de julio; tuvo un costo total de B/.26,237.7 miles.

5. La Autoridad Marítima de Panamá (AMP):

Esta Entidad recibió ajustes presupuestarios por el orden de B/.2,758.0 miles. Los mismos fueron dirigidos a los siguientes proyectos:

- Equipamiento Sistema de Control de Embarque - Pele Marine: Este proyecto, para la vigencia fiscal 2013, presenta un avance físico de 100.0% y tiene como objetivo la implementación de un sistema de localización, gestión e informes de cobros, sobre tasas, derechos de marinos y naves.
- Rehabilitación de Muelles en Puerto Vacamonte – Panamá: Este proyecto ha concluido, el mismo contempló las siguientes actividades, la rehabilitación del cuartel de bomberos, instalación de un sistema eléctrico de muelles y la instalación del sistema de defensa de los muelles F, D, y B.
- Rehabilitación de Nuevas Instalaciones Administrativas: Este proyecto se encuentra en su fase final, tiene un avance físico del 83.0%.

6. Autoridad de Turismo de Panamá (ATP)

Construcción de una carretera por la Vía Costanera entre las comunidades de Cuango y Santa Isabel: Tiene un costo de B/.18,000.0 miles. Consiste en el estudio, diseño, rehabilitación y construcción de un tramo vial terrestre, por la vía costanera, que comunicará a las Comunidades de Cuango, Playa Chiquita, Palmira, Santa Isabel y otras poblaciones pequeñas. La adecuación del camino existente contemplará la demolición, remoción o reubicación de obstrucciones, construcción de varios puentes vehiculares de hormigón, construcción de mejoras al sistema de drenaje pluvial, señalamiento vial vertical y horizontal. La remoción de árboles con la aplicación de todas las medidas de mitigación que se deriven del Estudio de Impacto Ambiental, EIA.

F. SECTOR ENERGÍA



El Sector Energía con un presupuesto de inversiones modificado por la suma de B/.25,692.8 miles, en la vigencia 2013, ejecutó B/.19,820.0 miles lo que representa una ejecución financiera del 77.1%. Podemos notar un aumento significativo si lo comparamos con el presupuesto asignado para la vigencia 2012, la cual fue B/.6,731.0 miles debido a que durante el año 2013 se utilizaron fondos para la adquisición de Bocas Fruit Company, (BOFCO).

En este sector, sólo tres (3) instituciones están realizando inversiones, de las cuales la Empresa de Generación Eléctrica, ejecutó el 26.3% de sus inversiones de la vigencia, el Banco de Desarrollo Agropecuario ejecutó el 80.3% con sus proyectos de la Planta de Biodiesel y los Sistemas Solares Fotovoltaicos. Además de otras instituciones como la Oficina de Electrificación Rural del Ministerio de la Presidencia, dedicada a la extensión de líneas e instalación de sistemas aislados donde las distribuidoras no llegan, como se observa en el Cuadro N° 28

Cuadro N° 28
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Energía - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado
Total	12,387.8	13,305.1	25,692.8	19,820.0	77.1	100.0
Empresa de Generación Eléctrica	1,000.0	0.0	1,000.0	262.9	26.3	3.9
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	87.8	37.6	125.3	100.6	80.3	0.5
Ministerio de la Presidencia	11,300.0	13,267.5	24,567.5	19,456.4	79.2	95.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Para la vigencia 2013, la Empresa de Generación Eléctrica sólo mantiene un proyecto de inversión que consiste en la Construcción de una Planta de Generación Emergente, el cual tiene como objetivo principal garantizar el suministro de energía en caso de déficit del Sistema Eléctrico Nacional.

En otras contribuciones al sector, ETESA como accionista de la empresa de Interconexión Colombia Panamá (ICP), proporcionó fondos para el estudio del proyecto de Interconexión Eléctrica Colombia-Panamá, el cual muestra avances significativos. ETESA puso en ejecución la Planta de las Guasquitas en Chiriquí con la finalidad de recibir la energía proveniente de la Central Hidroeléctrica Changuinola, con una capacidad instalada de 223 Megavatios que generará aproximadamente 1,046 GWh (Gigavatios horas).

Por otro lado, el Programa de Electrificación Rural durante la vigencia 2013, se mantuvo ejecutando proyectos a nivel nacional como La Extensión de Líneas, Instalación de Sistemas Aislados y el Fortalecimiento de las Capacidades Técnicas de los funcionarios involucrados al proyecto.

G. SECTOR TELECOMUNICACIONES



El Sistema Estatal de Radio y Televisión (SERTV) y el Ministerio de Gobierno (MINGOB), conforman este sector, cuyo aporte es muy importante al desarrollo económico y social del país, ya que sus proyectos están orientados a la educación y cultura.

SERTV, busca a través de sus proyectos mejorar la calidad y programación del canal, para así poder brindar una mejor información a sus televidentes y radio escuchas.

Cuadro N° 29
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Telecomunicaciones - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	665.0	2,082.2	2,747.2	2,563.7	93.3	100.0
Ministerio de Gobierno	175.0	121.2	296.2	138.6	0.0	10.8
Sistema Estatal de Radio y Televisión	490.0	1,961.0	2,451.0	2,425.1	98.9	89.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Las inversiones orientadas a fortalecer las actividades vinculadas con el sector de telecomunicaciones, estuvieron a cargo del Sistema Estatal de Radio y Televisión, el cual mostró un presupuesto modificado de B/.2,451.0 miles, lo que significa, que tuvo una participación del 89.2% del presupuesto modificado para este sector y una ejecución presupuestaria de 98.9%, mientras que el MINGOB mostró un presupuesto modificado de B/.296.2 miles, lo que indica que su participación en el modificado del sector fue de 10.8%. Ver Cuadro N°29.

Dentro de la cartera de proyectos de inversión que ejecuta SERTV se destacan los siguientes proyectos:

- Mejoramiento de Infraestructura y Equipo de Radio y Televisión: Este proyecto busca mejorar la cobertura actual y contar con equipos que permitan llevar a nivel nacional una señal de radio y televisión a la sociedad en general, brindando educación y cultura. De igual manera, este proyecto ha logrado contar con más seguridad en las instalaciones, evitando ser víctimas de robos.
- Ampliación de la Programación Educativa y Cultural de SERTV: Este proyecto ha enfocado su programación en la temática educacional, de seguridad ciudadana, equidad de derechos humanos, desarrollo, nación y conciencia ciudadana. Se ha trabajado en la ampliación de las horas de programación, para fortalecer la programación diaria, permitiendo la educación a televidentes que no tienen acceso a televisión por cable en toda la geografía nacional.

H. SECTOR AGROPECUARIO



El Sector Agropecuario actualmente se encuentra en una etapa de crecimiento por medio de los proyectos de modernización de la infraestructura y la ratificación de acuerdos comerciales con diferentes países, los cuales le permiten a Panamá participar en nuevos mercados internacionales. En el Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014, se ubicó la agricultura como uno de los cuatro motores de crecimiento, junto a los aportes generados por Logística, Turismo y Servicios Financieros.

La ejecución de proyectos de infraestructura, como los son: sistemas de riego, invernaderos y caminos de producción, le permitirán a los productores aprovechar el crecimiento económico de Panamá. Uno de los proyectos de infraestructura más importantes que tiene un impacto directo en este Sector, es el Desarrollo de la Cadena de Frio (Ver Sector Comercio, Industria y Turismo), que surge como mecanismo para disminuir la pérdida en el proceso de producción y comercialización de los productos agrícolas y por ende reducir el precio de la canasta básica.

Por otro lado, el paquete de Leyes Agropecuarias (104, 105, 106, 107, 108 y 110), aprobadas en el mes de noviembre, buscan incentivar la producción agropecuaria y lograr la autosuficiencia en distintos rubros agrícolas. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario, estima que con éste paquete de Leyes se beneficiaran cerca de 6,000 productores y se espera que en 5 años se incremente en un 35.0%, el número de hectáreas producidas a nivel nacional.

Cuadro N° 30
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Agropecuario - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	55,712.3	49,296.8	105,009.2	76,476.2	72.8	100.0
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	1,683.8	-14.6	1,669.2	952.3	57.1	1.6
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	3,284.3	698.1	3,982.4	2,910.7	73.1	3.8
Instituto de Mercadeo Agropecuario	910.0	-891.6	18.4	15.4	83.4	0.0
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	46,859.2	49,504.9	96,364.1	69,631.2	72.3	91.8
Ministerio de la Presidencia	2,975.0	0.0	2,975.0	2,966.6	99.7	2.8

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El Sector Agropecuario está conformado por cinco (5) instituciones a mencionar: Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), regente del Sector, presenta la mayor asignación presupuestaria modificada con B/.96,364.1 miles; luego sigue el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP), con B/.3,982.4 miles; el Ministerio de la Presidencia, con B/.2,975.0 miles; la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), con B/.1,669.2 miles y por último el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con una asignación presupuestaria modificada de B/.18.4 miles. La mayor ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2013 fue la del Ministerio de la Presidencia (99.7%), y la menor la del ARAP con 57.1%. Ver Cuadro N°30.

1. Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

El MIDA con la visión de ser un sector agropecuario al servicio del productor y la población, donde se procure la competitividad y el mejoramiento del medio rural de forma sostenible y equitativa por medio de la concertación de todos los sectores involucrados, permitiendo a los productores y al resto de la población ejecutar los siguientes proyectos:

- El proyecto de Transformación Agropecuaria: Regido por la Ley 25 de 2001, tiene como meta ejecutar 150 nuevos planes de inversión. Al 31 de diciembre de 2013, se habían aprobado 119 planes de inversión por un monto de B/.8,241.2miles, de los cuales B/.1,072.5 miles pertenecen a actividades agrícolas, B/.352.4 miles a actividades agroindustriales, B/.5,187.6 miles a actividades pecuarias y B/.1,628.7 miles a otras actividades.
- Productividad Rural: En el 2013 se aprobaron 37 planes de negocio, sobrepasando la cifra programada para esta vigencia. A la fecha se han aprobado un total de 167 planes de negocio. Además, se aprobaron 49 nuevos subproyectos beneficiando un total de 1,367 productores. Durante el segundo semestre, el proyecto culminó las acciones para el cumplimiento de las salvaguardas sociales del Banco Mundial, con la elaboración e implementación del Plan de Participación Indígena-PPI, que consiste en el apoyo técnico y financiero para la ejecución de planes o alternativas productivas en las áreas anexas de la Comarca Ngabe Buglé. A la fecha, se han aprobado 3 planes de negocios que benefician a 106 productores.
- Producción de Moscas Estériles: Presenta un avance físico acumulado de 95.0%. Por medio de la planta productora de moscas estériles se garantiza el sostenimiento de la Barrera Biológica, que se mantiene desde la provincia de Darién, hasta 20 millas náuticas dentro del territorio colombiano. Durante el mes de diciembre se realizaron 24 vuelos para dispersar 73,406,630 moscas estériles con una cobertura de 14,819 millas.
- Sistema de Riego Tonosí: Actualmente se encuentra en un proceso de indemnización a los dueños de los terrenos. La inversión total del proyecto asciende a B/.155,084.6 miles y actualmente presenta un avance físico de 15.0%. Este proyecto ha presentado dificultades en su ejecución ya que existe una negativa de los afectados respecto al proyecto.
- Construcción de un Dique en Río Chico, Provincia de Coclé: Presenta un avance de 50.0% respecto a las obras de dragado y ampliación de 5.6Km. de cauce
- Sistema de Riego de Alto Bambito y Río Sereno: A la fecha tiene aprobado el Estudio de Impacto Ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Ambiente.

Otros proyectos que ejecuta el MIDA a través de la Dirección de Ganadería son: Mejoramiento Ganadero, por medio del cual se adquirieron y entregaron 371 sementales (308 de raza cebuina y 63 de raza lechera); Inseminación Artificial, con 1,941 inseminaciones, se realizaron 3 seminarios de inseminación artificial bovina y un seminario de diagnóstico reproductivo, en la que se beneficiaron 28 productores y 10 técnicos a nivel regional; por último, en el proyecto de Difusión se realizaron 224 eventos de extensión continua, beneficiando a 4,305 productores.

2. Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP)

La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá para el año 2013, contó con un presupuesto modificado de B/.1,683.8 miles. Es una de las instituciones dentro del Sector Agropecuario comprometida con el desarrollo del país, mediante el uso sostenible de los recursos acuáticos.

Dentro de la institución existen algunos programas y proyectos que buscan la sostenibilidad de los recursos acuáticos, entre estos se encuentran:

- Programa de Desarrollo y Masificación de la Acuicultura Rural: A diciembre del 2013, contó con un presupuesto modificado de B/.260.0 miles y una ejecución presupuestaria de 78.3%. El proyecto busca contribuir a la seguridad alimentaria para las familias rurales, permitiendo que los productores logren un nivel de autogestión que permita evitar la dependencia estatal.
- Mejoramiento de las Estaciones Experimentales: Con un presupuesto de inversión modificado de B/.339.5 miles, durante el segundo semestre del 2013, presentó una ejecución presupuestaria de 84.7%. El proyecto busca adecuar infraestructuras que permitan desarrollar investigaciones en temas de pesquerías con el propósito de llevar un mejor control en el registro de las diferentes especies.
- Implementación de Metodologías para la Extracción de Redes: El Proyecto apunta a diseñar en conjunto con la comunidad, un plan de acción integral para la recolección y limpieza de la basura marina (redes fantasmas), puesto que cada año mueren muchas aves, tortugas, peces y mamíferos marinos que quedan enredados en estas redes. De igual forma busca recuperar las zonas de interés pesquero.

3. Instituto de Investigaciones Agropecuarias de Panamá (IDIAP)

El IDIAP para la vigencia 2013, tenía un presupuesto Ley de B/.3,284.3 miles. Ejecutó tres grandes programas: Investigación e Innovación Agropecuaria, con una ejecución física de 75.0%; Apoyo a la Investigación e Innovación Agropecuaria, con un avance físico de 94.9% y el programa de Crédito de Contingencia que presentó una ejecución física de 76.5% al 31 de diciembre del 2013.

Los principales proyectos ejecutados dentro de estos programas son:

- Innovación Tecnológica de Cadenas Productivas: Alcanzó 100.0% de avance físico. Tiene entre sus principales actividades: La distribución geográfica del virus del torrado del tomate en Panamá; Desarrollo y puesta a punto de técnica del virus del torrado del tomate; Identificación y diferenciación molecular de biotipos de *Bemisia tabaci*, asociados a la transmisión del virus del torrado del tomate. Además, se realizó el estudio de percepción sobre pastura degradada y cambio climático; Construcción de una base de dato del conocimiento local y científico sobre rasgos

- funcionales de especies leñosas y herbáceas de interés, para el diseño de sistemas silvopastoriles; estudio biofísico y socioeconómico de fincas avanzadas con sistemas silvopastoril y fincas tradicionales.
- Mejoramiento Genético de Cultivos y Animales: Con un avance físico de 11.1%. Durante el 2013 se establecieron parcelas de evaluación genotipo ambiente de cultivares de soya a nivel nacional.
- Multiplicación de Semillas: Presenta un avance físico del 100%. Con un total de doce (12) actividades en ejecución, las más importantes son: Producción de semilla de arroz, plátano y variedades criollas; Producción de vitroplantas en Río Hato y producción de semilla de maíz, hortalizas, raíces y tubérculos en el Área Azuero.
- Desarrollo de Servicios Científicos y Tecnológicos: Con un avance físico de 96.9%, se llevaron a cabo las siguientes actividades: Desarrollo de capacidades e innovación participativa en el uso de: sistema de cruce de dos (2) razas (*Bos taurus* maternal x *Bos indicus*), controles estratégicos de parásitos internos en hatos de pequeños y medianos ganaderos, uso de la suplementación de macro-minerales y micro-minerales para el desarrollo de novillas, aplicación de metodologías para la caracterización y tipificación de los ecosistemas.
- Crédito Agrícola: Este proyecto cuenta con 76.5% de progreso y ejecuta un total de 52 actividades, de las cuales ocho se encuentran en la fase de “inicio en campo”, 37 en “toma de datos”, dos (2) en “análisis de datos” y cinco en “redacción de informe”.

4. Ministerio de la Presidencia

El Ministerio de la Presidencia para la vigencia 2013 tenía un presupuesto Ley de B/.2,975.0 miles. El proyecto de mayor impacto en el Sector es la Implementación de Granjas Auto Sostenibles y Huertos Escolares, con una asignación presupuestaria de B/.2,200.0 miles, presentó una ejecución física de 73.0%. Las principales actividades ejecutadas fueron: Asistencia financiera a los huertos de la Comarca Ngabe Buglé y la provincia de Veraguas, se entregaron 280 kits de huertos en la provincia de Colón y se realizaron encuentros regionales para capacitar a las familias en temas de huertos y granjas auto sostenibles.

I. SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO



El Sector Industria, Comercio y Turismo, es uno de los sectores con mayor participación en la expansión económica que actualmente goza el país. Esta expansión está apoyada por el desarrollo de diferentes programas ejecutados por las instituciones dentro del sector.

Muchos de estos programas buscan promover las exportaciones a través de una mejor calidad y focalización de los servicios públicos para la gestión comercial, razón por la cual se debe aprovechar todas las oportunidades que ofrece la apertura comercial, con un claro énfasis en las empresas exportadoras, las empresas proveedoras de las firmas exportadoras, y las empresas con potencial exportador.

El Sector productivo del país, también se ve impulsado por la realización de diversos Tratados de Libre Comercio (TLC's) y diferentes Acuerdos de Alcance Parcial los cuales permiten el intercambio comercial beneficiando a todos los sectores de la economía.

Otro punto importante dentro del desarrollo económico de este Sector, es la promoción del turismo, el cual forma parte de una estrategia que ha permitido mercadear la imagen de Panamá a nivel nacional e internacional como destino turístico, apoyado con el fortalecimiento logístico que se está realizando en el país.

Cuadro N° 31
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	252,853.2	74,704.5	327,557.7	294,603.2	89.9	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	1,150.0	0.0	1,150.0	457.7	39.8	0.4
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	19,916.0	-188.2	19,727.8	18,169.5	92.1	6.0
Autoridad de Turismo de Panamá	28,075.9	15,108.5	43,184.4	35,565.9	82.4	13.2
Instituto de Mercadeo Agropecuario	29,545.6	21,398.2	50,943.8	49,701.0	97.6	15.6
Ministerio de Comercio e Industrias	12,700.0	7,774.9	20,474.9	18,287.4	89.3	6.3
Ministerio de la Presidencia	156,750.0	27,319.8	184,069.8	168,602.3	91.6	56.2
Zona Libre de Colón	4,715.7	3,291.3	8,007.1	3,819.4	47.7	2.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo al Cuadro N° 31, al segundo semestre del 2013, la asignación presupuestaria en el sector ascendió a B/.327,557.7 miles. Durante este semestre, el Sector logró realizar actividades por un monto de B/.294,603.2 miles, representando el 89.9% del presupuesto modificado para el Sector. En relación a los presupuestos modificados de las instituciones del Sector, se puede observar que los montos más altos se le asignaron al Ministerio de la Presidencia con B/.184,070.0 miles, al Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) con B/.50,943.8 miles, a la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) con B/.43,184.4 miles, al Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) con B/.20,474.9 miles, y a la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) con B/.19,727.8 miles.

A nivel institucional, las entidades que mostraron altos niveles de ejecución fueron: el IMA con 97.6%, AMPYME con 92.1%, Presidencia con 91.6%, el MICI con 89.3%, la ATP con 82.4% respectivamente. Entre los principales proyectos llevados a cabo por las instituciones dentro del sector, se pueden mencionar:

1. Ministerio de la Presidencia

El proyecto de mayor impacto que ejecuta el Ministerio de la Presidencia en este Sector es el “Desarrollo de la Cadena de Frío”, ejecutado por la Secretaría de Cadena de Frío y consiste en la Construcción de ocho (8) Mercados Públicos a nivel nacional, con un avance físico promedio de 84.3%, y la Implementación de la Cadena de Frío o Construcción de Centros de Manejo Post Cosecha con una ejecución física de 95.0%.

Actualmente se están construyendo 3 Mercados Públicos, a mencionar:

- **Mercado de Panamá o Unidad Alimentaria:** Con un avance físico de 93.0%, se encuentra en su fase final. Para el segundo semestre se ejecutaron actividades en las naves 72, 60 y 20. Las naves son las áreas de almacenaje de los productos agrícolas. Las principales actividades llevadas a cabo en las naves fueron: Limpieza de estructura, instalación de baldosas en escaleras de cafetería, colocación de estructuras para cielo raso, pruebas de electricidad, prueba de rociadores y repello de paredes. Por otro lado, en la nave de los productores se procedió a la instalación de sistemas especiales y construcción de rampas para discapacitados.
- **Mercado de David:** Con un avance físico de 96.0%, el proyecto beneficiará a 178 comerciantes y 13,663 consumidores. Dentro las actividades ejecutadas se puede mencionar: Instalación de equipo contra incendios y rociadores, inodoros, ductos de retorno y extractores de aseo en losas de mezanines. Además, se procedió a pintar el muro exterior perimetral y pérgolas de acero. En el área central del mercado se instaló el sistema eléctrico, estructuras para cielo raso suspendido y tuberías del sistema de frío industrial. En el área de cocina se instalaron los ductos de retorno y extractores de aseo en losas, instalación de tablilla, sobres de granito en baños y mostradores de cocinas; por último, en el área de servicios complementarios se instalaron las lámparas en el módulo comercial y técnico de tablillas de PVC para cielo raso, instalación de carpintería de aluminio y vidrio en puestos del módulo comercial y técnico.
- **Mercado de la Chorrera:** Con un avance físico del 10.0%, este proyecto beneficiará cerca de 73,669 personas. Las actividades ejecutadas durante el último semestre fueron: acarreo de exceso de material resultante de las excavaciones, se vació concreto de 2000PSI, se colocaron los aceros de parrillas inferiores y superiores, se realizaron excavaciones para alojar columnas y colocar las formaletas para los muros.

- El Mercado de Colón, es ejecutado por el Programa de Ayuda Nacional y será entregado a dicha institución a inicios del 2014.
- El Mercado de Chitré, inició su construcción en el segundo semestre del 2013, pero no presentó un avance significativo.
- Los Centros de Manejo de Post cosecha de Volcán y Cerro Punta se inauguraron en el 2013. Quedan pendiente los Centros de Dolega y El Ejido, ambos con 90.0% de avance físico. Con estos Centros se beneficiarán cerca de 3,500 productores distribuidos en la provincia de Chiriquí y en la Península de Azuero.

2. Autoridad de Turismo de Panamá

La ATP, encargada de fomentar la actividad turística dentro del país, contó con un presupuesto Ley para el 2013 de B/. 28,075.9 miles. Entre los programas más relevantes ejecutados por la Institución se encuentran:

- El Programa de Difusión del Turismo a Nivel Internacional, durante el segundo semestre del 2013 presentó una ejecución física de 100%. Mediante este programa se pudo participar en diferentes ferias internacionales tales como: La Feria “Setrade Cruise Shipping”, realizada en Florida, Miami, La Feria de “IMEX FRANKFRUT 2013”, celebrada en Alemania, permitiendo promover las opciones turísticas que ofrece Panamá.
- El Plan Maestro de Turismo Sostenible, formulado como una estrategia básica para el crecimiento del Sector Turismo, a diciembre del 2013, logró alcanzar una ejecución física del 100%, en actividades dirigidas a fortalecer el turismo en Panamá, entre ellas: El desarrollo de servicios de consultorías para el otorgamiento de la marca de calidad turística, a las empresas que participan del plan piloto, el desarrollo de capacitaciones en temas de negociación, comunicación y uso de la información a las personas dedicadas a las actividades económicas dentro del sector turístico.

3. Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)

Tiene un presupuesto modificado de B/.50,943.8 miles y una ejecución presupuestaria de 97.6% a diciembre del 2013. El proyecto que recibió mayor ajuste presupuestario en la vigencia fiscal fueron “Las Jumbo Tiendas”, con un ajuste de B/.18,906.7 miles y una ejecución presupuestaria de 98.6%.

El IMA con el objetivo de reducir el costo de la canasta básica ejecuta los siguientes proyectos:

- Las Jumbo Ferias presentan un avance físico de 93.0%. Durante el año 2013, se realizaron 798 Jumbo Ferias del Ahorro en todo el país.
- Las Jumbo Tiendas cuentan con un avance físico de 99.0%. A la fecha se han inaugurado 384 jumbo tiendas a nivel nacional. Para el 2013 se instalaron 184 jumbo tiendas lo que representa un 91.4% de cumplimiento con relación a la meta inicial de 420 jumbo tiendas.
- Fortalecimiento a la Feria de Productos Básicos presenta una ejecución física anual de 100.0%. En el 2013 se colocaron 58,296 ferias. Este proyecto ha beneficiado alrededor de 70,000 familias.

- Fortalecimiento Programa Ferias del Productor, con un avance físico de 89.0%. En el periodo 2013, se realizaron 1,228 ferias itinerantes.

Se estima que los proyectos mencionados anteriormente han beneficiado de forma directa a una población aproximada de 1,236,680 personas.

4. Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

La AMPYME para el 2013 contó con un presupuesto Ley de B/.19,916.0 miles, y un presupuesto modificado de B/.19,727.8 miles. Durante el último periodo del 2013, AMPYME registró una contribución significativa al desarrollo empresarial, mediante la ejecución de algunos proyectos como:

- Fondo de Garantía para Préstamos: Durante el segundo semestre del 2013, el programa ejecutó 20%, más de lo programado, logrando beneficiar a 1,719 empresas destinadas a desarrollar actividades de comercio, servicios, agropecuarias, industrias y artesanías.
- Desarrollo de Cultura Empresarial: Este programa contó con una ejecución de su presupuesto modificado de 98.0%, logrando capacitar a 1,039 estudiantes en diversos temas relacionados a los procesos que conllevan iniciar una empresa.
- Desarrollo de Turismo Empresarial: Con un 85.0% de ejecución física, a diciembre del 2013 se capacitó a 63 emprendedores de todo el país, para que puedan desarrollar planes de negocios.
- Capacitación y Oportunidades de Negocio - Plantas Móviles: A diciembre de 2013, presentó un porcentaje de ejecución física de 75.0%. Con este proyecto se beneficiaron 1,600 emprendedores, quienes participaron en diversas capacitaciones realizadas en distintas plantas, entre ellas: Panadería, manualidades, conservas, deshidratados, lácteos y cursos de belleza. A su vez, se realizaron entregas de toldas con bases plásticas y sombrillas, kits para negocios de peluquería y kits para la elaboración de conservas y lácteos.
- Mi Primer Empleo: A diciembre del 2013, el programa presentó un presupuesto asignado de B/.6,000.0 miles. El mismo contó con la participación de 8,700 jóvenes, quienes están en proceso de iniciar su negocio.

5. Ministerio de Comercio e Industrias (MICI)

El MICI como entidad regente del sector, busca implementar acciones orientadas al desarrollo de los sectores de la producción, el comercio y servicios, aunado a la ciencia y tecnología y aspectos innovadores para enfrentar la competitividad y fomentar la modernización. La institución dentro de su presupuesto de inversiones cuenta con el desarrollo del programa Fortalecimiento de la Competitividad y Apertura Comercial que al segundo semestre del 2013, contó con un presupuesto modificado B/.20,474.9 miles, y un avance físico de 89.3%.

El propósito del programa es alcanzar una mayor agilidad en la gestión del sector público para la apertura comercial, una mayor participación del sector privado en la provisión de servicios financieros y no financieros y una mayor inserción de las comunidades indígenas.

Uno de los principales proyectos que se destaca dentro del programa es el de Manejo de Servicios del Fomento para la Exportación, con un presupuesto modificado a diciembre del 2013 de B/.6,197.1 miles y una ejecución presupuestaria de 91.1%, el mismo busca fortalecer y fomentar las actividades económicas en términos de competitividad, sostenibilidad, y equidad frente al proceso de integración económica, logrando aprovechar las oportunidades que emanan de los procesos de apertura de mercados.

Algunos proyectos realizados por el MICI:

- **Mejoramiento a la Producción Artesanal:** Comprende un programa de capacitación académico, dirigido a artesanos de toda la geografía nacional, dotándolos de conocimientos prácticos sobre diseños, rediseños, producción, administración y comercialización artesanal.
- **Desarrollo de los Procesos de Certificación de las Normas ISO 9001-2008:** Con un presupuesto modificado de B/.44.8 miles durante la vigencia 2013, este proyecto busca la modernización de los procesos administrativos; mediante un enfoque dirigido a la atención al cliente favoreciendo a los clientes internos que se han desarrollado en el área electrónica, también favorece al cliente externo y público en general.

Otros proyectos que ejecuta la institución, buscan fortalecer el apoyo financiero a los artesanos de escasos recursos económicos, con la finalidad de que puedan comprar materia prima de buena calidad y logren comercializar y promocionar sus productos.

6. Zona Libre de Colón (ZLC)

Con un presupuesto modificado de B/.8,007.1 miles, esta entidad lleva a cabo dentro de su ejecución varios proyectos entre los cuales se destaca la Construcción del Nuevo Edificio de la Administración, el cual a diciembre del 2013, presentó un porcentaje de ejecución física de 47.7%. El mismo tiene como objetivo brindar mejores condiciones administrativas que sean reflejo del crecimiento comercial experimentado por la Zona Libre de Colón.

J. SECTOR FINANZAS



Considerado uno de los motores del crecimiento del país, el Sector Finanzas puede desarrollar una ventaja competitiva sostenible, apoyada de diversas acciones gubernamentales que pueden ser utilizadas para potenciar el Sector.

Dentro del ámbito público, existen entidades que buscan impulsar el desarrollo de diferentes actividades agropecuarias y proyectos agroindustriales a través del financiamiento, dando prioridad a los micros, pequeños y medianos productores. También permiten proporcionar financiamiento a programas nacionales de vivienda de acuerdo a los planes de desarrollo del Estado.

Cuadro N° 32
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Finanzas - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado
Total	70,968.3	753.8	71,722.1	35,035.6	48.8	100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	61,904.0	-2,040.0	59,864.0	25,613.2	42.8	83.5
Banco Hipotecario Nacional	5,453.8	-542.2	4,911.6	2,980.9	60.7	6.8
Instituto de Seguro Agropecuario	3,610.5	3,336.0	6,946.5	6,441.5	92.7	9.7

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Al segundo semestre del 2013, como se aprecia en el Cuadro N° 32, la asignación presupuestaria del sector fue de B/.71,722.1 miles. Durante este período las instituciones dentro del Sector lograron realizar actividades por B/.35,035.6 miles, representando un 48.8% de ejecución. Las principales Entidades que ejecutan proyectos en el Sector son:

1. Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA)

La Institución con mayor participación dentro del Sector Finanzas es el BDA con el 83.5% o B/. 59,864.0 del presupuesto modificado. Durante el 2013, el BDA refleja una cartera activa de B/.153,800.0 miles conformada por la actividad agrícola con B/.26,100.0 miles, pecuaria con B/.94,800.0 miles y otras actividades con B/.32,900.0 miles; distribuidos en 14,349 proyectos agropecuarios a nivel nacional. Las provincias de Los Santos, Chiriquí, Panamá, Veraguas, Coclé, Herrera y Darién son las provincias que administran mayor cantidad de operaciones.

En cuanto a la actividad agrícola destacan los siguientes rubros: Maíz, arroz, café, plátano y palma aceitera. En la actividad pecuaria sobresalen el ganado vacuno de cría, ganado de leche, ceba y doble propósito, mejoras pecuarias y pesca artesanal. Por último, dentro de otras actividades podemos mencionar compra de fincas agropecuarias, infraestructura y equipo, pago de deuda agropecuaria, compra y titulación de tierra.

Al 31 de diciembre del 2013 se aprobaron 1,963 operaciones crediticias por un monto de B/.27,200.0 miles y se desembolsaron B/.25,800.0 miles. Las regionales de Los Santos, Chiriquí, Panamá, Veraguas, Darién y Coclé presentaron la mayor cantidad de operaciones aprobadas y desembolsadas.

El proyecto de mayor impacto del BDA, es el “Manejo de Crédito Agropecuario”, con una ejecución presupuestaria de 59.6% a diciembre de 2013, el mismo tiene como objetivo, lograr que los pequeños y mediano productores tengan acceso a préstamos con tasas de intereses blandas y cómodas.

2. Banco Hipotecario Nacional (BHN)

Su principal proyecto es el “Financiamiento de viviendas”, con un presupuesto Ley para el año 2013 de B/.5,453.8 miles. Este proyecto tiene como propósito, otorgar financiamiento a través de créditos hipotecarios para viviendas de interés social. A su vez el BHN, realiza compra de créditos hipotecarios a la banca local, con el objetivo de bajar el déficit habitacional que actualmente existe en el país.

Durante la vigencia 2013, el BHN otorgó 169 préstamos de viviendas para el proyecto “Financiamiento de Viviendas”, su ejecución física al 31 de diciembre de 2013, es de 95.0% y se han favorecido aproximadamente a 761 personas.

3. Instituto de Seguro Agropecuario (ISA)

El ISA tiene una participación de 9.7% dentro del Sector Finanzas. Al 31 de diciembre del 2013, presentó una ejecución presupuestaria de 92.7%. El proyecto de “Fondo de Garantía de Actividad Agropecuaria”, recibió un incremento presupuestario por la suma de B/.3,336.0 miles. Dicho proyecto tiene como objetivo tener un respaldo financiero sólido y que pueda cubrir de manera expedita los pagos de indemnizaciones por los riesgos propios de los seguros agrícolas, ganaderos, fianzas y vida rural. En el 2013, la suma total de seguros fue de B/.6,829.6 miles y la tasa de siniestralidad fue de 17.0%. Además, se realizaron indemnizaciones por la suma de B/.68.6 miles.

L. SECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES



Entre las principales actividades de este sector, están el fortalecimiento de las instituciones (capacitación del personal, pequeñas construcciones o mejoras a las edificaciones existentes, equipamiento y estudios sectoriales, entre otras). Además, este sector, involucra el desarrollo de actividades internacionales tales como, la implementación de los convenios USAID, La Asamblea de Gobernadores desarrollada en Panamá, manejo con Organismos Multilaterales como la CAF, BID, BM, PNUD y FOMIN, entre otros.

Cuadro N° 33

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Administración y Servicios Generales - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado
Total	225,630.7	170,273.8	395,904.5	301,654.9	76.2	100.0
Asamblea Nacional	4,885.0	50,755.8	55,640.8	50,418.4	90.6	14.1
Autoridad de Protección Al Consumidor y Defensa de la Competencia	0.0	6.8	6.8	6.8	100.0	0.0
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	0.0	1,553.6	1,553.6	1,553.6	100.0	0.4
Autoridad Nacional de Aduanas	1,680.0	541.9	2,221.9	762.0	34.3	0.6
Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá	0.0	756.6	756.6	25.3	3.3	0.2
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	6,236.4	3,707.8	9,944.2	8,261.4	83.1	2.5
Autoridad Nacional de Titulación de Tierras	9,244.3	0.0	9,244.3	4,993.8	54.0	2.3
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	8,600.0	14,070.2	22,670.2	22,300.7	98.4	5.7
Contraloría General de la República	738.6	2,252.9	2,991.5	329.8	11.0	0.8
Dirección General de Contrataciones Públicas	5,505.0	125.0	5,630.0	1,075.0	19.1	1.4
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	630.0	0.0	630.0	0.0	0.0	0.2
Lotería Nacional de Beneficencia	238.5	931.6	1,170.1	849.9	72.6	0.3
Ministerio de Economía y Finanzas	134,104.3	-11,000.9	123,103.4	70,745.9	57.5	31.1
Ministerio de Gobierno	2,500.0	6,465.7	8,965.7	8,965.7	100.0	2.3
Ministerio de la Presidencia	6,407.0	57,004.0	63,411.0	61,445.8	96.9	16.0
Ministerio de Relaciones Exteriores	7,784.9	11,196.2	18,981.1	5,338.2	28.1	4.8
Ministerio de Seguridad Pública	650.0	2,346.3	2,996.3	2,346.2	78.3	0.8
Registro Público de Panamá	13,318.9	4,168.0	17,486.9	14,361.1	82.1	4.4
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)	20,350.0	18,650.0	39,000.0	38,439.4	98.6	9.9
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	225.0	11.1	236.1	185.5	78.6	0.1
Tribunal Electoral	2,533.0	6,731.0	9,264.0	9,250.4	99.9	2.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Este sector está muy vinculado con el sector privado, debido a que la naturaleza de los proyectos que desarrolla, lo lleva a interactuar de forma directa con dicho sector.

Al 31 de diciembre de 2013, las inversiones orientadas al Sector de Administración y Servicios Generales, ejecutó B/.301,654.9 miles, representó un 76.2 % del total del presupuesto modificado, el cual ascendió a B/.395,904.5 miles.

Dentro de este Sector, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa a la Competencia, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y el Ministerio de Gobierno, fueron las entidades que lograron la mayor ejecución Presupuestaria alcanzando un 100 % de ejecución. Ver Cuadro N° 33.

L. SECTOR JUSTICIA



Este sector, incluye la administración de justicia y otras actividades necesarias para el mantenimiento del orden público interno e igualmente la seguridad del Estado, afectado por acciones o actividades externas. En tal sentido, podemos indicar que el sector encamina su accionar en materias relativas al orden público; la convivencia ciudadana y los derechos humanos; a la participación ciudadana en la vida y organización social y política de la Nación; a las relaciones entre la Nación y las entidades territoriales de la República; al acceso a la justicia, la justicia formal y del derecho; a la gestión jurídica pública; a la defensa jurídica del Estado, y del ordenamiento jurídico; política criminal; a lo penitenciario y carcelario; seguridad jurídica, entidades territoriales, acceso a la justicia y trata de personas; al problema mundial de las drogas; a la seguridad jurídica; impulsar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, el orden público y la convivencia ciudadana; al cumplimiento y ejecución de leyes y sentencias judiciales y la investigación de los delitos. etc.

Para la vigencia del año 2013, las actividades orientadas a fortalecer el sector justicia fueron ejecutadas principalmente por seis (6) instituciones referidas en el Cuadro N° 34, las cuales presentan un Presupuesto Ley total de B/.66,303.3miles, monto que recibió un ajuste presupuestario de B/.38,437.9 miles. Lo que se tradujo en un monto modificado de B/.104,741.1 miles, del cual se ejecutó B/. 75,410.0 miles, un 72.0%.

Del presupuesto modificado le correspondió al Ministerio de Gobierno, el más elevado B/. 69,279.8 miles, un 66.1% de participación del total, seguido del Órgano Judicial, con B/. 23,033.3 miles el 22.0% y la Procuraduría General de la Nación con B/.10,396.3 miles el 9.9% de participación.

Cuadro N° 34
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Justicia - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado
Total	66,303.3	38,437.9	104,741.1	75,410.0	72.0	100.0
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	1,400.0	-42.1	1,357.9	1,313.9	96.8	1.3
Ministerio de Gobierno	36,725.0	32,554.8	69,279.8	48,535.2	70.1	66.1
Órgano Judicial	19,301.1	3,732.2	23,033.3	15,146.9	65.8	22.0
Procuraduría de la Administración	19.4	217.1	236.5	236.3	99.9	0.2
Procuraduría de la Nación	8,495.0	1,901.3	10,396.3	9,776.0	94.0	9.9
Tribunal de Cuentas	362.8	74.5	437.3	401.7	91.9	0.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Cada una de estas instituciones contribuye al Sector con proyectos de inversión, que son fundamentales para el bienestar y seguridad del País. Dentro de éstas, se destacan para la vigencia 2013 las siguientes:

1. Ministerio de Gobierno

Dentro de los proyectos que llevó a cabo el Ministerio de Gobierno durante la vigencia 2013, está la construcción del Centro Penitenciario La Nueva Joya, para el cual se contó con un monto modificado de B/.54,192.0 miles y cuyo avance físico es de 85.0%; y la construcción del Centro Penitenciario de Chiriquí, con un presupuesto modificado de B/. 4,250.0 miles y un avance físico del 34.8%.

2. Órgano Judicial

Entre los proyectos que se llevaron a cabo durante la vigencia de 2013, en esta entidad están:

- Construcción de la Unidad Judicial de la Chorrera, cuyo monto modificado es de B/. 4,250.00 miles, con un avance físico de 27.3%.
- Mejoramiento de los Edificios del Órgano Judicial, con un monto de B/.3,478.6 miles y un avance físico de 100.0%.
- Construcción y Equipamiento de la Unidad Judicial de Coclé, con un monto de B/.1,353.5miles y con un 80.0% de avance físico.
- Construcción del Edificio para Audiencias en el Centro Penitenciario la Joya, por B/.2,500.0 miles y con un 30.0% de ejecución física.
- Construcción de la Unidad Judicial de Santiago, B/.1,160.1 miles y un 80.0% de avance físico.

M. SECTOR MINERÍA



Visita a Proyecto Minera Panamá

Gira Técnica a proyecto minero

Extracción de minerales

La posición geográfica de Panamá y su conformación geológica, han permitido hallar en el subsuelo yacimientos de minerales, de cierta relevancia, como el oro y el cobre principalmente, cuya extracción forma parte de una política de Estado en respaldo a la actividad minera, que busca el desarrollo integral de los pueblos que circundan los proyectos mineros.

La explotación minera en Panamá, en su mayoría es desarrollada por capital extranjero. El principal impacto generado por la actividad minera, es el aumento de ingresos de las familias asentadas en las localidades donde se desarrolla esta actividad.

Cuadro N° 35
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Minería- Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	32.5	168.1	200.6	107.4	53.5	100.0
Ministerio de Comercio e Industrias	32.5	168.1	200.6	107.4	53.5	100.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El MICI, es la institución que dentro del sector minería lleva a cabo el proyecto: Delimitación del Mapa Geológico de la República de Panamá, con un presupuesto modificado de B/. 200.6 miles, que a diciembre del 2013 presentó un nivel de ejecución presupuestaria de 53.5%. Ver Cuadro N° 35.

Uno de los objetivos del proyecto, es contar con una Biblioteca donde se recopile toda la información geológica, producto de las investigaciones y la información generada por las empresas concesionarias al presentar las solicitudes de concesiones mineras a nivel Nacional. De igual forma, se requiere contar con la actualización y digitalización de la cartografía geológica, de modo que sea utilizada como material de consulta por el público en general y por inversionistas interesados.

A diciembre del 2013, el proyecto contó con un 90.0% de avance físico, relacionado a actividades que han permitido la actualización del Mapa Geológico de la República de Panamá. Se espera que las personas tengan acceso a una base de datos que les permita realizar consultas de manera rápida y confiable.

N. SECTOR PROTECCIÓN CIUDADANA



Construcción del Nuevo Centro de Docencia de la Policía de Colón

La protección ciudadana debemos entenderla como el conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales e institucionales que garantizan el adecuado y normal funcionamiento de la comunidad y la convivencia ciudadana, con el objeto de garantizar una vida digna a todos los ciudadanos. En tal sentido, el sector está enfocado a contribuir a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana, aumentar la capacidad de gestión de instituciones nacionales y locales en planificar y actuar con eficiencia en la prevención y reducción de la inseguridad ciudadana.

Cuadro N° 36

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Protección Ciudadana - Según Instituciones

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	128,026.6	85,736.4	213,763.0	177,943.8	83.2	100.0
Defensoría del Pueblo	282.5	0.0	282.5	208.1	73.7	0.1
Ministerio de Gobierno	3,500.0	0.0	3,500.0	2,845.4	81.3	1.6
Ministerio de la Presidencia	760.3	15,886.5	16,646.7	16,256.1	97.7	7.8
Ministerio de Seguridad Pública	123,483.8	67,213.9	190,697.7	158,634.1	83.2	89.2
Ministerio de Vivienda	0.0	2,636.0	2,636.0	0.0	0.0	1.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

El presupuesto ley para la vigencia 2013, orientado a promover y fortalecer la protección ciudadana recibió un ajuste total de B/.85,736.4 miles. Tal ajuste dio como resultado un monto modificado de B/. 213,763.0 miles.


Las instituciones que componen este sector son cinco (5), como se describe en el Cuadro N° 36, siendo el Ministerio de Seguridad Pública (MINSEG), el de mayor presupuesto modificado, con un monto de B/.190,697.7 miles y una participación de 89.2% del sector, seguido del Ministerio de la Presidencia con B/.16,646.7 miles y 7.8% de participación, y el Ministerio de Gobierno con B/.3,500.0 miles, un 1.6%. El menor presupuesto en este sector recae en la Defensoría del Pueblo, con B/.282.5 miles. Esta entidad no recibió ningún ajuste en el 2013, al igual que el Ministerio de Gobierno.

La ejecución presupuestaria del Sector para la vigencia del 2013, fue de un 83.2%, con una ejecución del Ministerio de la Presidencia del 97.7%, del Ministerio de Seguridad Pública de 83.2% y del Ministerio de Gobierno de 81.3%.

En el Sector, el MINSEG, es el que más contribuyó con sus proyectos, en este sentido podemos citar los siguientes:

- Adquisición de Helicópteros y Radares: consiste en la compra de dieciocho Radares Modernos y 6 Helicópteros nuevos, además se incluye la capacitación técnica al personal que operará los equipos, tanto radares como aeronaves. También se incluye un paquete de suministro de repuestos y mantenimiento requerido para el buen desempeño de las operaciones. Para la vigencia 2013, cuenta con un monto modificado de B/.92,000.0 miles y alcanzó una ejecución presupuestaria de 89.7.0% y un avance físico de 59.0%.
- Construcción del Nuevo Centro de Docencia de la Policía de Colón, al cual se le asignó recursos, por B/.3,900.0 miles. Con una ejecución física de 80.0%.
- Al Sistema Trocal de Comunicaciones de la Policía se le asignó recursos por B/.16,870.2 miles para:
Equipo de comunicación: B/.14,804.2 miles, donde se realizaron entre otras actividades el Mejoramiento del Sistema de Radios para Estamentos de Seguridad por B/.10.0 miles, y Actualización de Redes de Telecomunicaciones por B/.2,930.4 miles.
Para equipo de computación: Se destinaron B/.2,064.9 miles, sobresaliendo el contrato para un Sistema Unificado de Vigilancia Ciudadana por B/.1,782.9 miles.
- Tecnología para el Servicio Nacional de Fronteras: Presentó un presupuesto de B/.1,169.8 miles, de ello se logró una ejecución física de 87.5 %.
- Construcción y Mejoras a nivel nacional del SENAFRONT, se asignaron recursos por B/.1,901.3 miles logrando una ejecución física de 57.0%, sobre todo en apoyo al Diseño, Demolición y Construcción del Puesto en Jaqué por B/.1,095.3 miles, con un avance físico de 69.0%, así como la construcción del Bunker y calle de acceso en Metetí, Darién por B/.578.9 miles, con un avance físico de 88.0%.
- Proyecto de Sistema Informático Voz y Data del SENAN, el cual consiste en adquisición e instalación de 247 cámaras de video vigilancia, en las instalaciones del Servicio Nacional Aeronaval a nivel nacional, para salvaguardar los bienes de la Institución y la vida de los miembros del SENAN. Se le asignó recursos por B/.1,153.8 miles y se logró una ejecución física de 67.0 %.
- Mejoramiento de la Capacidad de respuesta Operacional Marítima y Aérea del SENAN, este proyecto busca fortalecer la capacidad operacional del servicio nacional aeronaval, garantizando la seguridad ciudadana, operaciones humanitarias (evacuaciones médicas, búsqueda y salvamento) a la sociedad civil, nacional o extranjera, que opere en nuestra jurisdicción, a su vez busca garantizar la seguridad a su vida, honra como a sus bienes, persiguiendo y capturando a través de la interdicción marítima, todo acto ilícito que ocurra en el espacio jurisdiccional marítimo y aéreo respectivamente. Para la vigencia 2013, recibió recursos por B/.9,526.8 miles obtuvo una ejecución física de 53.0%.

1.2 COCLÉ

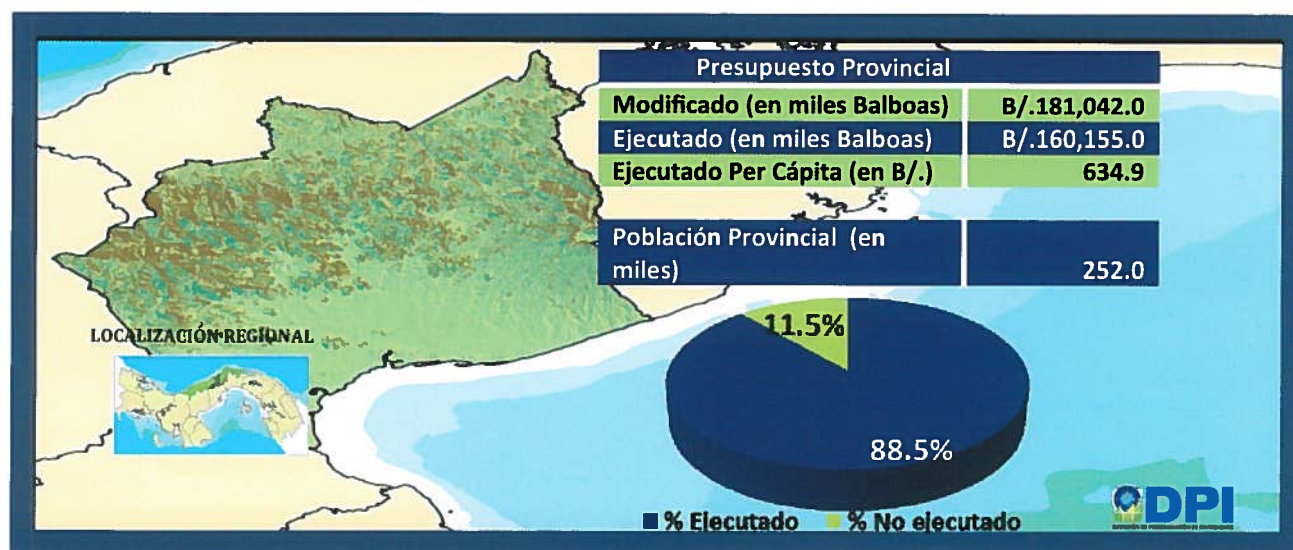

La provincia de Coclé durante el segundo semestre del 2013, registró un presupuesto modificado de B/.181,042.2 miles, logrando una ejecución presupuestaria de 88.5%. Los sectores que reflejaron una mayor participación fueron: Transporte 53.4%, Trabajo y Bienestar Social 22.4% y Salud 13.8%.

Cuadro N° 40
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Coclé
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	119,158.9	61,883.3	181,042.2	160,155.1	88.5	100.0
Agropecuario	433.0	1,009.8	1,442.8	1,453.7	100.8	0.8
Ambiente	125.4	-31.1	94.3	86.5	91.7	0.1
Educación y Cultura	14,565.6	463.4	15,029.0	12,155.7	80.9	8.3
Finanzas	300.0	-296.0	4.0	0.0	0.0	0.0
Industria, Comercio y Turismo	200.0	622.7	822.7	320.8	39.0	0.5
Justicia	3,536.0	-2,155.5	1,380.5	1,353.5	98.0	0.8
Salud	12,375.8	12,651.2	25,027.0	20,910.2	83.6	13.8
Trabajo y Bienestar Social	26,662.3	13,820.1	40,482.3	38,740.0	95.7	22.4
Transporte	60,960.9	35,798.6	96,759.5	85,134.7	88.0	53.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Algunos de los proyectos en la provincia son:

- Sector Transporte: El proyecto de Construcción del Túnel y Ampliación de la Pista de Aterrizaje de Río Hato, Rehabilitación y Mantenimiento de la CPA Tramo: Panamá-Aguadulce, Rehabilitación y Mantenimiento de la CPA Tramo Penonomé-Aguadulce.
- Sector Salud: Construcción de Planta Potabilizadora de Aguadulce, Construcción de la Policlínica de Penonomé.

1.1 BOCAS DEL TORO



La Provincia de Bocas del Toro, presentó un presupuesto modificado de B/.81,941.3 miles para la vigencia 2013 y una ejecución de 90.7%. Los sectores que mostraron altos niveles de participación del presupuesto modificado fueron: Transporte con B/.26,919.1 miles, Salud con B/.14,995.1 miles y Educación y Cultura con B/.14,216.4 miles.

Cuadro N° 39
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Bocas Del Toro
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	42,537.9	39,403.4	81,941.3	74,302.5	90.7	100.0
Agropecuario	62.9	4.5	67.3	37.6	55.8	0.1
Ambiente	720.0	-2.8	717.2	715.2	99.7	0.9
Educación y Cultura	10,286.8	3,929.6	14,216.4	12,965.2	91.2	17.3
Energía	0.0	10,923.5	10,923.5	8,430.0	77.2	13.3
Finanzas	100.0	79.2	179.2	0.0	0.0	0.2
Justicia	25.0	-2.0	23.0	23.0	0.0	0.0
Salud	7,599.0	7,396.2	14,995.1	11,771.9	78.5	18.3
Trabajo y Bienestar Social	10,664.8	3,235.8	13,900.6	13,770.8	99.1	17.0
Transporte	13,079.6	13,839.5	26,919.1	26,588.8	98.8	32.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Entre los proyectos más relevantes de estos sectores se encuentran:


- Sector Transporte: Rehabilitación del Camino La Mesa - Las Tablas, Rehabilitación de calles de Chiriquí Grande, Rehabilitación del Camino Finca 6 – Puente Changuinola y Mantenimiento del Camino Almirante-Changuinola.
- Sector Salud: Construcción MINSa-CAPSI El Empalme, Construcción del Hospital de Changuinola.

financiera son: el Sector Educación y Cultura con el programa de Becas Universales y el Sector de Trabajo y Bienestar Social con el Programa “100 a los 70”.

1. PROVINCIAS

En la Gráfica N° 10, se detalla la inversión Per cápita por provincia la mayor inversión al 31 de diciembre de 2013 se realizó en la provincia de Panamá con B/.1,847.4 por persona al año, dada la magnitud de los proyectos.

Gráfica N° 10
Inversión Per Cápita por Provincia
Al 31 de diciembre de 2013
(En Balboas)

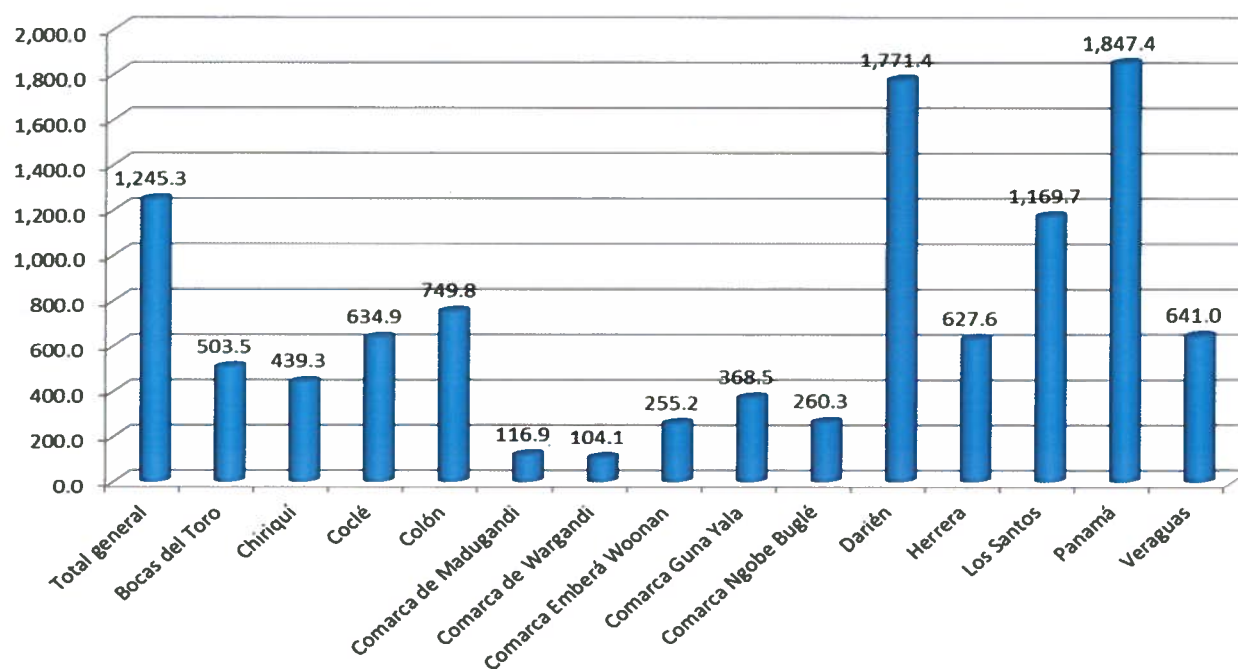

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Seguidamente se muestra la distribución del presupuesto de las Inversiones Públicas No Financieras, al 31 de diciembre de 2013 y los programas más relevantes por provincias y comarcas. En los mapas se representa la posición regional, el presupuesto y la población.

CAPÍTULO V

IV. EL PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS POR ÁREA GEOGRÁFICA

A. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y FÍSICA A NIVEL DE SECTOR DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS PROVINCIALES Y COMARCALES

Para la vigencia 2013, se ejecutó el 86.5% del presupuesto modificado de las inversiones públicas no financieras, distribuido según su ubicación geográfica en nueve (9) Provincias y cinco (5) Comarcas del país, el mismo ascendió a la suma de B/.5,544,144.7 miles.

De acuerdo a la ubicación geográfica la mayor inversión recayó en la provincia de Panamá, por ser la provincia con mayor población y donde se realizan magnos proyectos de infraestructura, así como los programas sociales. Esta provincia, contó con un presupuesto modificado de B/.4,213,187.4 miles, seguidamente por las provincias de Colón con B/.263,666.0 miles y Chiriquí con B/.232,067.8 miles. Ver Cuadro N°38.

Cuadro N° 38
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Ubicación Geográfica
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Provincias y Comarcas	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado
Total	4,135,339.1	1,408,805.6	5,544,144.7	4,795,277.4	86.5	100.0
Bocas del Toro	42,537.9	39,403.4	81,941.3	74,302.5	90.7	1.5
Chiriquí	207,975.1	24,092.7	232,067.8	195,539.3	84.3	4.2
Coclé	119,158.9	61,883.3	181,042.2	160,155.1	88.5	3.3
Colón	127,699.2	135,966.8	263,666.0	200,948.2	76.2	4.8
Comarca de Madugandi	335.7	400.0	735.7	569.9	77.5	0.0
Comarca de Wargandi	354.9	0.0	354.9	271.4	76.5	0.0
Comarca Emberá Wounaan	3,194.7	195.8	3,390.4	2,897.4	85.5	0.1
Comarca Guna Yala	21,268.1	-5,076.8	16,191.3	15,009.5	92.7	0.3
Comarca Ngobe Buglé	47,383.5	3,999.7	51,383.2	48,890.8	95.1	0.9
Darién	78,679.4	19,945.8	98,625.1	89,312.8	90.6	1.8
Herrera	63,051.9	23,175.1	86,227.0	73,761.8	85.5	1.6
Los Santos	90,087.3	54,010.1	144,097.4	110,867.2	76.9	2.6
Panamá	3,210,989.9	1,002,197.6	4,213,187.4	3,667,295.5	87.0	76.0
Veraguas	122,622.6	48,612.2	171,234.9	155,456.0	90.8	3.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

A nivel de ubicación geográfica provincial el Sector con mayor participación es el Sector Transporte, el cual comprende proyectos Marítimos, Aeronáuticos, de Tránsito y Carreteras, desarrollados a lo largo de la geografía nacional. A su vez, otros sectores de suma importancia en cuanto a la inversión pública no

- Protegidas en un marco de innovación, integración empresarial y de desarrollo social sostenible en el ámbito local se aprueba el Plan de Trabajo del Proyecto de Conservación de la Biodiversidad a través del Ecoturismo de bajo Impacto en el SINAP, para dar inicio con las actividades en el mes de octubre.

Cuadro N° 37
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Ambiente - Según Instituciones
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Institución	PRESUPUESTO				% de Ejec.	% de Part.
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado	Ejec. / Mod.	Modificado
Total	17,875.2	2,138.8	20,014.0	14,556.9	72.7	100.0
Autoridad Nacional del Ambiente	17,875.2	1,888.8	19,764.0	14,306.9	72.4	98.8
Ministerio de la Presidencia	0.0	250.0	250.0	250.0	100.0	1.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

A la Autoridad Nacional del Ambiente, se le asignó un presupuesto Ley de B/.17,875.2 miles, dirigidos a las inversiones encaminadas a fortalecer las actividades vinculadas al Sector Ambiente. El presupuesto de la ANAM sufrió un ajuste de B/.1,888.8 miles, quedando así un total modificado de B/.19,764.0 miles, del cual se ejecutó B/.14,306.9 miles, lo cual representa un nivel de ejecución de 72.4%. Ver Cuadro N°37.

Para mayor detalle de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones No Financieras, según Sector e Instituciones que lo componen, ver Anexo N°4.

O. SECTOR AMBIENTE



Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), es la entidad autónoma del Estado, encargada de atender los recursos naturales del ambiente y de asegurar el cumplimiento y aplicación de las leyes, los reglamentos y la política nacional del ambiente.

La ANAM, tiene como misión la conservación, protección, restauración, recuperación y el mejoramiento del ambiente con el fin de garantizar el desarrollo sostenible de Panamá.

La Autoridad Nacional de Ambiente (ANAM), ejecuta los siguientes programas:

- Investigación y Manejo de Recursos Naturales, cuenta con 14 proyectos.
- Conservación y Desarrollo Sostenible, cuenta con 9 proyectos.

El Programa de Investigación y Manejo de Recursos Naturales, se desarrolla con la colaboración de los gobiernos de Estados Unidos y Japón, denominada ANAM/JICA, liderados por voluntarios ambientales que capacitan a los grupos comunitarios. Estos voluntarios han desarrollado 2 talleres sobre Elaboración de Artesanías en especial jarrones, a partir de residuos sólidos y Elaboración de Artesanías como peinetas, adornos con corteza de madera, monederos y otros con el objetivo de desarrollar los negocios ambientales en las diferentes comunidades.


El programa de Conservación y Desarrollo Sostenible, cuenta con un total de 52 cuencas, de las cuales 35 están incluidas en el programa. Para el mes de octubre, se monitorearon 6 cuencas, representando un 17.1%.

Algunas de las actividades que ha desarrollado la Autoridad Nacional de Ambiente son:

- Se desarrolló un estudio de sobrevivencia en trasplante de árboles jóvenes, en el Copé de La Pintada, con el objetivo de aplicar técnicas para evitar el stress de estos árboles y garantizar su sobrevivencia en un alto porcentaje.
- Se realizaron 2 jornadas de capacitación a 44 personas (27 mujeres y 17 hombres), dirigidos al grupo organizado de El Higo de Cochea y estudiantes y docentes del Centro Educativo de Los Cerrillos, corregimiento de Bijagual, en el tema de conservación ambiental, con la finalidad fortalecer a los grupos comunitarios y estudiantes sobre la valoración de los recursos naturales.

Con el objetivo de establecer un modelo de ecoturismo de bajo nivel de impacto ambiental en el SINAP, que contribuya a la conservación de la diversidad biológica y a la sostenibilidad de las Áreas

1.3 COLÓN

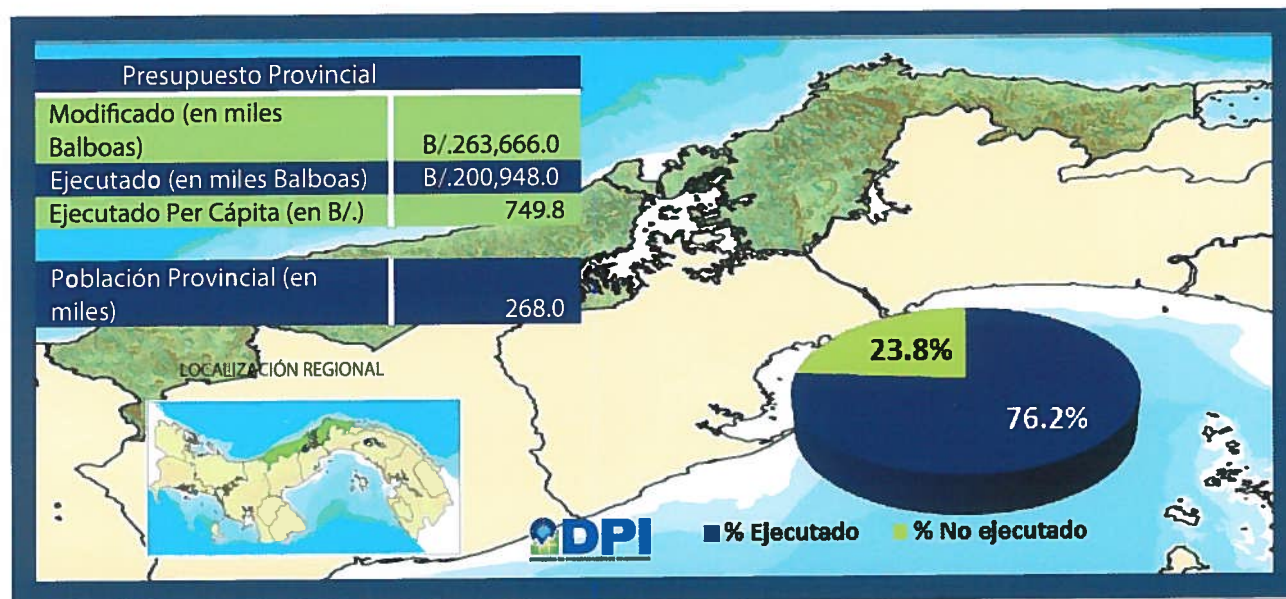

A diciembre del 2013, la provincia de Colón contó con un presupuesto modificado de B/.263,666.0 miles, logrando una ejecución presupuestaria de 76.2%. Dentro de los sectores que mostraron mayores niveles de participación se encuentran: Transporte con B/.146,985.7 miles, Educación y Cultura B/.28,939.6 miles, y Salud con B/.27,630.8 miles.

Cuadro N° 41
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Colón
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)


Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	127,699.2	135,966.8	263,666.0	200,948.2	76.2	100.0
Administración y Servicios Generales	560.0	-1.7	558.3	439.3	78.7	0.2
Educación y Cultura	21,702.3	7,237.3	28,939.6	25,950.8	89.7	11.0
Industria, Comercio y Turismo	4,715.7	3,291.3	8,007.1	3,819.4	47.7	3.0
Justicia	2,000.0	305.2	2,305.2	299.4	13.0	0.9
Salud	23,573.0	4,057.8	27,630.8	17,567.1	0.0	10.5
Trabajo y Bienestar Social	18,196.4	4,275.4	22,471.8	22,128.7	98.5	8.5
Transporte	46,502.0	100,483.7	146,985.7	104,139.7	70.9	55.7
Vivienda	10,449.9	16,317.6	26,767.5	26,603.7	99.4	10.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Entre algunos de sus proyectos se pueden mencionar:

- Sector Transporte: Construcción de dos puentes vehiculares en calle 17 Corredor; Construcción de la Autopista Madden-Colón; Construcción, Estudio y Diseño del Aeropuerto Enrique A. Jiménez; Construcción Puente Vehicular corredor France Field.
- Sector Educación y Cultura: Construcción de la Escuela de Excelencia Abel Bravo.
- Sector Salud: Construcción del MINSA-CAPSI Nueva Italia, MINSA-CAPSI Cuipo; y la Construcción de la Policlínica Periférica de Nuevo San Juan.

1.4 CHIRIQUÍ

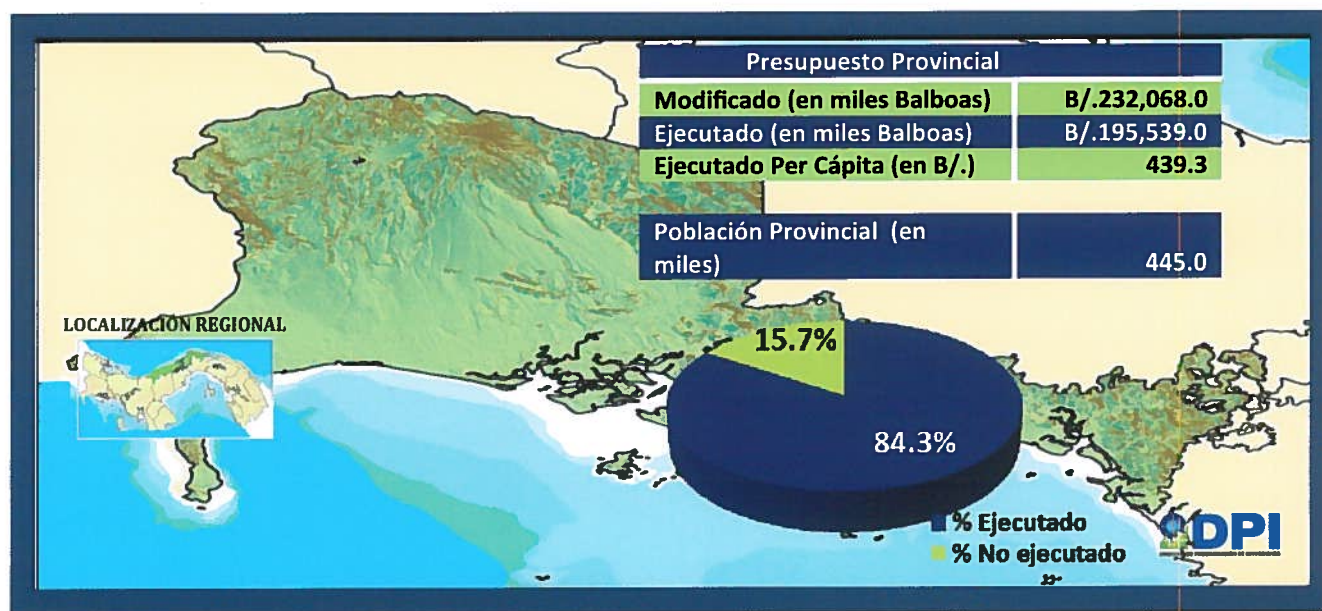

La provincia de Chiriquí al segundo semestre del 2013, contó con un presupuesto modificado de B/.232,067.8 miles, logrando una ejecución presupuestaria de 84.3%. Los sectores que mostraron altos niveles de participación en el presupuesto fueron: Salud, Educación y Cultura, Transporte y Trabajo y Bienestar Social, sumando entre ellos B/.210,781.3 miles, lo que representa el 90.8%, del presupuesto total para la provincia.

Cuadro N° 42
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Chiriquí
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)


Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	207,975.1	24,092.7	232,067.8	195,539.3	84.3	100.0
Administración y Servicios Generales	1,206.4	613.0	1,819.4	1,819.4	100.0	0.8
Agropecuario	1,547.0	5,291.1	6,838.1	1,776.2	26.0	2.9
Ambiente	144.0	-20.7	123.3	121.7	98.7	0.1
Educación y Cultura	31,842.4	-96.3	31,746.0	29,479.0	92.9	13.7
Finanzas	190.0	-167.9	22.1	21.7	98.2	0.0
Justicia	7,775.0	207.3	7,982.3	4,501.9	56.4	3.4
Protección Ciudadana	125.0	-79.7	45.3	45.3	0.0	0.0
Salud	68,418.5	23,210.3	91,628.8	69,090.6	75.4	39.5
Trabajo y Bienestar Social	39,001.4	14,042.9	53,044.3	51,865.7	97.8	22.9
Transporte	55,404.1	-21,042.0	34,362.1	32,361.7	94.2	14.8
Vivienda	2,321.4	2,134.6	4,456.0	4,456.0	100.0	1.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Algunos de los proyectos destacados en la provincia de Chiriquí son:

- Sector Salud: Construcción Policlínica de Boquete, Construcción del Nuevo Hospital de Bugaba, Construcción MINSA-CAPSI en Dolega, Río Sereno, Volcán. Mejoramiento Policlínica de Divalá.
- Sector Transporte: Ampliación de la Carretera Paso Canoas-Puerto Armuelles, Ampliación de la Carretera David-Boquete y la Rehabilitación del Camino Boquete-Palmira Abajo-Potrerrillo Arriba.

1.5 DARIÉN

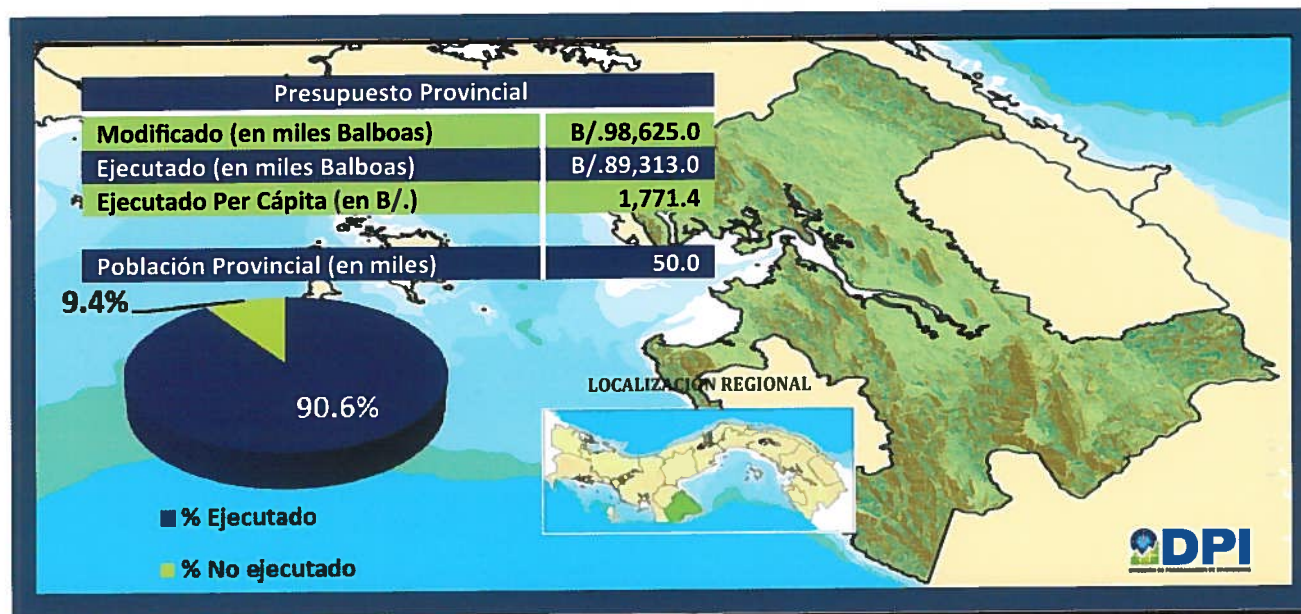

Durante el segundo semestre del 2013, la Provincia de Darién, registró un presupuesto modificado de B/.98,625.1 miles. Dentro de la provincia, el Sector más representativo es el Sector Transporte con un presupuesto modificado de B/.48,236.0 miles, seguido del Sector Salud con B/.36,558.4 miles, ambos representando el 86.0% del presupuesto total.

Cuadro N° 43
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Darién
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	78,679.4	19,945.8	98,625.1	89,312.8	90.6	100.0
Agropecuario	325.0	-34.7	290.3	250.6	86.3	0.3
Ambiente	25.0	-4.2	20.8	20.0	95.9	0.0
Educación y Cultura	4,490.4	999.9	5,490.2	5,328.7	97.1	5.6
Finanzas	280.0	-60.1	219.9	219.9	100.0	0.2
Justicia	0.0	45.0	45.0	0.0	0.0	0.0
Protección ciudadana	125.0	-125.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Salud	40,612.1	-4,053.6	36,558.4	31,595.1	86.4	37.1
Telecomunicaciones	35.0	132.2	167.2	98.0	58.6	0.2
Trabajo y Bienestar Social	12,859.1	-5,261.9	7,597.2	7,407.8	97.5	7.7
Transporte	19,927.9	28,308.1	48,236.0	44,392.7	92.0	48.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Entre los proyectos que se ejecutan dentro de la provincia se pueden mencionar:

- Sector Salud: Construcción del Hospital de Darién, Construcción del MINSA-CAPSI en Santa Fé y la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Metetí.
- Sector Transporte: Rehabilitación del camino CPA-Palmira, Mundito-Guayabalillo, Rehabilitación del camino CPA-Simba, y la Construcción del puente sobre el Río Sabana.

1.6 HERRERA



La provincia de Herrera, a diciembre del 2013, contó con un presupuesto modificado de B/.86,227.0 miles. Dentro de la provincia los sectores con mayor grado de inversión son: Transporte, Trabajo y Bienestar Social, Educación y Salud, sumando un presupuesto modificado de B/.85,086.0 miles, representando el 98.7% del total del presupuesto asignado en esta provincia.

Cuadro N° 44
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Herrera
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	63,051.9	23,175.1	86,227.0	73,761.8	85.5	100.0
Administración y Servicios Generales	0.0	25.5	25.5	25.5	100.0	0.0
Agropecuario	325.0	-50.0	275.0	206.4	75.0	0.3
Ambiente	0.0	250.0	250.0	250.0	100.0	0.3
Educación y Cultura	8,113.2	545.9	8,659.1	7,579.5	87.5	10.0
Energía	0.0	175.0	175.0	124.0	70.9	0.2
Finanzas	50.0	-50.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Industria, Comercio y Turismo	137.0	33.7	170.7	130.0	76.2	0.2
Justicia	700.0	-455.3	244.7	234.9	96.0	0.3
Salud	10,611.0	5,257.5	15,868.5	6,814.8	42.9	18.4
Trabajo y Bienestar Social	17,280.1	6,302.4	23,582.5	23,440.3	99.4	27.3
Transporte	25,835.6	11,140.3	36,975.9	34,956.4	94.5	42.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Los principales proyectos son:

- Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera Divisa-Chitré, Rehabilitación del Camino Pesé-Cabras y Cascajillo-Arenita-Cabra, Rehabilitación Carretera de Los Pozos-Las Minas.
- Construcción del Nuevo Centro de Salud de Chitré, Construcción del MINSA CAPSI Pesé-Herrera, Construcción del Hospital El Vigía de Chitré.

1.7 LOS SANTOS



A diciembre 2013, la Provincia de Los Santos presentó una ejecución presupuestaria 76.9% de su presupuesto modificado que ascendió a B/.144,097.4 miles. En la provincia, los sectores más representativos dentro del presupuesto modificado fueron: Transporte, Salud y Agropecuario, con una participación de 78.9%.

Cuadro N° 45
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Los Santos
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)


Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	90,087.3	54,010.1	144,097.4	110,867.2	76.9	100.0
Administración y Servicios Generales	60.0	0.0	60.0	60.0	100.0	0.0
Agropecuario	9,300.1	23,055.9	32,355.9	18,031.0	55.7	22.5
Ambiente	25.0	-6.2	18.8	17.2	91.9	0.0
Educación y Cultura	6,974.3	-21.3	6,953.0	6,104.4	87.8	4.8
Energía	0.0	250.0	250.0	250.0	0.0	0.2
Finanzas	35.0	184.5	219.5	88.0	40.1	0.2
Industria, Comercio y Turismo	126.0	-22.7	103.3	16.3	15.8	0.1
Justicia	275.0	-15.5	259.5	218.4	84.2	0.2
Salud	24,552.0	13,011.5	37,563.5	22,990.1	0.0	26.1
Telecomunicaciones	45.0	-26.2	18.8	16.3	0.0	0.0
Trabajo y Bienestar Social	20,694.2	1,796.0	22,490.2	21,624.6	0.0	15.6
Transporte	28,000.8	15,804.1	43,804.9	41,450.8	94.6	30.4

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Entre sus proyectos más destacados se encuentran:

- Sector Salud: Construcción de los MINSA-CAPSI de Macaracas, Pedasí y La Villa de Los Santos. Construcción del Hospital Anita Moreno.
- Sector Transporte: Rehabilitación y Mantenimiento de la Carretera La Villa-Las Tablas, Rehabilitación de la Carretera Cruce Sámana Grande-Macaracas.
- Sector Agropecuario: Construcción del Sistema de Riego de Tonosí y la Rehabilitación de Silo en La Honda de Las Tablas.

1.8 PANAMÁ

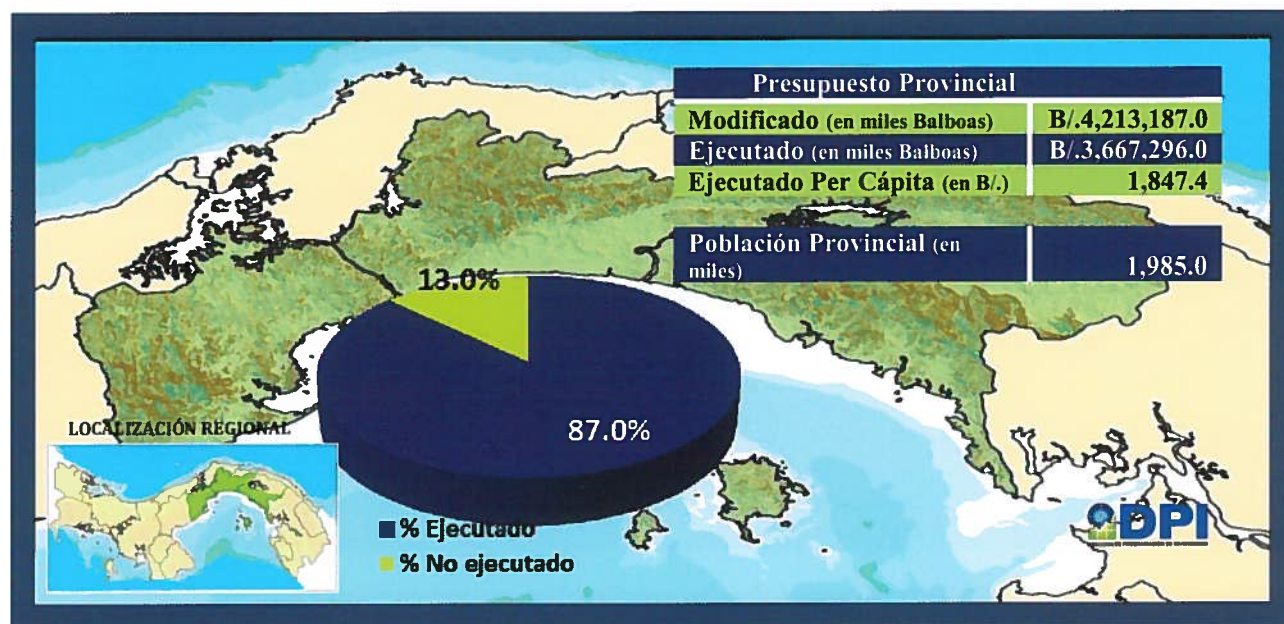

La Provincia de Panamá durante el segundo semestre del 2013, contó con un presupuesto modificado de B/.4,213,187.4 miles representando el 75.9% del presupuesto destinado a las inversiones públicas no financieras. Los sectores que representaron el 57.3% del presupuesto en la provincia fueron: Transporte con B/.1,413,491.8 miles, Salud con B/.597,413.4 miles, y Educación y Cultura con B/.404,952.9 miles.

Cuadro N° 46
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Panamá
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)


Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	3,210,989.9	1,002,197.6	4,213,187.4	3,667,295.5	87.0	100.0
Administración y Servicios Generales	223,564.3	169,472.0	393,036.3	298,905.7	76.1	9.3
Agropecuaria	43,318.2	20,325.3	63,643.5	54,625.1	85.8	1.5
Ambiente	16,262.9	1,965.9	18,228.8	13,096.1	71.8	0.4
Educación y Cultura	311,810.7	93,142.2	404,952.9	358,896.1	88.6	9.6
Energía	9,302.8	4,064.9	13,367.6	10,039.2	75.1	0.3
Finanzas	69,563.3	1,398.3	70,961.6	34,990.2	49.3	1.7
Industria, Comercio y Turismo	247,674.5	70,779.3	318,453.8	290,316.6	91.2	7.6
Justicia	50,742.3	39,292.9	90,035.1	66,360.5	73.7	2.1
Minería	32.5	168.1	200.6	107.4	53.5	0.0
Protección ciudadana	127,776.6	85,941.1	213,717.7	177,898.5	83.2	5.1
Salud	461,496.3	135,917.2	597,413.4	441,944.7	74.0	14.2
Telecomunicaciones	525.0	1,944.4	2,469.4	2,425.1	98.2	0.1
Trabajo y Bienestar Social	91,559.2	425,845.6	517,404.8	504,677.8	97.5	12.3
Transporte	1,518,500.6	-105,008.8	1,413,491.8	1,323,276.2	93.6	33.5
Vivienda	38,861.0	56,949.2	95,810.2	89,736.4	93.7	2.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Dentro de los proyectos más relevantes en la provincia se destacan:

- Sector Transporte: Construcción de la Línea 1 del Metro, Rehabilitación y Mantenimiento de la Autopista Arraiján-La Chorrera, Construcción del Corredor Vía Brasil-Vía España-Calle 50-Vía Israel, y la Construcción de la Interconexión Ave. Balboa-Puente de las Américas (Cinta Costera III), entre otros.
- Sector Salud: Saneamiento de la Bahía de Panamá, Construcción del MINSA-CAPSI de Tortí, Construcción del MINSA-CAPSI de Puerto Caimito, Construcción del MINSA-CAPSI de El Coco.
- Sector Educación y Cultura: Construcción de la Escuela de Excelencia Las Garzas de Pacora.

1.9 VERAGUAS

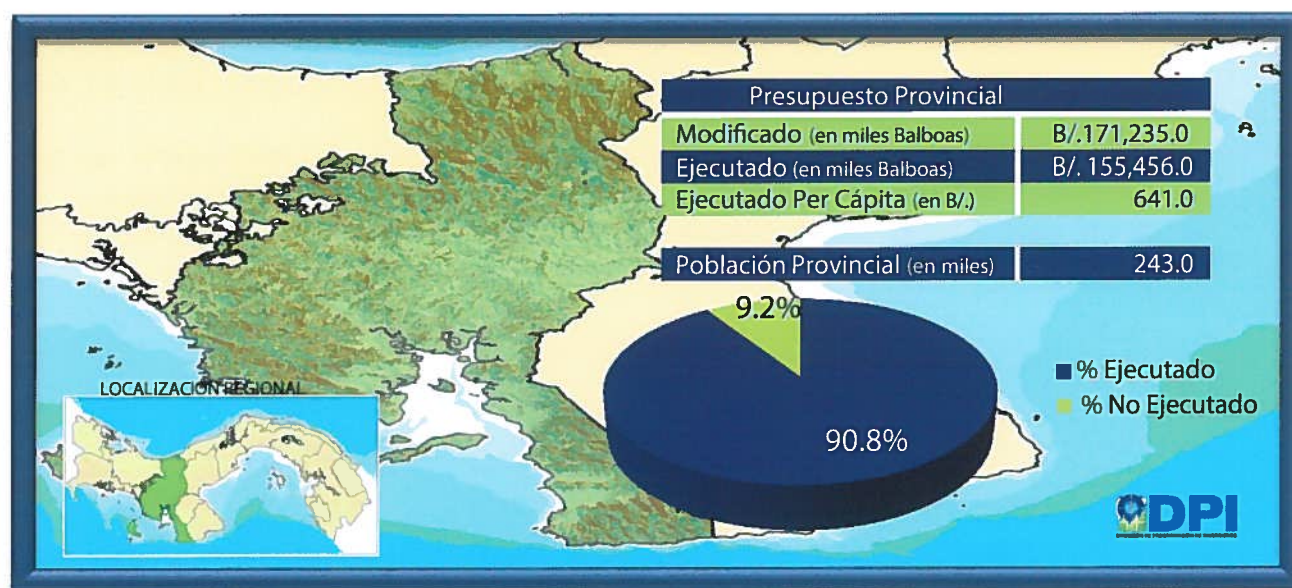

En la Comarca Ngöbe Buglé habita más del 60% de la población que vive en área comarcal. A diciembre del 2013, la comarca contó con un presupuesto modificado de B/.51,383.2 miles, representando el 71.3% del presupuesto destinado a las comarcas. De este total, se logró ejecutar el 95.1% del presupuesto, siendo el Sector Trabajo y Bienestar Social, de mayor participación con un 48.6% del presupuesto modificado en la comarca.

Cuadro N° 47
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Provincia de Veraguas
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	122,622.6	48,612.2	171,234.9	155,456.0	90.8	100.0
Administración y Servicios	120.0	123.0	243.0	243.0	100.0	0.1
Agropecuario	310.0	-305.0	5.0	4.5	89.5	0.0
Ambiente	548.0	-12.2	535.8	225.3	42.0	0.3
Educación y Cultura	22,419.5	1,264.9	23,684.4	18,374.9	77.6	13.8
Energía	1,000.0	-1,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Finanzas	450.0	-50.0	400.0	0.0	0.0	0.2
Justicia	1,250.0	1,215.7	2,465.7	2,418.5	98.1	1.4
Salud	13,825.0	4,813.1	18,638.1	11,696.4	62.8	10.9
Telecomunicaciones	60.0	31.8	91.8	24.3	0.0	0.1
Trabajo y Bienestar Social	36,430.5	11,427.2	47,857.7	47,430.1	99.1	27.9
Transporte	46,209.6	31,103.7	77,313.3	75,038.9	97.1	45.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Algunos de los proyectos ejecutados por sector en la provincia son:


- Sector Transporte: Rehabilitación de los Caminos Soná-El Tigre de San Lorenzo y El María-Puerto Vidal-Guabalá.
- Sector Educación y Cultura: Construcción del Instituto Profesional y Técnico de Veraguas.

2. COMARCAS

Las Comarcas Emberá Wounaan, Madugandí, Wargandí, Guna Yala y Ngöbe Buglé, a diciembre del 2013, sumaron un presupuesto modificado de B/.72,055.6 miles. Siendo los sectores más significativos:

- Sector Trabajo y Bienestar Social: Desarrollo del PRODEC, Programa “100 a los 70” y Desarrollo del PROINLO.
- Sector Educación y Cultura: Programa de Becas Universales, Construcción y Reparación de Escuelas en las diferentes comarcas.
- Sector Salud: Construcción de los MINSAs-CAPSI en El Llano Cartí y en la Comarca Guna Yala.

2.1 COMARCA EMBERÁ WOUNAAN

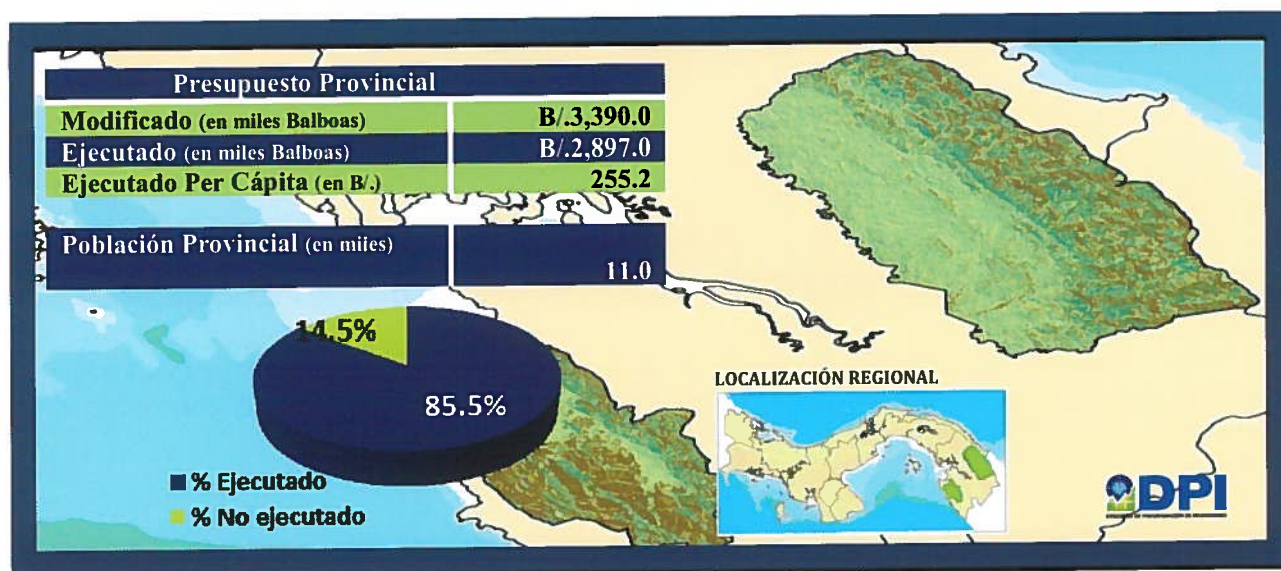


A finales del 2013, la Comarca Emberá Wounaan, contó con un presupuesto modificado de B/.3,390.4 miles de los cuales se ejecutó el 85.5%. El mayor porcentaje de participación del presupuesto (64.3%), recae en el sector Trabajo y Bienestar Social, seguidamente Educación y Cultura con un 26.2%.

Cuadro N° 48
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Emberá Wounaan
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	3,194.7	195.8	3,390.4	2,897.4	85.5	100.0
Ambiente	25.0	0.0	25.0	25.0	100.0	0.7
Educación y Cultura	875.9	14.0	889.9	615.5	69.2	26.2
Salud	68.5	32.7	101.2	98.2	97.1	3.0
Trabajo y Bienestar Social	2,225.3	-43.8	2,181.5	2,158.6	99.0	64.3
Transporte	0.0	192.9	192.9	0.0	0.0	5.7

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2.2 COMARCA MADUGANDÍ

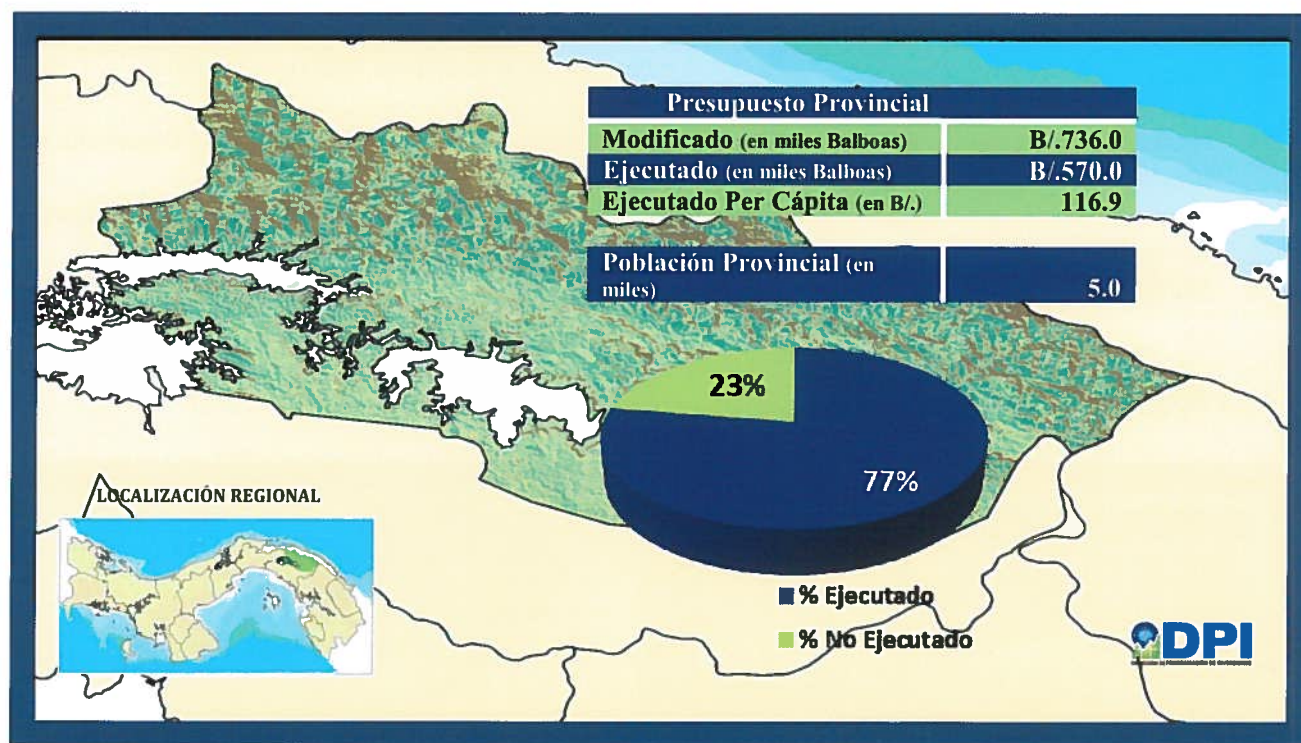


La Comarca Madugandí se le asignó un presupuesto de B/.735.7 miles, de los cuales se ejecutó el 77.5%, siendo el sector de Trabajo y Bienestar Social el de mayor peso durante la vigencia 2013, con un porcentaje de participación de 69.3%.

Cuadro N° 49
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Madugandí
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	335.7	400.0	735.7	569.9	77.5	100.0
Educación y Cultura	225.7	0.0	225.7	59.9	26.5	30.7
Trabajo y Bienestar Social	110.0	400.0	510.0	510.0	100.0	69.3

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2.3 COMARCA WARGANDÍ

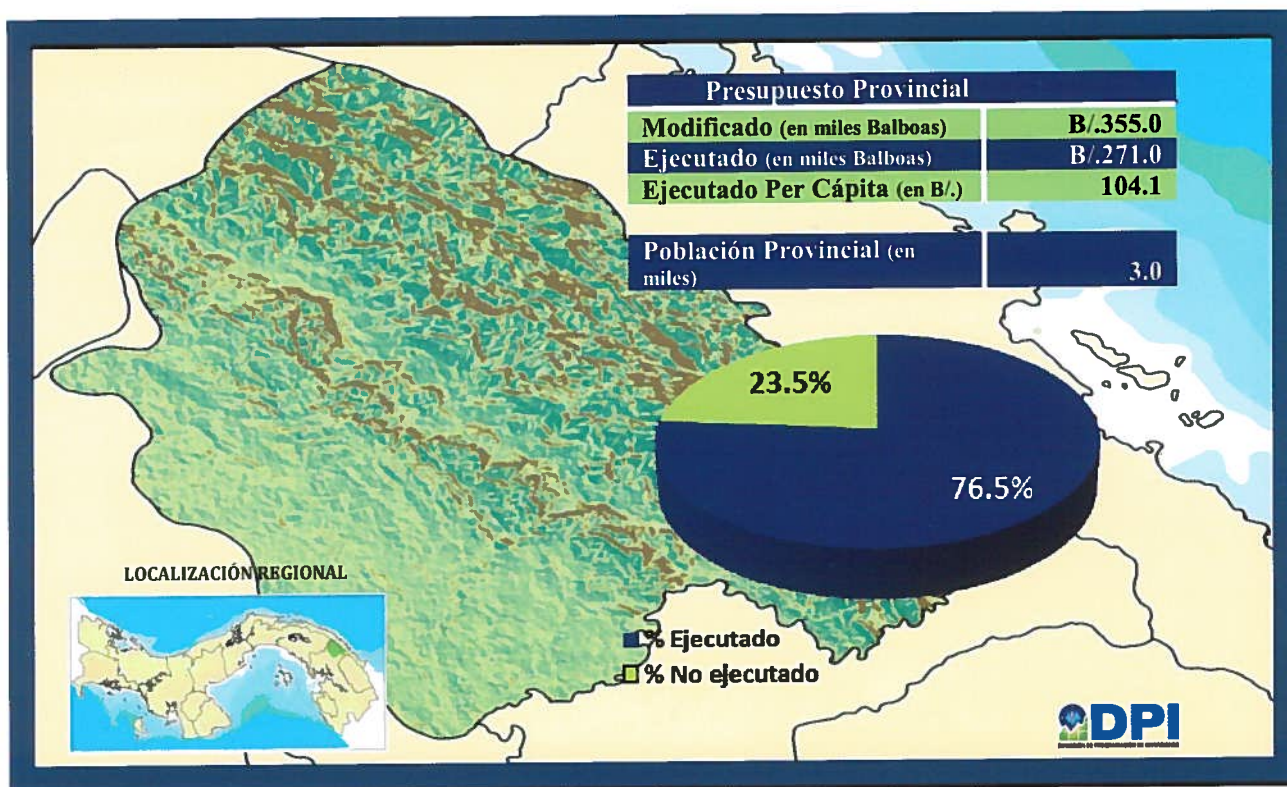

La Comarca de Wargandí recibió B/.354.9 miles en el presupuesto de inversiones no financieras y a diciembre del 2013 presentó un ejecución de 76.5%.


En la Comarca la inversión que se destinó al sector Educación y Cultura significó el 69.0% y a Trabajo y Bienestar Social 31.0% de participación en el presupuesto.

Cuadro N° 50
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Wargandi
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	354.9	0.0	354.9	271.4	76.5	100.0
Educación y Cultura	244.9	0.0	244.9	161.4	65.9	69.0
Trabajo y Bienestar Social	110.0	0.0	110.0	110.0	100.0	31.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2.4 COMARCA GUNA YALA

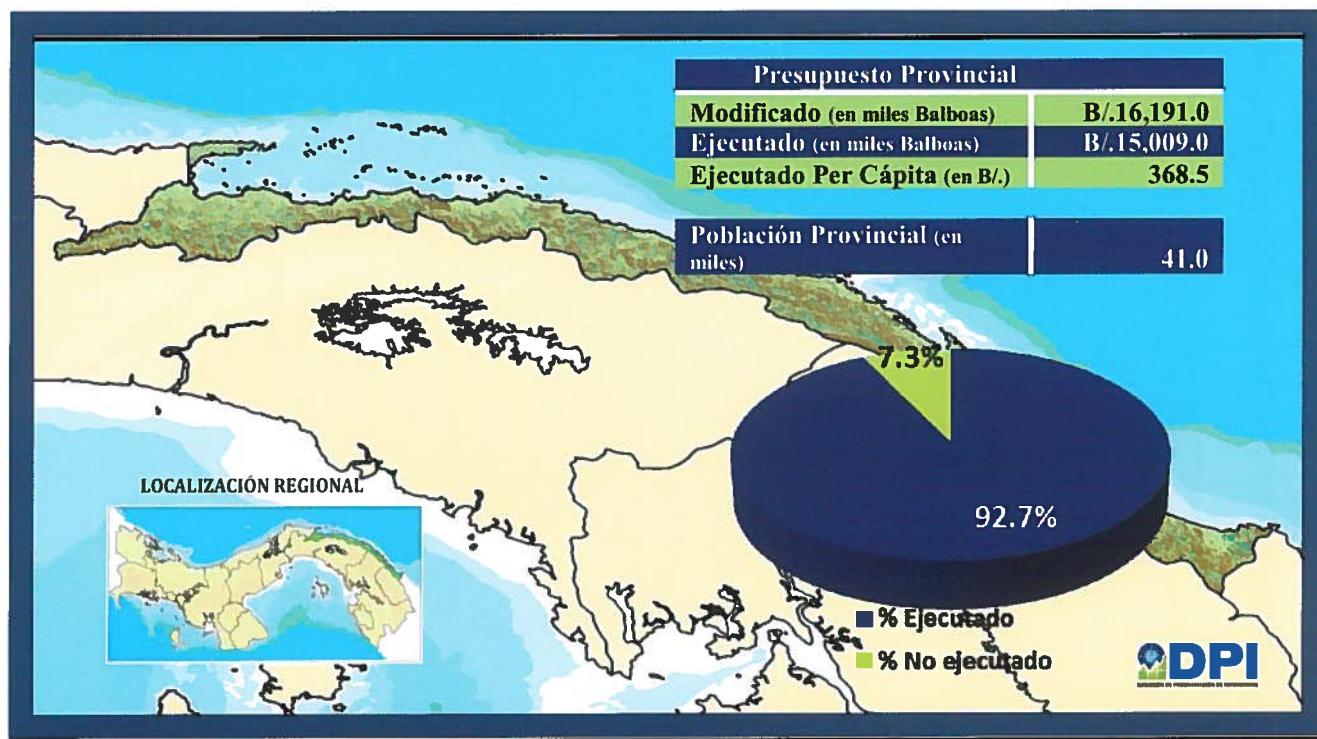


La Comarca Guna Yala la segunda en mayor población de las comarcas, presentó a diciembre del 2013, un presupuesto modificado de B/.16,191.3 miles, logrando una ejecución del presupuesto de 92.7%. El sector que tuvo una mayor participación dentro del presupuesto, fue el de Salud con 35.2%.

Cuadro N° 51
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Guna Yala
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	21,268.1	-5,076.8	16,191.3	15,009.5	92.7	100.0
Educación y Cultura	3,929.1	1,018.2	4,947.3	4,853.3	98.1	30.6
Salud	12,300.0	-6,593.7	5,706.3	4,758.6	0.0	35.2
Trabajo y Bienestar Social	4,863.1	-287.8	4,575.3	4,505.5	98.5	28.3
Transporte	176.0	786.5	962.4	892.2	92.7	5.9

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2.5. COMARCA NGABE BUGLÉ

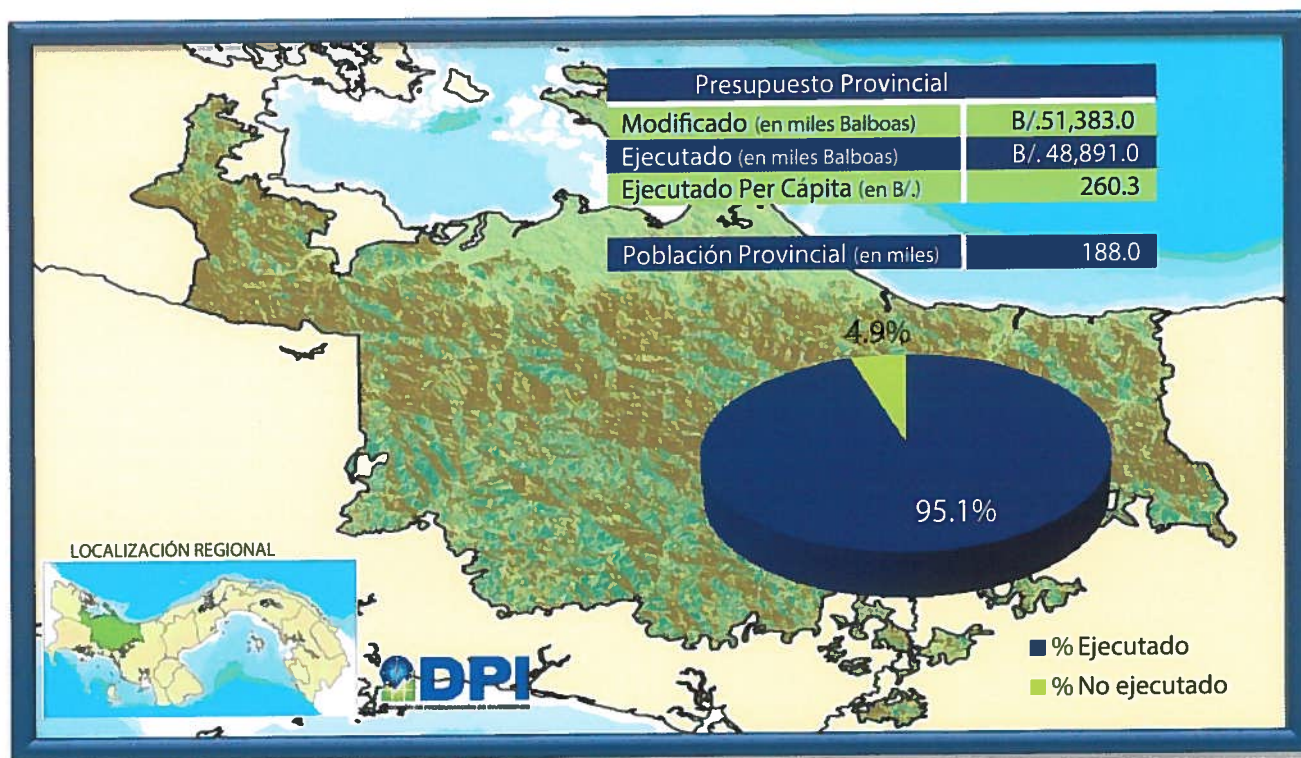

En la Comarca Ngöbe Buglé habita más del 60% de la población que vive en área comarcal. A diciembre del 2013, la comarca contó con un presupuesto modificado de B/.51,383.2 miles, representando el 71.3% del presupuesto destinado a las comarcas. De este total, se logró ejecutar el 95.1% del presupuesto, siendo el Sector Trabajo y Bienestar Social, de mayor participación con un 48.6% del presupuesto modificado en la comarca.

Cuadro N° 52
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Por Sector - Comarca Ngobe Buglé
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Sector	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	47,383.5	3,999.7	51,383.2	48,890.8	95.1	100.0
Administración y Servicios Ge	120.0	41.9	161.9	161.9	100.0	0.3
Agropecuario	91.3	0.0	91.3	91.3	100.0	0.2
Educación y Cultura	10,257.2	5,128.3	15,385.5	15,321.1	99.6	29.9
Energía	2,085.0	-1,108.3	976.7	976.7	100.0	1.9
Salud	3,088.4	1,122.8	4,211.2	2,036.4	48.4	8.2
Trabajo y Bienestar Social	24,022.4	927.1	24,949.5	24,777.0	99.3	48.6
Transporte	7,219.3	-2,228.9	4,990.4	4,909.6	98.4	9.7
Vivienda	500.0	116.8	616.8	616.8	100.0	1.2

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

CAPÍTULO VI

IV. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA FINANCIADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES

A. Misiones Atendidas

La Dirección de Programación de Inversiones, atendió veintiocho (28) misiones en la vigencia 2013. Del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se atendieron quince (15) misiones, del Banco Mundial (BM) doce (12) y una (1) del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Estas misiones se llevaron a cabo en conjunto con las unidades ejecutoras y los organismos multilaterales, además, se desarrollaron trabajos de planeamiento, coordinación y seguimiento. (Ver Cuadro N°.53 Misiones atendidas por Etapa del Proyecto).

Cuadro N° 53
Misiones atendidas por etapa de los Proyectos
Periodo Vigencia - 2013

Etapa del Proyecto	Organismo Internacional			Total
	BID	BM	FIDA	
Ejecución	10	10	1	21
Formulación	2	1	0	3
Asistencia Técnica	3	1	0	4
Total	15	12	1	28

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

B. Evaluaciones de Programas y Proyectos

Con el objetivo de fortalecer el proceso de evaluación de los programas y proyectos de inversión, la DPI continúa cumpliendo su nueva función de participar en los procesos de no objeción de términos de referencia, relativos a la selección y contratación de firmas o consorcios consultores que se postulan para llevar a cabo las evaluaciones externas de los programas y proyectos, así como en la revisión de los resultados de las mismas. Dentro de la vigencia 2013, se ha otorgado la no objeción a dos Términos de Referencias, para llevar a cabo una consultoría de evaluación intermedia y otra de evaluación final. Ambos proyectos son financiados por el BID. (Ver Anexo N° 1 Situación de las Evaluaciones de los Proyectos).

C. Análisis de la Situación Actual de los Proyectos

1. Proyectos en Formulación

Una de las principales funciones de la DPI, es la de dar el seguimiento a los proyectos en la fase de formulación, dentro de la misma se coordinó y participó en el proceso de preparación de cinco proyectos para ser financiados con recursos del BID, BM y CAF. Al principio, el Proyecto de Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá - Fase II, se formuló con la participación de dos organismos, sin embargo, se decidió obtener financiamiento únicamente con recursos aportados por la CAF. (Ver Cuadro N° 54 Proyectos en Formulación).

Cuadro N° 54
Proyectos en Formulación
Misiones Atendidas por Etapa de los Proyectos
(Al 31 de diciembre de 2013)

Proyecto	Organismo Ejecutor	Banco Financiero	Monto del Préstamo (en miles de B/.)	Observaciones
Programa de Reducción de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático y los Desastres Naturales	MEF	BID	100,000.00	Préstamo totalmente desembolsado.
Proyecto de Mejoramiento de la Prevención y Manejo de Enfermedades Oncológicas en Panamá	MINSA	BID	30,000.00	Se estimó el costo de la inversión requerida a B/150.0 millones. Inicialmente se gestionó financiero con un préstamo del BID, pero finalmente por el costo estimado se decidió su financiamiento con el procedimiento de llave en mano.
Multifase de Inversiones en Agua Potable y Saneamiento - Fase II	IDAAN/CONADES	BID	54,000.00	Este préstamo comprende dos unidades ejecutoras, al IDAAN le corresponde ejecutar 48.0 millones y a CONADES 6.0 millones. El contrato de préstamo se firmó el 8 de noviembre de 2013 y está por refrendo.
Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá-Fase II	MINSA	CAF	103,771.00	En febrero de 2013, se realizó la primera misión de identificación con el propósito de identificar las áreas de apoyo por parte del Banco Mundial al proyecto, sin embargo se decidió financiero solo con aporte del CAF, el préstamo se firmó el 30 de diciembre de 2013. Pendiente el refrendo.
Programa de Acueductos y Sistemas de Alcantarillados Nacionales (PAYSAN)	IDAAN	CAF	100,000.00	Actualmente se están revisando los términos y condiciones del contrato.
Total			387,771.00	

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

2. Proyectos en Ejecución

La cartera de proyectos en ejecución con financiamiento externo está conformada por 30 proyectos, lo que equivale a B/.1,964,658.3 miles. El monto desembolsado a la vigencia 2013 asciende a B/.1,292,895.1 miles.

Los programas Electrificación Rural, Modernización de la Gestión Ambiental, Inversión y Transformación Eléctrica Corporativa - ETESA y el Programa de Mejoramiento Habitacional han terminado sus operaciones

en la vigencia fiscal 2013 y por ende saldrán de la cartera de proyectos con la Banca Multilateral, todos eran financiados por el BID.

Cuadro N° 55
Proyectos en Ejecución por Organismo Financiero
 Al 31 de diciembre de 2013
 (En miles de Balboas)

Organismo	Cantidad	Financiamiento	Desembolso	Monto por Desembolsar
BID ^{a/}	19	800,993.0	376,305.1	368,993.5
BM	6	230,400.0	118,186.4	112,213.5
CAF	5	738,400.0	609,886.1	128,513.8
FIDA	1	4,004.0	1,071.1	2,932.8
OFID	1	1,800.0	584.7	1,215.2
JICA ^{b/}	1	189,061.6	186,861.7	2,199.8
Total	33	1,964,658.6	1,292,895.1	616,068.6

^{a/} La diferencia entre el monto por desembolsar, con respecto al financiamiento obedece a cancelaciones del monto de financiamiento de 6 proyectos.

^{b/} La diferencia entre el Informe de Ejecución a Junio 2013 y éste, se debe a que se reevalúa cada cierre de mes según la tasa de cambio, debido a que el préstamo fue negociado en la moneda Yenes no en Dólares.

Elaboración Propia. Fuente: Dirección de Crédito Público

En el cuadro N° 55, podemos observar la distribución de la banca multilateral. El BID mantiene un predominio sobre los otros organismos multilaterales en número total de préstamos, es decir concentra el 59.4% de los proyectos. Este predominio también se ve reflejado en el monto de financiamiento, ya que posee un 40.8% de participación, sin embargo, la CAF con solo 4 proyectos tiene una representación de 37.6% del monto financiado y 12.5% respecto a la cantidad de préstamos. Este comportamiento se debe principalmente a que la CAF está financiando proyectos de gran envergadura como lo son el Proyecto Saneamiento de la Bahía de Panamá y la Primera Línea del Metro de Panamá, Por último, el BM concentra el 11.7% de los recursos financiados por organismos multilaterales y el 18.7% de la cantidad de préstamos.

3. Ejecución Presupuestaria 2013

Del presupuesto modificado de inversiones no financiero del 2013, que asciende a un total de B/.5,544,145.0 miles, el aporte externo es de B/.453,345.8 miles, que representa el 8% del total de las inversiones. A diciembre 2013, se ha ejecutado B/.360,879.3 miles.

Al cierre de la vigencia 2013, se ha ejecutado 79.6% del presupuesto modificado de inversiones asignado a la banca multilateral, de la cual se destaca con una ejecución del 89.4%, la fuente CAF, por la asignación presupuestaria a los proyectos de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá y Primera Línea del

Metro de Panamá. La fuente JICA sobresale con un 92.5%, también por la asignación al proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá. Ver Cuadro N° 56.

Cuadro N° 56
Ejecución Presupuestaria 2013 por Organismo Financiero
(Al 31 de diciembre de 2013)
(En miles de Balboas)

Fuente	Presupuesto 2013		% de Ejecución
	Ley Modificado	Ejecutado	
BID	140,632.1	92,101.0	65.5
BM	54,840.3	38,635.0	70.5
CAF	254,105.0	227,191.5	89.4
FIDA	1,026.5	416.5	40.6
JICA	2,741.9	2,535.7	92.5
Total	453,345.8	360,879.7	79.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

4. Ejecución de Programas destacados por Sector:

En el cuadro N° 57, se muestra la distribución de la banca multilateral según el sector. La disposición del aporte externo está distribuido principalmente en el Sector Salud, el cual representa un 38.7% del aporte externo, seguido por el sector Transporte con un 33.0% y el Sector de Administración y Servicios Generales con un 8.1%.

Cuadro N° 57
Distribución de Financiamiento Externo, según Sector
(Al 31 de diciembre de 2013)
(En miles de Balboas)

Sector	Externo	Porcentaje
Total	1,964,658.9	100.0
Salud	760,061.6	38.7
Transporte	640,000.0	33.0
Administración y Servicios Generales	159,000.0	8.1
Educación y Cultura	119,700.0	6.1
Comercio, Industria y Turismo	51,323.0	2.6
Agropecuaria	45,204.3	2.3
Trabajo y Bienestar Social	44,170.0	2.2
Energía	42,500.0	2.2
Vivienda	30,000.0	1.5
Ambiente	28,400.0	1.4
Protección Ciudadana	22,700.0	1.2
Justicia	21,600.0	1.1

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

A continuación, los proyectos que cuentan con una ejecución presupuestaria y física mayor al 50.0%:
(Detalle del resto de los proyectos en el Anexo N° 2)

4.1. SECTOR SALUD:

4.1.1. Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá:

El Proyecto está dividido en dos Etapas:

I Etapa: Financiada por el BID, CAF, JICA, OFID y BEI, sumando un total de B/.457,500.0 miles, y con un desembolso de B/.412,252.17 miles. Esta etapa a su vez se subdivide en dos fases, la primera fase incluye la construcción de aproximadamente 135 km de redes de alcantarillado y 62 km de colectoras sanitarias; la segunda fase, incluye un sistema interceptor y una planta de tratamiento. A la fecha, entre las obras construidas se ha invertido un aproximado de B/.761,600.0 miles. Ver Cuadro N°58 “Avances de las Obras del Proyecto, por Fase”.

II Etapa: Esta etapa, incluye construcción y rehabilitación de colectoras y ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Juan Díaz (módulo 2 y 3), para atender la demanda de tratamiento del área de influencia del proyecto hasta el año 2025.

Cuadro N° 58
Avances de Obras del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá
(Al 31 de diciembre de 2013)

I FASE				
Obras	Monto de Inversión (en millones)	Medida	Avance (%)	Situación
1. COLECTORAS SANITARIAS	257.9			
Colectora Río Abajo y Monte Oscuro	8.1	10.17 km	100	Construido
Colectora Matías Hernández, Quebrada Palomo y Santa Rita	22.4	19.91 km	100	en operación
Colectora Juan Díaz (Primera Etapa)	3.6	7.31 km	100	Construido
Colectoras de Tocumen y Tagareté (Primera Etapa)	15.9	11.85 km	100	Construido
Colectora Las Lajas	14.4	12.28 km	100	Construido
Colectora Curundú	84.2	en diseño	12	en desarrollo
Colectora Quebrada Iguana y Obras de Saneamiento de Mataznillo	33.8		12	
Colectora Juan Díaz (Segunda Etapa)	57.1	por licitar		
Interconexiones de Río Abajo	18.4	en diseño	12	en desarrollo
2. REDES DE ALCANTARILLADO	53.3			
Redes de Alcantarillado Sanitario de San Miguelito (1ra Etapa)	7.2	32.25 km	100	Construido
Redes de Tocumen y Belén	16.1	55.99 km	100	Construido
Construcción de las Redes de Alcantarillado de San Miguelito (2da Etapa)	30	estudios previos		por construir
II FASE				
1. SISTEMA INTERCEPTOR	208.5			
1.1 Tunel	153	4 pozos de conexión	100	en operación
1.2 Costero	10.3	4.7 km de tubería y 3 estaciones de bombeo	100	en operación
1.3 Este	45.2	16 km de tubería y 2 estaciones de bombeo	77	en construcción
2. PLANTA DE TRATAMIENTO	242.0			
I Módulo	242.0	caudal 2.2 m³/s	100	en operación

Cuadro de elaboración propia. Fuente: MINSA/PSCBP

4.1.2. Proyecto Agua Potable y Saneamiento (PASAP):

Ejecutado por el MINSA, financiado con crédito externo con la Multilateral Banco Mundial por B/.32,000.0 miles, ha desembolsado B/.24,981.9 miles a diciembre de 2013 y cuenta con una ejecución física acumulada

del 92%. De su presupuesto Ley/Modificado de B/.10,600.0 miles, ha ejecutado un 91%, de los cuales corresponden a aporte externo B/.10,300.0 miles.

Entre sus principales logros están:

- Inversiones por el orden de B/.5,195.5 miles en letrinas, beneficiando a 37,816 habitantes. (Ver Cuadro N° 59)
- Inversiones en construcción de acueductos por un monto de B/.8,964.9 miles, beneficiando a 41,473 habitantes. (Ver Cuadro N° 60)
- 117 proyectos de A&S terminados en las Regiones de Salud de Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Este y las Comarcas de Ngöbe Bugle y Guna Yala, beneficiando a 30,168 habitantes.
- 35 proyectos de agua y saneamiento en ejecución en las Regiones de Salud de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, y la Comarcas de Ngöbe Bugle, beneficiando a 16,136 habitantes.
- Implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR). A la fecha se ha levantado información de 322 comunidades, 396 sistemas de agua y 356 prestadores de servicio a nivel nacional.
- Coordinación Interinstitucional con las instituciones que intervienen en el sector, obteniendo la validación del "Diagnóstico de la herramienta de Monitoreo de Avance País en Agua y Saneamiento (MAPAS)".
- Creación de la primera Asociación Piloto "ASOCIACION DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE ACUEDUCTOS RURALES DE CHIRIQUI (AJAARCHI)", Integrada por 13 JAAR'S (12 en Dolega y una de Boquete), actualmente la personería Jurídica está en trámite.

Cuadro N° 59
Sub-sector Agua y Saneamiento - Proyecto PASAP
Construcción de Letrinas por Provincia
(Al 31 de diciembre de 2013)
(En miles de Balboas)

Provincias	Beneficiarios	Ejecutado		
		2010-2012	dic-13	Total
Total	37,816	4,157.14	1,038.29	5,195.43
Bocas del Toro	9,513	1,725.1	453.4	2,178.4
Colón	386	18.6	12.2	30.8
Chiriquí	7,548	361.6	266.3	627.8
Herrera	395	173.1	17.8	191.0
Panamá	4,060	97.2	63.5	160.7
Veraguas	4,894	605.6	59.4	665.0
Comarca Ngöbe Bugle	11,020	1,176.0	165.7	1,341.6

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

Cuadro N° 60
Sub-sector Agua y Saneamiento - Proyecto PASAP
Construcción de Acueductos por Provincia
(Al 31 de diciembre de 2013)
(En miles de Balboas)

Provincias	Beneficiarios	Ejecutado		
		2010-2012	dic-13	Total
Total	41,473.00	6,715.4	2,249.4	8,964.8
Bocas del Toro	9,513	476.5	430.5	907.0
Coclé	1,762	876.3	73.4	949.7
Colón	386	248.5	162.4	410.9
Chiriquí	8,329	1,213.9	378.9	1,592.8
Herrera	395	568.3	58.6	626.9
Los Santos	300	449.2	46.3	495.5
Panamá	4,060	285.6	186.7	472.3
Veraguas	2,842	336.6	100.3	436.9
Comarca Kuna Yala	2,866	740.0	483.7	1,223.8
Comarca Ngöbe Bugle	11,020	1,520.6	328.4	1,849.0

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

4.1.3 Programa Unificado de Desarrollo Sostenible en el Sector de Agua y Saneamiento I y II

El Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible (CONADES), adscrito a la Presidencia de la República es un organismo administrativo creado por el Decreto Ejecutivo No.163 del 25 de noviembre de 1996; el mismo tiene como objetivo formular y coordinar la ejecución de programas dirigidos a la atención del suministro de agua potable y dotación de servicios de saneamiento.

Actualmente coordina cuatro programas, entre los cuales está el Programa Unificado de Desarrollo Sostenible del Sector de Agua Potable y Saneamiento en las Provincias, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo por un monto de B/.93,000.00 miles de dólares.

En el cuadro N° 61 se muestran las inversiones más relevantes realizadas por CONADES a través este Programa, por provincia y en la vigencia 2013, tomando en consideración proyectos en ejecución y finalizados.

Cuadro N° 61
Obras del Programa Unificado de Desarrollo en el Sector de Agua y Saneamiento
(Al 31 de diciembre de 2013)
(En miles de Balboas)

Nombre del Proyecto	Monto	% de Avance	Beneficiarios
Total	40,599.1		
Rehabilitación al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de Aguadulce (Fase II), Coclé	18,410.9	26.0	47,549
Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable para el corregimiento de Guabito, Provincia de Bocas del Toro	11,900.0	98.0	7,781
Rehabilitación al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Santiago, Veraguas	4,393.0	17.0	64,856
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Chitré, Herrera	1,947.0	100.0	55,356
Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Barú (Paso Canoas), Provincia de Chiriquí	1,799.0	100.0	56,194
Rehabilitación y mejoras a la Planta Potabilizadora Rufina J. Alfaro, Provincia de Los Santos	1,201.7	100.0	45,306
Construcción de (10) Acueductos Rurales en Guásimo-Donoso, Provincia de Colón	947.5	100.0	1,500

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones - Ministerio de Economía y Finanzas.

4.2. SECTOR AGROPECUARIO:

4.2.1 Productividad Rural

El Programa ejecutado por la ANAM y el MIDA, dentro de su objetivo de Desarrollo, está el de contribuir al aumento en la productividad de los pequeños productores rurales organizados, mediante participación en alianzas, asegurando el uso sostenible de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad de importancia global.

Bajo este objetivo el MIDA ha logrado importantes avances como:


- 130 sub-proyectos en ejecución que representan 27 rubros beneficiando a 4,448 productores organizados.
- 155 planes de negocios aprobados, según los requisitos y procedimientos del proyecto.
- Incremento del 22.1% de ingresos por venta para los productores beneficiarios, en relación al 25% esperado al finalizar el proyecto.

Con respecto al objetivo ambiental global, que busca la conservación de la diversidad biológica de importancia global y la protección de importantes ecosistemas boscosos, de montañas y marino costero en el territorio nacional; el cual es ejecutado por la ANAM, se han logrado aprobar la totalidad de las Inversiones Ambientales (IAs) de conservación de recursos naturales y agricultura sostenible que se tenían programadas como meta final (350), es importante mencionar que de las 305 IAs ejecutadas, 146 son realizadas por grupos indígenas, lo que representa cerca del 42% de participación de los pueblos indígenas.

Estas Inversiones Ambientales aprobadas benefician a 10,761 socios estratégicos de forma directa y 40,233 individuos indirectamente.

Adicionalmente a través de la ANAM, se llevan a cabo programas de educación ambiental, realizados por la Dirección de Fomento a la Cultura Ambiental de la institución, y a la fecha se han implementado en cinco (5) provincias mediante la realización de siete (7) jornadas de educación ambiental en 13 escuelas. En monitoreo y evaluación el proyecto presenta avances en la interpretación de las imágenes en un 95%. Se espera que para el 2014 se cuente con el mapa terminado y su respectivo informe técnico.

Mapa de cobertura boscosa y uso de suelo 2012 de Panamá.

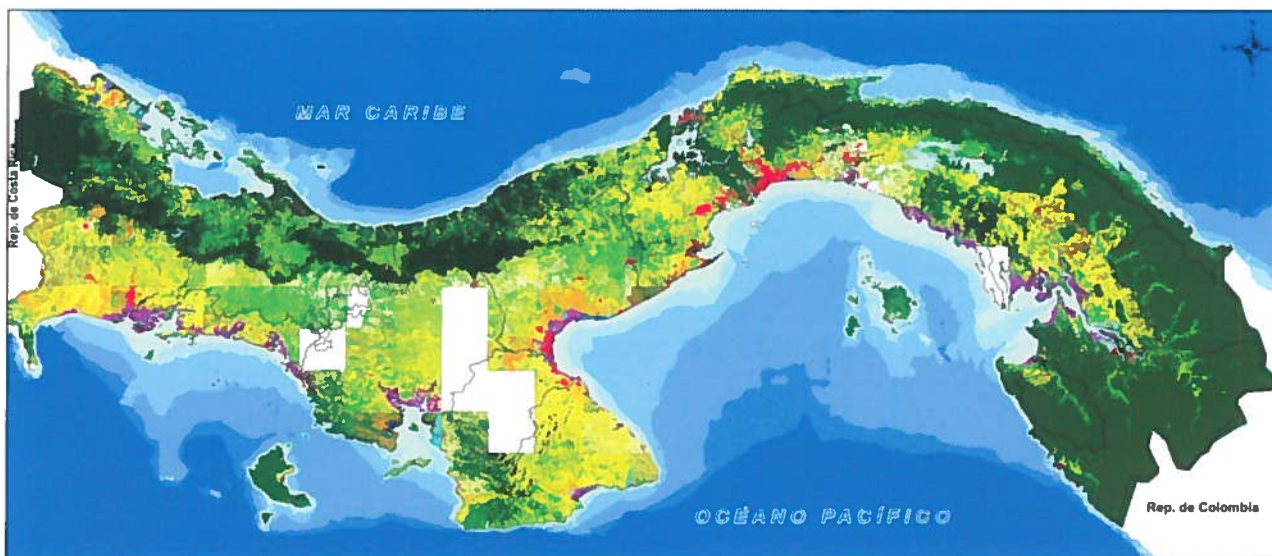

Avance en la interpretación de las imágenes satelitales

Fuente: ANAM-CBMAP II

4.2.2 Proyecto de Desarrollo Participativo y Modernización Rural (PARTICIPA)

El programa inicia en marzo de 2010 y está enfocado en mejorar las condiciones sociales, económicas y de vida de los habitantes de las localidades y corregimientos pobres de Veraguas. El programa ha beneficiado a la fecha a 71 organizaciones que han recibido capacitaciones en temas organizativos-técnicos como requisito para la ejecución de las inversiones en campo, que corresponderían a 1,588 productores.

Los planes productivos se encuentran en distintos estados de avances técnicos-financieros. De estos se derivan diferentes micros proyectos referidos a inversiones de desarrollo productivo agropecuario.

Durante el año 2013, se hizo entrega de dos desembolsos del préstamo con FIDA, sumando un total de B/.624.3 miles, recursos dirigidos a 23 planes productivos.

Respecto a los aspectos financieros del Proyecto, en relación al Préstamo de O.P.E.P. como parte del cofinanciamiento, se han recibido en esta gestión B/.400.0 miles de fondo rotativo, recursos que han sido orientados a 23 planes de producción.

CONCLUSIONES

Las Inversiones Públicas No Financieras, descritas en este Informe de Ejecución al 31 de diciembre de 2013, puntualizan de forma explícita, como se han invertido los dineros del Estado y de todos los panameños en programas y proyectos, en cada sector e institución del país.

Con un presupuesto ajustado de B/. 5,544,144.7 miles, para la vigencia fiscal 2013, se destinó el 75.4% a las veintiuna (21) instituciones que componen el Gobierno Central, por la cuantía de proyectos que se ejecutan instituciones como el Ministerio de Obras Públicas que ocupó el 23.4% de este presupuesto y otras como el Ministerio de Economía y Finanzas 20.4% y el Ministerio de la Presidencia 13.9%. En tanto las Instituciones Descentralizadas y Empresas Públicas se les destinó el 20.8% y 3.8% respectivamente, conformando así el presupuesto modificado más alto de estos últimos 5 años.

La ejecución presupuestaria alcanzó al 31 de diciembre de 2013, el 86.5% y 85.7% entre 2010-2013, convirtiéndose así, en una de las ejecuciones más altas de los últimos años, 9.7% más que el periodo anterior (2005-2009) y 22.0% más que el periodo (2000-2004), por lo que se puede decir que las inversiones lograron desarrollarse en su mayoría en el tiempo estipulado.

Todos los programas y proyectos que han culminado, así como los que aún se mantendrán de acuerdo al Plan de Quinquenal de Inversiones, han cumplido su objetivo primordial, elevar nivel de bienestar de la población, el impacto que han tenido los programas sociales, en las condiciones de vida de la población, han tenido efectos muy positivos, las estadísticas así lo refuerzan, las cifras de pobreza por ejemplo, han disminuido en siete (7) puntos porcentuales entre 2009 y 2013, esto quiere decir, que miles de personas dejaron de ser pobres (153,000), gracias a los programas de subsidio o ayudas del Gobierno, tanto es así que hasta 45.0% del ingreso de un hogar en pobreza extrema en el área rural, proviene de estas ayudas. Entre los pobres extremos la pobreza se redujo en 4.7% lo que equivale a 117,000 personas. Así mismo, programas como la Beca Universal, Bono Escolar y la Donación de Útiles Escolares, lograron aumentar la matrícula estudiantil en 14.0%.

Muchos otros proyectos, tanto de corte social, como todos los que involucran infraestructura, han sido claves para lograr un mejor bienestar en la vida de los panameños, estos proyectos también llamados imperdonables como: los MINSA-CAPSI, la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la Línea Uno del Metro; la Construcción del Centros Penitenciarios; Ampliación y Rehabilitación de Carreteras a nivel nacional; la Construcción de Hospitales; Ampliación y Acondicionamiento de Aeropuertos, las Jumbo Tiendas, con las que el consumidor ahorra hasta B/.80.00 en su canasta básica, la Cadena de Frío; entre otros, ya han alcanzado avances en su ejecución, entre 90 y 100%, lo que se traduce en un trabajo desarrollado de manera eficiente y eficaz por nuestras instituciones y los servicios contratados.

Todos los logros alcanzados al 31 de diciembre de 2013, fueron posible por el mejoramiento de las finanzas públicas que generaron confianza tanto a nivel nacional como internacional, y nos proporcionó las herramientas necesarias para alcanzar todas las Inversiones Públicas No Financieras que hoy vemos convertidas en obras de primer mundo.

ANEXOS

Anexo N° 1

Situación de las Evaluaciones de los Proyectos

PROYECTO	REFERENCIA ACREEDOR	ORGANISMO EJECUTOR	TIPO DE EVALUACIÓN	CON NO OBJECCIÓN DE DPI	OBSERVACIONES
FINALIZADOS					
APOYO TÉCNICO AL CLIMA DE INVERSIONES Y ADAPTACIÓN AL LIBRE COMERCIO	1757/OC-PN	MEF	FINAL	SI	Se realizó el Taller de Cierre del Programa al mes de mayo. En el taller se expusieron las actividades desarrolladas en el marco del Programa así como extraer las lecciones aprendidas del proceso.
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL	1912/OC-PN	ANAM	FINAL	NO	Finalizó la consultoría para la evaluación final del programa. Se esta coordinando con el Banco la realización del taller de cierre para retroalimentar a las instituciones involucradas.
TRÁMITE					
COMPETITIVIDAD Y APERTURA COMERCIAL	1941/OC-PN	MICI	INTERMEDIA	SI	La comisión evaluadora elaboró la lista corta y se envió al Banco para su aprobación. Posteriormente evaluó las propuestas técnicas y económicas, y se envió al Banco para seguir con el proceso de selección de la firma o consorcio.
MULTIFASE DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO- FASE II	2367/OC-PN	IDAAN	INTERMEDIA	SI	En agosto la DPI revisó y dio no objeción al proceso que selecciono a la lista corta, para invitar a presentar la propuestas.
PROGRAMA MULTIFASE DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL PPP PARA LA COMPETITIVIDAD - FASE I	1785/OC-PN	MOP	FINAL	NO	La comisión evaluadora envió para consideración de la DPI la evaluación de las propuestas presentadas en el acto público. El informe está en revisión.
EN EJECUCIÓN					
RED DE OPORTUNIDADES	1867/OC-PN	MIDES	IMPACTO	SI	Tiene una duracion de 3 años. En revisión el producto 3: Propuesta técnica para la recolección de datos de la primera medición de impacto.
ESPACIOS EDUCATIVOS Y CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES	2462/OC-PN	MEDUCA	IMPACTO	SI	Primera parte: definición de línea base. En ejecución, se aplicó las pruebas durante los meses de abril y mayo de 2013. Están en etapa de análisis de los resultados. La empresa consultora entregó el primer informe de evaluación en julio, el mismo se encuentra en la Dirección de Planificación y Evaluación Educativa para su revisión y aprobación.

Anexo N° 2: Proyectos en Ejecución con financiamiento Externo por Sector

PROYECTO	DESCRIPCIÓN	RELACIÓN CON EL PLAN DE GOBIERNO	AVANCES
Salud			
Saneamiento de la Bahía y Ciudad de Panamá. Costo Total: B/. 752.1 millones (Primera Fase) Aporte BID: B/.75.0 millones. Aporte CAF: B/.120.0 millones. Aporte BEI: B/.18.0 millones. Aporte JICA: B/.224.5 millones. Aporte OFID: B/. 20.0 millones. Aporte GOB: B/. 196.0 millones	Objetivos: • Mejorar las condiciones sanitarias, particularmente en barrios de bajos de los cauces y ríos urbanos en el área metropolitana de la Ciudad de Panamá. • Recuperar y devolverle a la población los ríos y quebradas de la Ciudad de Panamá que actualmente son, además de un riesgo para la salud pública, áreas malsanas y negativas para el desarrollo urbano y la calidad de vida de sus habitantes. • Recuperar la Bahía de Panamá para brindarle al mundo una imagen de una ciudad y un país que crecen de cara al mar, respetando el medio ambiente y sus recursos.	Eliminar la contaminación por aguas residuales domésticas e industriales en las quebradas, ríos y mares.	En ejecución la Primera Etapa del proyecto: • Redes de Alcantarillado Sanitario: construidos 88.24 km de redes: 32.25 km de redes de Alcantarillado Sanitario en San Miguelito (I Etapa) y 55.99 km de Redes en Tocumen y Belén; por construir aproximadamente 50 KM de Redes de Alcantarillado en San Miguelito II Etapa. • Colectoras Sanitarias: dentro de esta primera etapa se espera invertir en 9 colectoras sanitarias con un costo aproximado de B/.257.9 millones. De éstas nueve, una está operando la Colectora Matías Hernández, Quebrada Palomo y Santa Rita (B/.22.4 millones), otras 4 colectoras se encuentran construidas por un monto de inversión de B/.42.0 millones, en diseño están 3, las Colectoras de Quebrada Iguana, la de Curundú y las Interconexiones de Río Abajo; y por licitar está la Colectora de Juan Díaz (Segunda Etapa). • Sistema Interceptor, lo componen el Túnel Interceptor, que ya está operando y en su recorrido interceptará las colectoras actuales y nuevas; El Interceptor Este, tiene un avance de 77%, y el mismo permitirá recolectar las aguas residuales de los corregimientos de Juan Díaz, Pedregal y Tocumen hasta la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; y el Interceptor Costero, también en operación y transporta las aguas residuales del Casco Antiguo e interceptará las descargas de aguas residuales que se vierten a la Bahía de Panamá en el sector de la Cinta Costera llevándolas hasta el Túnel Interceptor por medio del Pozo de Conexión de Balboa. • Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: en operación desde mayo 2013 y actualmente recibe 1,800 litros de aguas residuales que se vertían al Río Matías Hernández y Matasnillo.
Agua Potable y Saneamiento (PASAP) Costo Total: B/.39.4 millones Aporte BM: B/.32.0millones Aporte GOB: B/.7.4 millones	Objetivo: aumentar el acceso de agua y mejorar el saneamiento ambiental en áreas de extrema pobreza dentro de un modelo de desarrollo sostenible, con la participación del MINSA como ejecutor y del IDAAN como participante. También incluye el fortalecimiento de las políticas y capacidades del sector y mejorar las prácticas sanitarias. Beneficiarios: 125,000 a nivel nacional	Mejorar la cobertura y aprovechamiento de agua en poblaciones marginadas.	Presentó una ejecución presupuestaria de 96% al cierre del 2013. Presenta los siguientes avances significativos: • Conformación y fortalecimiento de 96 Juntas Administradoras de Acueductos Rurales. • 117 proyectos terminados de obras integrales de agua y saneamiento en las regiones de Salud de Chiriquí, Bocas del Toro, Colón, Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá Oeste, Panamá Este y las Comarcas de Ngabe Bugle y Guna Yala. • 35 proyectos en ejecución de obras integrales de agua y saneamiento en las regiones de Salud de Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas, y la Comarcas de Ngabe Bugle. • Implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR).

Inversiones en Agua Potable y Saneamiento Fase I Costo Total: B/.50.0 millones Aporte BID: B/.40.0millones Aporte GOB: B/.10.0 millones	Objetivos: mejorar las condiciones de vida de la población, mediante el mejoramiento de los servicios de agua potable y la construcción de sistemas de alcantarillado y mejorar la situación institucional y financiera del IDAAN para que provea los servicios con eficiencia, calidad y sostenibilidad. Beneficiarios: 459,057 residentes en las áreas: i) ciudad de Panamá, ii) Arraiján; iii) Chorrera; iv) ciudades de provincias centrales y iv) occidente del país	Fortalecer la cobertura de los servicios de salud dando mayor privilegio a la población más vulnerable.	El programa cuenta con 11 proyectos, 9 en ejecución con un avance físico promedio 42% y dos proyectos finalizados. Estas obras comprenden mejoramiento, rehabilitación y ampliación en los sistemas de agua potable y alcantarillado en las Provincias de Chiriquí, Los Santos y Panamá, de esta última en Chorrera y Arraiján.
Mejoramiento de Agua y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón Costo Total: B/.55.0 millones Aporte BM: B/.40.0millones Aporte GOB: B/.15.0 millones	Objetivos: aumentar la calidad, cobertura y eficiencia de sus servicios de suministro y tratamiento de agua en las barriadas de bajos ingresos de la zona metropolitana de Panamá y Colón. Beneficiarios: 416,000 residentes en las áreas: i) distrito de Panamá, ii) San Miguelito; iii) Colón.	Fortalecer la cobertura de los servicios de salud dando mayor privilegio a la población más vulnerable.	Al cierre del 2013 cuenta con un 64% de comprometido del aporte externo y un 90% del aporte local. Los proyectos en ejecución suman un total de B/.31,989.5 miles del que sobresalen los proyectos: • Proyecto Línea de 24" (PP-Chilibre a TA-Pedernal) y obras complementarias, por un monto de B/.10,897,845.41, financiado por el BM en un 80% (B/.8,718,276.33) y avance físico de 10%. • Mejoramiento de los Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón, por un monto de B/.17,650,597. En ejecución Fase I Diagnóstico y Diseño: se cuenta con el catastro de redes y usuarios. Avance Fase I de 64%. <u>Proyectos licitados y en elaboración de contrato:</u> • Construcción de Acueducto y alcantarillado de las Comunidades de Nuevo México 1 y 2 y obras complementarias. • Supervisión del Componente I, que comprende la construcción de Agua Potable, alcantarillados sanitarios condominiales y sistema de tratamiento en sitio para 73 comunidades en los Distritos de Panamá, San Miguelito y Colón. • Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en las Provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro.
Mejoramiento del Sector de Agua Potable y Saneamiento de la Provincia de Panamá Costo Total: B/.125.0 millones Aporte CAF: B/.100.0millones Aporte GOB: B/.25.0 millones	Objetivos: mejorar las condiciones de vida de la población de la Provincia de Panamá, mediante la expansión y el mejoramiento sostenible de la cobertura, calidad, eficiencia y confiabilidad de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario Beneficiarios: 1,300,000 residentes de las áreas: i) área central de la ciudad de Panamá, ii) San Miguelito; iii) Alcalde Díaz-Las Cumbres; iv) Chilibre-Buena Vista; v) Arraiján y la Chorrera; y vi) Tocumen y Pacora.	Fortalecer la cobertura de los servicios de salud dando mayor privilegio a la población más vulnerable.	El programa contempla alrededor de 22 proyectos, de los cuales 7 están en ejecución con una inversión de B/.8,420.9 miles y un avance físico promedio 50%, estas obras comprenden mejoramiento, rehabilitación y ampliación en los sistemas de agua potable y alcantarillado en la Provincia de Panamá. Adicionalmente incluye consultorías principalmente para el desarrollo de los diseños y planos de obras de acueductos y alcantarillados, actualmente hay 5 en ejecución con un avance promedio de 69%. Entre los proyectos más significativos por su monto de inversión están: 1. Rehabilitación y limpieza de los tanques sépticos del Distrito de Panamá y San Miguelito por B/.3,195.2 miles; 2. Diseño, Planos y Construcción de la Nueva Red de Agua Potable: Línea 16 de Chilibre - Don Bosco por B/.2,199.6 miles, y 3. Estudio y Diseño Final de Obras de Acueductos y Alcantarillado de la Ciudad de Panamá por B/.1,479.4 miles.

Mejora de la Equidad en Salud Costo Total: B/. 58.7 millones Aporte BM: B/. 40.0 millones Aporte GOB: B/. 18.7 millones	Objetivo: Reducir las inequidades en el sector salud incrementando el acceso a servicios básicos de atención en zonas rurales pobres.	Promover la equidad en la prestación de los servicios de salud	Entre los avances con los que cuenta el proyecto podemos mencionar que: 203,220 personas pobres con barreras de acceso reciben intervenciones de APS en sus comunidades cada 2 meses por un Equipo Básico de Salud. 90% de la población beneficiaria recibe al menos una atención en el año. 59% de la población beneficiaria recibe atención cada 2 meses. 75% de las embarazadas completan al menos 3 controles prenatales Existen a la fecha 47 Unidades Básicas de Salud (UBA's) itinerantes capacitadas, equipadas y en funcionamiento.
Mejoramiento de la Equidad y Fortalecimiento a los Servicios de Salud Costo Total: B/. 70.0 millones Aporte BID: B/. 50.0 millones Aporte GOB: B/. 20.0 millones	Objetivos: Mejorar la equidad en salud en Panamá, a través del incremento en el acceso, uso y calidad de servicios de salud en Comarcas Indígenas y sus áreas rurales limítrofes.	Promover la equidad en la prestación de los servicios de salud	Entre las actividades clave en la vigencia actual están los Convenios de Gestión, los cuales han sido ya suscritos para la implementación del pago per cápita y por desempeño en la red fija e itinerante de la atención primaria en salud. La realización de los mismos se inició desde enero y se extenderá hasta el próximo año en el caso de la red itinerante. Se está llevando a cabo la construcción, identificación y definición de las comunidades céntricas en donde haya más de 200 personas para que sean definidas como comunidades céntricas para las Unidades Básicas de Atención (UBAS). En la actualidad existen 1,500 comunidades céntricas y 67 periféricas, que aún están en proceso de depuración y ajuste. Se incorporaron nutricionistas y monitoras al equipo de red fija en la región de Kuna Yala. Se están llevando a cabo capacitaciones para este equipo y se espera que a partir de julio se continúe en la región de Darién.
Programa Unificado de Desarrollo Sostenible del Sector de Agua Potable y Saneamiento en las Provincias Costo Total: B/. 137.0 millones Aporte BID: B/. 119.0 millones Aporte GOB: B/. 18.6 millones	Objetivos: Contribuir a mejorar el bienestar de los habitantes de áreas urbanas y rurales de las provincias del interior del país, a través del incremento en la cobertura y en la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, incluyendo la gestión de los residuos sólidos y la protección de fuentes de agua para el consumo humano.	Mejorar la gestión de los recursos asignados al Sector Salud, mediante la reestructuración, descentralización y desconcentración de los servicios de Salud.	Actualmente el programa está ejecutando 59 proyectos de los cuales destacan los siguientes: Diseño y Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua para Guabito en Bocas del Toro, con un avance físico de 97% e incluye: toma de agua, línea de aducción, sistema de control de presiones, planta potabilizadora y tanques de almacenamiento; Mejoras a la planta potabilizadora de Los Algarrobos de Chiriquí (52% avance físico) incluye: obras civiles, laboratorio, mejoramiento de filtros; Mejoras a la planta potabilizadora de Penonomé (95% avance físico) incluye: mejoras a la toma de agua cruda existente; mejoras a la planta de tratamiento de agua (sedimentadores, floculadores, válvulas, dosificadores); Tanque de almacenamiento, medidores de caudal y de nivel, B/. 1,479.4 miles.

Educación y Cultura			
Espacios Educativos y Calidad de Aprendizaje Costo Total: B/.32.4 millones Aporte BID: B/.30.0 millones Aporte GOB: B/. 2.4 millones	Objetivo: contribuir al mejoramiento del acceso y la calidad de la oferta educativa en las comarcas indígenas. Beneficiarios: Estudiantes en la región de Nürum, Comarca Emberá-Wounaan y Comarca Kuna Yala 20,000 Directos 500 docentes	Mejorar la calidad de la Educación Básica y Media.	Proyectos en ejecución: 1. Diseño y construcción de la Escuela Sede Comarca Ngäbe Buglé Centro Educativo El Peñón: Costo Total B/.5,000,000.0 y cuenta con un avance físico de 55%. El contrato fue liquidado. Se tramita nueva contratación para los trabajos finales. Orden de proceder para finalizar la obra desde el 25/11/2013 y empresa en campo con personal y materiales. 2. Escuelas del Nivel Básico rehabilitadas, ampliadas, reparadas y mantenidas.16 Centros educativos finalizados; otros 25 con un 67% de avance físico promedio. 3. Centros Educativos Sedes y escuelas equipados. 5% (entregado) y en trámite de adquisiciones el 42% del presupuesto. (El Peñón y Lajas Blancas) 4. Talleres para directores realizados, 66% de avance físico. Dos talleres realizados en el año 2013 y uno programado para el año 2014.
Innovación en la Infraestructura Escolar Costo Total : B/.80.0 millones Aporte BID: B/.70.0 millones Aporte GOB: B/.10.0 millones	Objetivo: Contribuir a aumentar el acceso a la educación a través de la infraestructura escolar innovadora y mejoras en la gestión escolar y curricular	Mejorar el sistema educativo mediante un proceso de reingeniería en el uso de los recursos.	Proyectos en ejecución: 1. La ampliación, rehabilitación, reparación y mantenimiento de 46 escuelas del Nivel Básico. Red Lajas Blancas: 33% para la terminación de las obras de la Red. Red Ustupu: El 100% terminación de la obras. 2. Documentos teóricos prácticos con estrategias innovadoras basados en el enfoque por competencias para el mejoramiento de Lenguaje y Matemática. 3. Guías didácticas con orientaciones metodológicas para la enseñanza de Lenguaje y Matemática desde inicial hasta 3° 4. Cuadernillos de trabajo de Lenguaje y Matemática desde 1° hasta 3°, para estudiantes. Impresos y entregados. 12,000 cuadernillos impresos y entregados. 5. Bibliotecas de aula adquiridas y entregadas. 500 bibliotecas adquiridas. 6. Equipo de facilitadores nacionales capacitados en el uso de las Guías, gestión pedagógica, comunicación, gestión administrativa y escolar. 225 facilitadores nacionales capacitados. 7. Docentes, directores y supervisores capacitados en el uso de las Guías con orientaciones metodológicas (Lenguaje y Matemática). 20,000 docentes capacitados. 8. Directores, docentes y supervisores capacitados en gestión pedagógica, comunicación y gestión administrativa para fortalecer los aprendizajes en Lenguaje y Matemática. 9. Docentes que han recibido dos visitas al año durante tres años por parte de los supervisores.

Programa Multifase de Transformación Tecnológica Fase I Costo Total: B/.29.0 millones Aporte BID: B/.19.7 millones Aporte GOB: B/. 9.3 millones	Objetivo: Contribuir al crecimiento económico sostenible de Panamá, a través del aumento de su capacidad de investigación, desarrollo e innovación científica y tecnológica, aplicada a los siguientes sectores económicos claves: logística y transporte, bio-ciencia y tecnología de información y comunicaciones.	Promover el desarrollo de las ciencias y tecnología en Panamá	Proyecto con buen ritmo de ejecución física y financiera. Entre las metas cumplidas están: • Número de jóvenes identificados como talentosos: 7,421. • Consolidación de enseñanza de ciencia basada en indagación (MEDUCA – SENACYT), 60% de los estudiantes beneficiados por el programa muestran progreso en el aprendizaje en ciencias. Con un total de 10,210 docentes atendidos durante la ejecución del programa de primaria y la ampliación de cobertura de secundaria, que corresponden a 2 mil escuelas, se logró un total de 150 docentes especialistas en ciencia, química, física, biología y matemática que atienden en 61 centros educativos de media académica a nivel nacional. • Publicación de indicadores especializados: 2 • Número de miembros que se adhieren al Sistema Nacional de Investigaciones 111. Dentro de estas actividades alcanzadas, es la Infoplazas uno de los proyectos con gran impacto social y educativo. El BID ha dado no objeción para las compras y adquisiciones de las Infoplazas de las regiones de Herrera, Coclé, Los Santos, Panamá, Colón, Darién y las Comarcas Guna Yala y Emberá por un monto de B/.430.8 miles.
Vivienda			
Programa de Mejoramiento de las Condiciones Habitacionales Costo Total : B/. 33.0 millones Aporte BID: B/. 30.0 millones Aporte GOB: B/. 3.0 millones	Objetivo: Mejorar las condiciones habitacionales de las familias de menores ingresos de Panamá, mediante el mayor acceso a servicios urbanos básicos y a viviendas de nivel económico. Beneficiarios: 792 familias de las áreas más marginadas de Panamá, los que recibirán una vivienda a través del Programa de Apoyo Rápido a Viviendas de Interés Social (PARVIS)	Garantizar una vivienda digna a todos los panameños, ya para reducir el déficit habitacional de más de 150,000 unidades.	El proyecto vence el 20 de diciembre de 2013. El componente PROMEBA no realizó inversiones constructivas, los gastos fueron principalmente de pre-inversión. Se produjeron estudios técnicos y actividades de organización social que facilitarán inversiones futuras. El componente PARVIS estaba claramente orientado a la construcción de viviendas de padrón económico. El decremento y luego incremento de los recursos PARVIS se debe al hecho de que este componente en inicio cedió sus recursos al PROMEBA. PARVIS contribuye a la dotación de viviendas económicas y al mejoramiento de las condiciones habitacionales, con soluciones de 36m2 destinada a la población de bajos ingresos.
Trabajo y Bienestar Social			
Protección Social I: Apoyo a la Red de Oportunidades Costo Total: B/.46.9 millones Aporte BID: B/.20.2 millones Aporte BM: B/.24.0 millones Aporte GOB: B/.2.7 millones	Objetivo: : Busca fortalecer la red de oportunidades (RDO) para mejorar las condiciones de vida de los hogares pobres extremos residentes en áreas indígenas rurales y urbano-marginales del país. Beneficiarios: 73,860 hogares en pobreza extrema (en su modalidad de transferencias monetarias) residentes en 585 corregimientos del país.	Fortalecer la Red de Oportunidades.	El programa de Protección Social - Red de Oportunidades inicio el año 2008. El mismo es ejecutado por MIDES y MINSA. Respecto a la Evaluación de Impacto que se está llevando a cabo en conjunto con el Banco y el equipo del Proyecto, continúan con la revisión y ajuste de los productos sobre la metodología utilizada y la caracterización de la población beneficiaria de la Estrategia de Extensión de Cobertura. El MIDES continuará con la ejecución del proyecto una vez el proyecto de préstamo haya finalizado. El MINSA ejecutó a 100% el Componente 3 del proyecto, el cual es Fortalecimiento de la oferta de servicios de salud materno - infantil.

Transporte			
Primera Línea del Metro de Panamá Costo Total: B/. 1,880.3 millones Aporte CAF: B/. 400.0 millones Aporte MIGA: B/. 220.0 millones Aporte GOB: B/. 914.4 millones Aporte CESCE: B/. 61.1 millones Aporte COFACE: B/. 284.8 millones	Objetivo: -Disminuir los tiempos de movilidad de los usuarios del sistema de transporte. -Mejorar la calidad de tiempo y vida de los usuarios a través de la reducción del tiempo de viaje. -Reestructurar el esquema de movilidad urbana y posibilitar un desarrollo urbanístico ordenado y acorde a las necesidades de la población.	Modernizar el sistema de transporte público en la ciudad de Panamá	El proyecto posee un avance de 97%. A la fecha se mantienen los trabajos del complejo ferroviario "Pacios y Talleres", estaciones subterráneas y pozos, estaciones elevadas y viaducto. Para los meses de octubre, noviembre y diciembre, las actividades ejecutadas se han mantenido en la ruta crítica de las actividades programadas. Existen, a la fecha, dos estaciones con obras finalizadas, que son Estación 5 de Mayo y Estación Fernández de Córdoba. Las 12 restantes se encuentran en estado de restitución, ingeniería de detalle e ingeniería conceptual.
Infraestructura Vial I Costo Total: B/. 105.0 millones Aporte BID: B/. 70.0 millones Aporte GOB: B/. 35.0 millones	Objetivo: Mejorar de manera sostenible el transporte terrestre de cargas y pasajeros en los corredores prioritarios de la red vial panameña, a fin de aumentar la competitividad del país.	Mejorar la red vial del país para apoyo logístico a nivel nacional.	A 31 de diciembre el programa ha desembolsado el 89% de los fondos de fuente externa. Entre los proyectos más significativos que se están llevando a cabo podemos mencionar: Diseño y Construcción del Puente Vehicular sobre el río Chico (Chiriquí), Estudio de Deflectometría para la CPA Penonomé-Aguadulce y la Prestación de los servicios de Ingeniería para la Inspección y Supervisión de Diseño y Construcción del Puente Vehicular sobre el río chico (Chiriquí).
Infraestructura Vial II Costo Total: B/. 100.0 millones Aporte BID: B/. 70.0 millones Aporte GOB: B/. 30.0 millones	Objetivo: Desarrollar acciones preventivas para mejorar la convivencia ciudadana y reducir los índices de violencia juvenil en las provincias de mayor incidencia.	Mejorar la red vial del país para apoyo logístico a nivel nacional.	Esta etapa comprende los Proyectos Rehabilitación y Mantenimiento del Tramo Penonomé - Aguadulce y Rehabilitación de Caminos Rurales. Al 31 de diciembre ha desembolsado en 10% del financiamiento externo.
Energía			
Electrificación Rural Costo Total: B/. 35.0 millones Aporte BID: B/. 30.0 millones Aporte GOB: B/. 5.0 millones	Objetivo: Mejorar el acceso a energía eléctrica lugares pobres rurales	Mejorar el acceso a energía eléctrica lugares pobres rurales.	Dentro de los avances presentados en el proyecto podemos mencionar: Componente 1: Líneas de Extensión: El número de viviendas beneficiadas con las líneas e instalaciones eléctricas fueron 731, en las provincias de Chiriquí, Coclé, Herrera, Panamá y Veraguas. Componente 2: Sistemas Fotovoltaicos (Sistemas Aislados). Por medio de este proyecto se han beneficiado 4,141 viviendas, 35 escuelas, 6 centros de salud y 36 congresos en la Comarca Guna Yala.
Electrificación Rural Costo Total: B/. 35.0 millones Aporte BID: B/. 30.0 millones Aporte GOB: B/. 5.0 millones	Objetivo: • Apoyar la realización de inversiones del Plan de Transmisión Nacional, en el mediano plazo • Apoyar la Transformación Corporativa de la empresa, a fin de que la misma pueda operar en forma eficiente y con orientación comercial como fuera previsto en la Ley 6 de 1997 y orientar a la empresa para que cumpla con los criterios para que la misma pueda recibir préstamos sin garantía soberana, por parte del Banco.	Mejorar la redes de transmisión eléctrica del país	A la vigencia el programa ha desembolsado el 90.4% de los fondos de fuente externa.

Agropecuario			
Productividad Rural y Recursos (PRORURAL) Costo Total: B/. 46.9 millones Aporte BM: B/. 39.4 millones Aporte GOB: B/. 7.5 millones	Objetivo: Incrementar los ingresos de los productores; Aumentar la productividad creciente de los pequeños productores rurales organizados en asociaciones y con participación en alianzas productivas. Beneficiarios: 5,000 productores y 24,000 familias de las provincias de: Herrera, Los Santos y Veraguas.	Brindar apoyo al productor agropecuario en la comercialización de sus productos.	Inicia en marzo de 2010 y está enfocado en mejorar las condiciones sociales, económicas y de vida de los habitantes de las localidades y corregimientos pobres de Veraguas. El programa ha beneficiado a 71 organizaciones que han recibido capacitaciones en temas organizativos-técnicos como requisito para la ejecución de las inversiones en campo, que corresponderían a 1,588 productores. Los planes productivos se encuentran en distintos estados de avances técnicos-financieros. De estos se derivan diferentes micro proyectos referidos a inversiones de desarrollo productivo agropecuario. Durante el año 2013 se hizo entrega de dos desembolsos sumando un total de 23 planes productivos otorgados durante esta gestión. Respecto a los aspectos financieros del Proyecto, en relación al Préstamo de O.P.E.P. como parte del cofinanciamiento, se han recibido en esta gestión B/. 400 mil de fondo rotativo, recursos que han sido orientados a 23 planes de producción.
Participación y Modernización Rural (PARTICIPA) Costo Total: B/. 10.2 millones Aporte FIDA: B/. 3.9 millones Aporte GOB: B/. 6.3 millones	Objetivo: Mejorar las condiciones sociales, económicas y de vida de hombres, mujeres y jóvenes de localidades y corregimientos pobres de 5 distritos de Veraguas, a través de un proceso de desarrollo inclusivo, participativo, ambientalmente sostenible y con equidad de género. Beneficiarios: 10,000 usuarios de los distritos de: Cañazas, Las Palmas, Santa Fe, San Francisco y Soná.	Implementar programas de capacitación, apoyo tecnológico y financiamiento blando a los microproductores	Se lleva a cabo desde el año 2008. Dentro de sus avances se puede mencionar: -Usuarios muestran actualmente resultados que trascienden al corto plazo relacionados al aprendizaje, incremento de la producción agropecuaria y generación de ingresos a nivel familiar. -De los planes de producción realizados en el proyecto se derivan diferentes microproyectos referidos a inversiones de desarrollo productivo agropecuario, en donde existen 10 rubros pecuarios y 9 rubros agrícolas. -Las organizaciones que han ejecutado los Planes de Producción, mayormente operan eficientemente procedimientos y elementos contables y administrativos requeridos para concretizar las inversiones materiales.
Industria, Comercio y Turismo			
Programa de Competitividad de Apertura Comercial Costo Total: B/. 97.6 millones Aporte BID: B/. 51.3 millones Aporte GOB: B/. 37.1 millones Cooperación Técnica: B/. 1.6 millones Sector Privado: B/. 7.6 millones	Objetivo: Contribuir al crecimiento de la base productiva de la economía panameña.	Abrir nuevos mercados a productos con calidad de exportación	El Programa, ejecutado por el MICI, inició el año 2008. Los hitos más importantes del programa incluyen: El financiamiento de la contratación de consultores de largo plazo para dotar a unidades encargadas de la negociación y administración de acuerdos comerciales con capacidades técnicas y humanas necesarias para enfrentar los retos de las negociaciones y administración de la amplia red de acuerdos comerciales. El diseño, desarrollo y puesta en marcha del portal de promoción de exportación de PanamaExport, para promocionar la oferta exportable de bienes y servicios. El Programa Pro-Competitividad (ProCom) ha evidenciado un impacto importante en los rendimientos, volúmenes de exportación, disminución de costos y generación de empleos entre las empresas que se han beneficiado a través del mismo. Dentro del Programa para el Desarrollo Empresarial Indígena (PRODEI), 14 empresas con un aproximado de 3,225 asociados pertenecientes a las Comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, fueron beneficiadas con la elaboración de diagnósticos empresariales, consecuentes planes estratégicos y comerciales, formulación de proyectos financiables por el programa, asistencia técnica, provisión de equipos, capacitaciones o gestión de desarrollo de mercados, entre otros.

Administración y Servicios Generales			
Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT) Costo Total: B/. 65.0 millones Aporte BID: B/. 54.0 millones Aporte GOB: B/. 11.0 millones	Objetivo: Contribuir al proceso de modernización e integración del sistema de administración de tierras de todo el país, promoviendo la seguridad de la tenencia de la tierra y generando condiciones para el desarrollo del país. Beneficiarios: residentes de las provincias de Panamá y Colón.	Garantizar la titulación gratis de los derechos posesorios, que permita a todo campesino ser dueño de su tierra.	El programa tiene un saldo por desembolsar del préstamo de B/. 1.3 millones. Los pagos por compromisos contractuales con las empresas encargadas de los levantamientos catastrales y catastro equivaldrían a B/. 1.1 millones. Uno de los proyectos más importantes atendidos este año, fue el realizado en la Comunidad costera de Boca La Caja, el cual dio respuesta social a centenares de lugareños, que por muchos años han aspirado hacerse poseedores de un título de propiedad.
Programa de Fortalecimiento de la Gestión Fiscal Costo Total: B/. 55.0 millones Aporte BID: B/. 50.0 millones Aporte GOB: B/. 5.0 millones	Objetivo: Elevar la inversión pública a los niveles requeridos por el Plan Estratégico de Gobierno, a través del incremento sostenible de la recaudación impositiva y la mejora de la eficiencia en el manejo del gasto público.	Reforzar la eficiencia y competitividad del Estado	*Se logró satisfactoriamente implementar la metodología de estimación del gasto tributario. *6500 impresoras fiscales en funcionamiento y auditadas y sistema de apelación tributaria del TAT en proceso. *Apoyo en la elaboración de la ley del fondo de ahorro soberano.
Proyecto de Asistencia Técnica - Mejoramiento de la Eficiencia del Sector Público Costo Total : B/. 60.3 millones Aporte BM: B/. 55.0 millones Aporte GOB: B/. 5.0 millones	Objetivos: Apoyar a la administración pública de Panamá en la modernización de los procesos de gestión del gasto y en el desarrollo de capacidades e instrumentos para producir, usar y diseminar información de desempeño, sobre los programas públicos a fin de permitir una administración de los recursos públicos más eficientes, efectivos y transparentes.	Garantizar el adecuado uso y manejo individual de los recursos del Estado.	•Fueron realizados términos de referencia de consultorías para el Fortalecimiento Institucional del Rol Rector del MEF en la Mejora de la Eficiencia del Sector Público, Implantación de Políticas de Gestión Institucional y Asistencia Técnica al Despacho Superior-Consultoría en Materia Fiscal-OECD. La Dirección Nacional de Contabilidad realiza el Suministro e Instalación de un Sistema Integrado de Planificación de Recursos Gubernamentales (PRG) para el Sector Público de la República de Panamá. Se encuentra en la fase II que contempla la configuración y adecuación del sistema. La DGCP ha realizado Contrataciones de Bienes y Servicios Conexos, entre ellos la adquisición de equipos tecnológicos: Unidades de Almacenamiento, Hardware de bloqueo contra intrusos, Licencias para equipos CISCO para el IDC (infraestructura para centro de datos). Para ser utilizado por la Dirección se adquiere nuevo stand, equipo fotográfico, material de difusión sobre la Ley de Contrataciones Públicas y sus modificaciones.
Justicia			
Programa de Mejoramiento de Administración de Justicia Costo total: B/. 30.0 millones Aporte BID: B/. 21.6 millones Aporte GOB: B/. 8.4 millones	Objetivos: Fortalecer el estado de derecho, a través de la implantación y consolidación de reformas al sistema de justicia, su modernización y la mejora en la prestación de sus servicios. Ampliar el acceso a la justicia. Mejorar la imparcialidad y eficacia del sistema, por medio de acciones prioritarias relacionadas con la materia penal, la gestión judicial y la transparencia.	Fortalecer la democracia y la modernización del Estado, mediante modificaciones a la Constitución Nacional.	Este programa inició en el 2008 y tiene como fecha límite de desembolso septiembre de 2014. A diciembre de 2013 el programa ha desembolsado el 80% de los recursos externos. Durante la vigencia fiscal 2013 se destacan las siguientes actividades de la PGN en ejecución: -Construcción de la Galera del Centro de Custodia de Bienes Cautelados (60% de avance físico); -Construcción de la Unidad Judicial Regional de Colón (20% de avance físico). Por otra parte en el 2013 se finalizó las siguientes consultorías: Consultoría para el fortalecimiento del Proceso de Auditoría, Incautación y Custodia de Bienes Cautelados, Consultoría Servicios de Capacitación Básica en el Sistema Acusatorio.

Protección Ciudadana			
Programa de Seguridad Integral Costo Total: B/.25.1 millones Aporte BID: B/. 22.7 millones Aporte GOB: B/.2.4 millones	Objetivo: Desarrollar acciones preventivas para mejorar la convivencia ciudadana y reducir los índices de violencia juvenil en las provincias de mayor incidencia.	Incluir a la población de la sociedad civil en la fase preventiva de la lucha contra el crimen.	Entre los principales logros que ha llevado a cabo el programa están: el diseño, desarrollo e implantación del Sistema Integrado de Estadística Criminal (SIEC) y el Observatorio de la Violencia, con una inversión de B/.2.3 millones. El programa preventivo de violencia juvenil desarrollado en comunidades vulnerables de los municipios beneficiados (Colón, David, Panamá y San Miguelito), llevando a cabo actividades deportivas y culturales, y la rehabilitación o mejoramiento de infraestructura deportiva, cultural y de atención a jóvenes en comunidades vulnerables. De éstas infraestructuras 31 finalizaron, quedando 11 en construcción de las 42 programadas. Se diseñó, construyó y equipó un nuevo y moderno Centro de Cumplimiento para menores infractores con una inversión de B/.11.7 millones en Pacora, Municipio de Panamá.
Ambiente			
Programa de Modernización de la Gestión Ambiental Costo Total: B/.14.0 millones Aporte BID: B/.10.0 millones Aporte GOB: B/. 4.0 millones	Objetivos: Consolidar y modernizar el desarrollo de la gestión ambiental y de las capacidades de la ANAM para responder a los desafíos de la competitividad eficientes, efectivos y transparentes.	Establecer una institucionalidad ambiental sólida para liderar el proceso de cambio cultural para el logro del Desarrollo Sostenible.	Este proyecto inició en 2008 y su fecha límite fue a octubre de 2013. Con el proyecto se realizaron, dentro del Componente 1: "Estudio de viabilidad y mercado para el desarrollo de criterios ecológicos para la implementación del eco etiquetado, el cual concluyó. A través del Componente 3 se realizó la consultoría relativo al levantamiento de un catastro de los usuarios de aguas superficiales y subterráneas en el Arco Seco, que fue concluida, se realizó el suministro e instalación de siete (7) estaciones hidrometeorológicas en las cuencas de los ríos Antón, Grande, Santa María, La Villa, Tonosí, Juan Díaz y Caimito, las cuales son de interés común para ANAM y ETESA.
Programa de Mejoramiento de Administración de Justicia Costo total: B/. 30.0 millones Aporte BID: B/. 21.6 millones Aporte GOB: B/. 8.4 millones	Objetivos: Contribuir a la protección de zonas de recargas, ojos de agua, riberas de los ríos y cuencas con potencial hidroenergético a través de medidas de restauración de suelos y reforestación. Aumentar en la rentabilidad de fincas y contribuir a la disminución de la pobreza rural. Beneficiarios: Las Cuencas Hidrográficas de los Ríos: La Villa, Río Chiriquí, Río Grande, Bayano, Santa María, Río Tuira y Chucunaque.	Asegurar la provisión de energía eléctrica a bajo costo y reducir la dependencia de hidrocarburos, la contaminación ambiental.	Tuvo como año de inicio 2009 y el programa está en está proceso de reformulación. Para dar inicio a las inversiones agroambientales se deben tener los Planes de Manejo de Fincas realizados. El año 2013 se dio inicio con la construcción de estufas ahorradoras de leña en la cuenca del río Santa María. Se han capacitado a 62 personas con la realización de un taller de convocatoria con potenciales beneficiarios en las comunidades de Cerro Largo y Menchaca, con el objetivo de elaborar los Planes Indicativos de las Cuencas Hidrográficas de los ríos Chiriquí y Parita. Realizado el taller de convocatoria con potenciales beneficiarios en las comunidades de Paja de Sombrero y de Gualaca en la Provincia de Chiriquí para tratar temas de sistemas agroambientales y energéticos, los requisitos para participar en el Programa, identificación de proyectos existentes de la cuenca, identificación de la problemática y oportunidades entre otros.

Anexo 3

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras según Fuente de Financiamiento y Objetos del Gasto, por Sector.

Cuadro N° 62

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Salud Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	678,519.4	196,823.0	875,342.4	641,274.2	73.3	100.0
Crédito Externo	138,173.6	1,124.2	139,297.8	109,533.4	78.6	15.9
Crédito Interno	40,977.3	849.7	41,827.0	41,364.8	98.9	4.8
Donaciones	0.0	8,041.0	8,041.0	1,729.7	21.5	0.9
Fideicomiso e Ingresos del Canal	48,424.1	3,557.5	51,981.6	49,426.3	95.1	5.9
Fondo Fiduciario	6,408.3	0.0	6,408.3	2,916.1	45.5	0.7
Ingresos Corrientes	368,613.7	160,656.6	529,270.2	370,243.2	70.0	60.5
Recursos de Patrimonio	441.8	29,579.7	30,021.4	11,482.0	38.2	3.4
Transferencia de Capital	75,480.7	-6,985.7	68,495.1	54,578.7	79.7	7.8

Cuadro N° 63

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Salud Según Objeto de Gasto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	678,519.4	196,823.0	875,342.4	641,274.2	73.3	100.0
Asignaciones Globales	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0
Inversión Financiera	1,000.0	1,730.4	2,730.4	0.0	0.0	0.3
Maquinaria y Equipo	71,073.5	77,692.7	148,766.2	83,639.6	56.2	17.0
Materiales y Suministros	38,594.5	13,906.1	52,500.6	42,086.8	80.2	6.0
Obras y Construcciones	493,295.7	88,554.2	581,849.9	447,406.1	76.9	66.5
Servicios No Personales	69,845.6	10,085.6	79,931.2	59,422.8	74.3	9.1
Servicios Personales	3,665.4	-81.3	3,584.1	2,897.2	80.8	0.4
Transferencias Corrientes	1,041.5	4,935.3	5,976.8	5,821.6	97.4	0.7

Cuadro N° 64

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Educación y Cultura - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	447,737.9	113,626.0	561,363.9	497,845.5	88.7	100.0
Crédito Externo	19,000.0	0.0	19,000.0	12,591.0	66.3	3.4
Crédito Interno	0.0	8,109.2	8,109.2	8,085.0	99.7	1.4
Donaciones	501.0	7,142.5	7,643.5	7,142.5	93.4	1.4
Fideicomiso e Ingresos del Canal	72,915.8	8,804.5	81,720.3	71,063.5	87.0	14.6
Ingresos Corrientes	204,784.1	63,563.4	268,347.4	247,930.8	92.4	47.8
Recursos de Patrimonio	16,424.5	14,656.7	31,081.2	23,946.3	77.0	5.5
Transferencia de Capital	134,112.6	11,349.8	145,462.3	127,086.4	87.4	25.9

Cuadro N° 65

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Educación y Cultura - Según Objeto del Gasto

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	447,737.9	113,626.0	561,363.9	497,845.5	88.7	100.0
Asignaciones Globales	3,442.1	-1,399.7	2,042.3	2,042.0	100.0	0.4
Inversión Financiera	22,920.0	-5,038.2	17,881.8	16,396.8	91.7	3.2
Maquinaria y Equipo	68,119.7	43,304.5	111,424.3	103,034.7	92.5	19.8
Materiales y Suministros	22,452.9	9,084.2	31,537.1	25,716.4	81.5	5.6
Obras y Construcciones	62,694.8	21,096.6	83,791.4	67,882.6	81.0	14.9
Servicios No Personales	28,154.8	17,983.0	46,137.8	37,197.2	80.6	8.2
Servicios Personales	12,838.7	4,003.3	16,841.9	14,575.7	86.5	3.0
Transferencias Corrientes	225,447.8	21,716.0	247,163.8	228,255.4	92.3	44.0
Transferencias de Capital	1,667.1	2,876.3	4,543.4	2,744.7	60.4	0.8

Cuadro N° 66

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Vivienda - Según Fuente de Financiamiento

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	52,132.2	75,518.3	127,650.5	121,413.0	95.1	100.0
Crédito Externo	5,000.0	-428.9	4,571.1	4,134.6	90.5	3.6
Crédito Interno	0.0	24,000.0	24,000.0	23,983.4	99.9	18.8
Fideicomiso e Ingresos del Canal	8,514.0	0.0	8,514.0	8,510.9	100.0	6.7
Fondo Fiduciario	5,992.1	0.0	5,992.1	5,574.3	93.0	4.7
Ingresos Corrientes	29,826.1	51,405.0	81,231.1	77,183.0	95.0	63.6
Recursos de Patrimonio	2,800.0	542.2	3,342.2	2,026.7	60.6	2.6

Cuadro N° 67

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Vivienda - Según Objeto del Gasto

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	52,132.2	75,518.3	127,650.5	121,413.0	95.1	100.0
Asignaciones Globales	62.0	29,635.6	29,697.6	29,678.0	99.9	23.3
Inversión Financiera	4,801.5	1,496.5	6,298.0	5,300.4	84.2	4.9
Maquinaria y Equipo	534.0	131.2	665.2	662.2	99.5	0.5
Materiales y Suministros	2,233.8	974.7	3,208.4	3,011.1	93.8	2.5
Obras y Construcciones	31,888.6	37,182.2	69,070.8	65,752.3	95.2	54.1
Servicios No Personales	1,292.2	2,570.3	3,862.5	2,583.5	66.9	3.0
Servicios Personales	3,618.2	206.1	3,824.3	3,405.2	89.0	3.0
Transferencias Corrientes	192.0	118.7	310.7	307.3	98.9	0.2
Transferencias de Capital	7,510.0	3,203.0	10,713.0	10,713.0	100.0	8.4

Cuadro N° 68

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Fuente de Financiamiento

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	304,678.7	476,478.9	781,157.6	763,147.1	97.7	100.0
Crédito Externo	24,496.8	-3,270.4	21,226.4	21,214.4	99.9	2.7
Donaciones	5,799.0	7,792.1	13,591.1	13,509.8	99.4	1.7
Fideicomiso e Ingresos del Canal	230,466.1	72,808.1	303,274.2	298,677.5	98.5	38.8
Fondo Fiduciario	11,648.6	-11,460.0	188.6	174.6	92.6	0.0
Ingresos Corrientes	29,321.6	388,243.5	417,565.1	404,714.4	96.9	53.5
Recursos de Patrimonio	881.7	22,078.1	22,959.8	22,803.7	99.3	2.9
Transferencia de Capital	2,065.0	287.5	2,352.5	2,052.7	87.3	0.3

Cuadro N° 69

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Objeto del Gasto

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	304,678.7	476,478.9	781,157.6	763,147.1	97.7	100.0
Asignaciones Globales	7.9	84,239.6	84,247.4	84,243.3	100.0	10.8
Inversión Financiera	0.0	0.2	0.2	0.2	93.2	0.0
Maquinaria y Equipo	2,807.1	21,576.6	24,383.7	24,131.0	99.0	3.1
Materiales y Suministros	3,553.9	65,207.5	68,761.4	65,350.3	95.0	8.8
Obras y Construcciones	36,738.5	120,500.2	157,238.7	155,312.1	98.8	20.1
Servicios No Personales	9,765.5	57,140.6	66,906.1	65,705.5	98.2	8.6
Servicios Personales	13,119.1	3,594.8	16,714.0	13,331.5	79.8	2.1
Transferencias Corrientes	108,574.5	-1,612.3	106,962.3	106,825.3	0.0	13.7
Transferencias de Capital	130,112.3	125,831.7	255,944.0	248,247.8	97.0	32.8

Cuadro N° 70

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Transporte - Según Fuente de Financiamiento

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	1,821,816.1	109,177.8	1,930,994.0	1,773,141.8	91.8	100.0
Crédito Externo	97,617.9	-5.0	97,612.9	86,154.3	88.3	5.1
Crédito Interno	0.0	83,782.0	83,782.0	56,384.8	67.3	4.3
Donaciones	0.0	65.0	65.0	0.0	0.0	0.0
Fideicomiso e Ingresos del Canal	23,497.7	19.0	23,516.7	20,528.2	87.3	1.2
Ingresos Corrientes	1,662,513.2	-132,976.4	1,529,536.9	1,438,092.6	94.0	79.2
Recursos de Patrimonio	4,002.5	81,498.8	85,501.3	72,920.0	85.3	4.4
Transferencia de Capital	34,184.8	76,794.4	110,979.2	99,061.9	89.3	5.7

Cuadro N° 71
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Transporte - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	1,821,816.1	109,177.8	1,930,994.0	1,773,141.8	91.8	100.0
Inversión Financiera	8,250.4	30,718.3	38,968.7	28,761.0	73.8	2.0
Maquinaria y Equipo	45,991.1	558.8	46,549.9	35,783.8	76.9	2.4
Materiales y Suministros	19,823.9	5,683.2	25,507.1	13,105.2	51.4	1.3
Obras y Construcciones	1,671,622.7	27,232.1	1,698,854.8	1,600,248.4	94.2	88.0
Servicios No Personales	63,129.5	24,507.5	87,637.0	64,656.7	73.8	4.5
Servicios Personales	4,050.5	738.6	4,789.2	3,627.7	75.7	0.2
Transferencias Corrientes	153.7	20,064.9	20,218.6	19,327.5	95.6	1.0
Transferencias de Capital	8,794.4	-325.6	8,468.8	7,631.5	90.1	0.4

Cuadro N° 72
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Energía - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	12,387.8	13,305.1	25,692.8	19,820.0	77.1	100.0
Crédito Externo	10,288.0	1,206.0	11,494.0	8,898.0	77.4	44.7
Fideicomiso e Ingresos del Canal	1,012.0	31.0	1,043.0	1,031.2	98.9	4.1
Ingresos Corrientes	87.8	12,068.1	12,155.8	9,627.8	79.2	47.3
Transferencia de Capital	1,000.0	0.0	1,000.0	262.9	72.7	3.9

Cuadro N° 73
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Energía - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	12,387.8	13,305.1	25,692.8	19,820.0	77.1	100.0
Asignaciones Globales	0.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0	100.0	3.9
Maquinaria y Equipo	1,020.1	-1,009.0	11.1	8.8	79.1	0.0
Materiales y Suministros	42.3	-6.8	35.5	29.3	82.5	0.1
Obras y Construcciones	9,598.9	11,915.7	21,514.6	16,698.5	77.6	83.7
Servicios No Personales	1,605.7	939.4	2,545.1	1,538.1	60.4	9.9
Servicios Personales	120.8	462.6	583.4	542.1	92.9	2.3
Transferencias Corrientes	0.0	3.2	3.2	3.2	100.0	0.0

Cuadro N° 74

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Telecomunicaciones - Según Fuente de Financiamiento

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	665.0	2,082.2	2,747.2	2,563.7	93.3	100.0
Fideicomiso e Ingresos del Canal	490.0	-100.0	390.0	389.0	99.8	14.2
Ingresos Corrientes	175.0	322.2	497.2	339.0	68.2	18.1
Recursos de Patrimonio	0.0	1,860.0	1,860.0	1,835.6	98.7	67.7
Transferencia de Capital	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Cuadro N°75

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Telecomunicaciones - Según Objeto del Gasto

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	665.0	2,082.2	2,747.2	2,563.7	93.3	100.0
Inversión Financiera	0.0	153.0	153.0	153.0	0.0	5.6
Maquinaria y Equipo	490.0	1,779.2	2,269.2	2,205.8	97.2	82.6
Materiales y Suministros	0.0	26.2	26.2	6.2	0.0	1.0
Obras y Construcciones	175.0	18.5	193.5	103.0	53.3	7.0
Servicios No Personales	0.0	105.5	105.5	95.7	90.8	3.8

Cuadro N° 76

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Agropecuario - Según Fuente de Financiamiento

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	55,712.3	49,296.8	105,009.2	76,476.2	72.8	100.0
Crédito Externo	8,711.2	0.0	8,711.2	8,101.3	93.0	8.3
Crédito Interno	0.0	2,500.0	2,500.0	1,705.0	68.2	2.4
Donaciones	16,427.3	-2,427.0	14,000.2	10,380.8	74.1	13.3
Fideicomiso e Ingresos del Canal	5,968.3	-16.5	5,951.8	4,894.0	82.2	5.7
Ingresos Corrientes	19,822.5	42,644.6	62,467.1	41,093.5	65.8	59.5
Recursos de Patrimonio	0.0	6,969.6	6,969.6	6,969.6	100.0	6.6
Transferencia de Capital	4,783.1	-373.9	4,409.2	3,332.0	75.6	4.2

Cuadro N°77
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Agropecuario - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	55,712.3	49,296.8	105,009.2	76,476.2	72.8	100.0
Asignaciones Globales	1.3	0.0	1.3	0.9	69.2	0.0
Inversión Financiera	78.4	0.0	78.4	78.4	100.0	0.1
Maquinaria y Equipo	2,459.2	2,063.6	4,522.8	2,965.6	65.6	4.3
Materiales y Suministros	4,408.0	2,454.2	6,862.3	5,418.4	79.0	6.5
Obras y Construcciones	26,358.4	16,505.3	42,863.7	31,681.8	73.9	40.8
Servicios No Personales	5,074.1	535.8	5,609.9	4,462.1	79.5	5.3
Servicios Personales	4,519.8	969.7	5,489.5	5,147.9	93.8	5.2
Transferencias Corrientes	231.7	13,283.4	13,515.1	1,301.7	9.6	12.9
Transferencias de Capital	12,581.4	13,484.7	26,066.1	25,419.3	97.5	24.8

Cuadro N°78
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	252,853.2	74,704.5	327,557.7	294,603.2	89.9	100.0
Crédito Externo	9,000.0	0.0	9,000.0	8,446.1	93.8	2.7
Fideicomiso e Ingresos del Canal	6,000.0	-202.7	5,797.3	5,090.8	87.8	1.8
Fondo fiduciario	6,475.5	0.0	6,475.5	6,074.6	93.8	2.0
Ingresos Corrientes	188,869.9	42,047.8	230,917.7	207,606.1	89.9	70.5
Recursos de Patrimonio	3,771.7	1,761.4	5,533.2	2,233.2	40.4	1.7
Transferencia de capital	38,736.1	31,098.0	69,834.1	65,152.4	93.3	21.3

Cuadro N° 79
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	252,853.2	74,704.5	327,557.7	294,603.2	89.9	100.0
Inversión Financiera	26,633.1	19,894.1	46,527.2	46,011.9	98.9	14.2
Maquinaria y Equipo	2,565.2	1,750.7	4,315.9	3,205.0	74.3	1.3
Materiales y Suministros	1,948.7	-90.5	1,858.2	1,561.9	84.1	0.6
Obras y Construcciones	157,598.7	33,673.5	191,272.2	170,866.7	89.3	58.4
Servicios No Personales	35,762.5	13,880.0	49,642.5	42,664.1	85.9	15.2
Servicios Personales	7,431.6	2,534.3	9,965.9	7,729.4	77.6	3.0
Transferencias Corrientes	11,199.3	-1,942.7	9,256.6	8,952.0	96.7	2.8
Transferencias de Capital	9,714.2	5,005.0	14,719.1	13,612.1	92.5	4.5

Cuadro N° 80
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Finanzas - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	70,968.3	1,038.0	72,006.3	35,319.8	49.1	100.0
Crédito Interno	2,500.0	0.0	2,500.0	738.1	29.5	3.5
Ingresos Corrientes	37,410.5	2,020.2	39,430.7	24,231.0	61.5	54.8
Recursos de Patrimonio	28,557.8	-2,582.2	25,975.6	8,370.7	32.2	36.1
Transferencia de capital	2,500.0	1,600.0	4,100.0	1,980.0	48.3	5.7

Cuadro N° 81
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Finanzas - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	70,968.3	1,038.0	72,006.3	35,319.8	49.1	100.0
Asignaciones Globales	60.0	0.0	60.0	6.1	10.2	0.1
Inversión Financiera	63,777.8	-2,696.8	61,081.0	27,121.8	44.4	84.8
Maquinaria y Equipo	2,030.5	112.0	2,142.5	1,409.2	65.8	3.0
Materiales y Suministros	75.0	0.0	75.0	46.5	62.0	0.1
Obras y Construcciones	1,685.0	-136.0	1,549.0	524.2	33.8	2.2
Servicios No Personales	800.0	92.5	892.5	269.8	30.2	1.2
Transferencias Corrientes	370.0	-60.0	310.0	45.8	14.8	0.4
Transferencias de Capital	2,170.0	3,726.3	5,896.3	5,896.2	100.0	8.2

Cuadro N° 82
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Administración y Servicios Generales - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	225,630.7	170,273.8	395,904.5	301,654.9	76.2	100.0
Crédito Externo	30,119.7	5,100.0	35,219.7	12,257.4	34.8	8.9
Crédito Interno	3,500.0	0.0	3,500.0	2,933.9	83.8	0.9
Donaciones	1,058.0	1,500.0	2,558.0	1,545.2	60.4	0.6
Fideicomiso e Ingresos del Canal	17,650.0	17,150.0	34,800.0	34,277.0	98.5	8.8
Ingresos Corrientes	155,592.3	116,042.2	271,634.5	209,527.3	77.1	68.6
Recursos de Patrimonio	4,300.7	15,304.3	19,605.0	15,647.6	79.8	5.0
Transferencia de capital	13,410.0	15,177.2	28,587.2	25,466.4	89.1	7.2

Cuadro N° 83

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Administración y Servicios Generales - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	225,630.7	170,273.8	395,904.5	301,654.9	76.2	100.0
Asignaciones Globales	669.8	203.1	872.9	872.2	99.9	0.2
Inversión Financiera	38,748.7	1,106.1	39,854.8	37,308.7	93.6	10.1
Maquinaria y Equipo	21,158.1	44,437.6	65,595.6	52,976.9	80.8	16.6
Materiales y Suministros	2,677.1	12,582.9	15,260.1	14,724.5	96.5	3.9
Obras y Construcciones	73,398.1	34,152.6	107,550.6	71,405.9	66.4	27.2
Servicios No Personales	56,186.0	67,326.1	123,512.2	96,607.2	78.2	31.2
Servicios Personales	10,094.8	6,944.9	17,039.7	14,345.1	84.2	4.3
Transferencias Corrientes	6,676.0	2,105.4	8,781.3	8,272.4	94.2	2.2
Transferencias de Capital	16,022.1	1,415.2	17,437.3	5,141.9	29.5	4.4

Cuadro N° 84

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Justicia - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	66,303.3	38,437.9	104,741.1	75,410.0	72.0	100.0
Crédito Externo	5,218.5	-2,000.0	3,218.5	2,926.4	90.9	3.1
Donaciones	376.9	0.0	376.9	0.0	0.0	0.4
Ingresos Corrientes	59,307.8	40,479.9	99,787.8	71,169.7	71.3	95.3
Transferencia de capital	1,400.0	-42.1	1,357.9	1,313.9	96.8	1.3

Cuadro N° 85

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Justicia - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	66,303.3	38,437.9	104,741.1	75,410.0	72.0	100.0
Asignaciones Globales	17.8	0.0	17.8	0.0	0.0	0.0
Maquinaria y Equipo	4,555.1	4,856.4	9,411.5	6,805.1	72.3	9.0
Materiales y Suministros	403.5	4,345.1	4,748.5	3,842.8	80.9	4.5
Obras y Construcciones	54,520.4	27,420.4	81,940.8	58,408.2	71.3	78.2
Servicios No Personales	5,309.2	2,003.6	7,312.8	5,332.0	72.9	7.0
Servicios Personales	751.5	259.9	1,011.3	857.4	84.8	1.0
Transferencias Corrientes	745.8	-447.4	298.3	164.5	55.1	0.3

Cuadro N° 86

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Minería - Según Fuente de Financiamiento

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	32.5	168.1	200.6	107.4	53.5	100.0
Ingresos Corrientes	32.5	168.1	200.6	107.4	53.5	100.0

Cuadro N° 87

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Minería - Según Objeto del Gasto

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	32.5	168.1	200.6	107.4	53.5	100.0
Maquinaria y Equipo	13.7	-13.7	0.0	0.0	0.0	0.0
Materiales y Suministros	0.0	3.0	3.0	3.0	100.0	1.5
Obras y Construcciones	0.0	29.0	29.0	29.0	100.0	14.5
Servicios Personales	18.8	149.8	168.6	75.4	44.7	84.1

Cuadro N° 88

Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras

Sector Protección Ciudadana - Según Fuente de Financiamiento

Al 31 de diciembre de 2013

(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	128,026.6	85,736.4	213,763.0	177,943.8	83.2	100.0
Crédito Externo	5,200.0	-200.0	5,000.0	2,487.2	49.7	2.3
Ingresos Corrientes	122,826.6	85,936.4	208,763.0	175,456.6	84.0	97.7

Cuadro N° 89
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Protección Ciudadana - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	128,026.6	85,736.4	213,763.0	177,943.8	83.2	100.0
Maquinaria y Equipo	102,591.4	49,524.9	152,116.3	134,641.8	88.5	71.2
Materiales y Suministros	987.7	16,983.4	17,971.1	17,422.3	96.9	8.4
Obras y Construcciones	19,758.6	7,617.8	27,376.5	12,088.5	44.2	12.8
Servicios No Personales	3,742.3	11,325.2	15,067.6	12,698.1	84.3	7.0
Servicios Personales	836.2	10.7	847.0	744.6	87.9	0.4
Transferencias Corrientes	110.3	172.2	282.4	246.3	87.2	0.1
Transferencias de Capital	0.0	102.1	102.1	102.1	100.0	0.0

Cuadro N° 90
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Ambiente - Según Fuente de Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Fuente de Financiamiento	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	17,875.2	2,138.8	20,014.0	14,556.9	72.7	100.0
Crédito Externo	7,070.2	-848.0	6,222.2	4,117.6	66.2	31.1
Donaciones	6,610.7	-17.6	6,593.1	4,159.9	63.1	32.9
Ingresos Corrientes	655.0	2,187.0	2,842.0	2,597.1	91.4	14.2
Recursos de Patrimonio	1,500.0	865.6	2,365.6	1,920.0	81.2	11.8
Transferencia de capital	2,039.4	-48.3	1,991.1	1,762.3	88.5	9.9

Cuadro N° 91
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Sector Ambiente - Según Objeto del Gasto
Al 31 de diciembre de 2013
(En miles de Balboas)

Objeto del Gasto	PRESUPUESTO				% de Ejec. Ejec. / Mod.	% de Part. Modificado
	Ley	Ajustes	Modificado	Ejecutado		
Total	17,875.2	2,138.8	20,014.0	14,556.9	72.7	100.0
Asignaciones Globales	4,912.2	232.4	5,144.6	3,646.0	70.9	25.7
Inversión Financiera	0.0	22.0	22.0	22.0	100.0	0.1
Maquinaria y Equipo	703.8	1,106.4	1,810.2	1,466.5	81.0	9.0
Materiales y Suministros	3,142.0	-719.9	2,422.1	1,215.6	50.2	12.1
Obras y Construcciones	971.5	628.0	1,599.5	1,542.0	96.4	8.0
Servicios No Personales	7,497.0	-2,071.0	5,426.0	3,141.0	57.9	27.1
Servicios Personales	335.6	2.9	338.6	294.5	87.0	1.7
Transferencias Corrientes	313.0	2,937.9	3,250.9	3,229.2	99.3	16.2

Anexo N° 4
Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras
Según Sector e Instituciones que lo componen
Al 31 de diciembre de 2013
(en Balboas)

Sector / Institución	Ley 2013	Créditos	Modificado	Ejecutado	% Ejec	% Part Modificado	% Part Ejecutado
Administración y Servicios Generales	225,630,700	170,273,806	395,904,506	301,654,852	76.2	100.0	100.0
Asamblea Nacional	4,885,000	50,755,776	55,640,776	50,418,426	90.6	14.1	16.7
Autoridad de Protección Al Consumidor y Defensa de la Competencia	0	6,780	6,780	6,779	100.0	0.0	0.0
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	0	1,553,640	1,553,640	1,553,640	100.0	0.4	0.5
Autoridad Nacional de Aduanas	1,680,000	541,870	2,221,870	761,957	34.3	0.6	0.3
Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá	0	756,570	756,570	25,319	3.3	0.2	0.0
Autoridad Nacional de los Servicios Públicos	6,236,400	3,707,836	9,944,236	8,261,378	83.1	2.5	2.7
Autoridad Nacional de Titulación de Tierras	9,244,300	0	9,244,300	4,993,790	54.0	2.3	1.7
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	8,600,000	14,070,248	22,670,248	22,300,658	98.4	5.7	7.4
Contraloría General de la República	738,550	2,252,941	2,991,491	329,823	11.0	0.8	0.1
Dirección General de Contrataciones Públicas	5,505,000	125,000	5,630,000	1,074,952	19.1	1.4	0.4
Instituto Panameño Autónomo Cooperativo	630,000	0	630,000	0	0.0	0.2	0.0
Lotería Nacional de Beneficencia	238,500	931,605	1,170,105	849,904	72.6	0.3	0.3
Ministerio de Economía y Finanzas	134,104,300	-11,000,881	123,103,419	70,745,880	57.5	31.1	23.5
Ministerio de Gobierno	2,500,000	6,465,718	8,965,718	8,965,714	100.0	2.3	3.0
Ministerio de la Presidencia	6,406,950	57,004,034	63,410,984	61,445,792	96.9	16.0	20.4
Ministerio de Relaciones Exteriores	7,784,850	11,196,205	18,981,055	5,338,205	28.1	4.8	1.8
Ministerio de Seguridad Pública	650,000	2,346,292	2,996,292	2,346,216	78.3	0.8	0.8
Registro Público de Panamá	13,318,850	4,168,000	17,486,850	14,361,092	82.1	4.4	4.8
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)	20,350,000	18,650,040	39,000,040	38,439,421	98.6	9.9	12.7
Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas	225,000	11,140	236,140	185,549	78.6	0.1	0.1
Tribunal Electoral	2,533,000	6,730,992	9,263,992	9,250,358	99.9	2.3	3.1
Agropecuaria	55,712,322	49,296,832	105,009,154	76,476,206	72.8	100.0	100.0
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá	1,683,800	-14,600	1,669,200	952,290	57.1	1.6	1.2
Instituto de Investigaciones Agropecuarias	3,284,300	698,136	3,982,436	2,910,725	73.1	3.8	3.8
Instituto de Mercadeo Agropecuario	910,000	-891,560	18,440	15,374	83.4	0.0	0.0
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	46,859,222	49,504,856	96,364,078	69,631,183	72.3	91.8	91.0
Ministerio de la Presidencia	2,975,000	0	2,975,000	2,966,634	99.7	2.8	3.9
Ambiente	17,875,200	2,138,771	20,013,971	14,556,913	72.7	100.0	100.0
Autoridad Nacional del Ambiente	17,875,200	1,888,771	19,763,971	14,306,913	72.4	98.8	98.3

Ministerio de la Presidencia	0	250,000	250,000	250,000	100.0	1.2	1.7
Educación y Cultura	447,737,850	113,626,030	562,363,880	497,845,456	88.7	100.0	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	1,200,000	0	1,200,000	350,000	29.2	0.2	0.1
Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Rec. Humanos (IFARHU)	241,143,300	11,669,161	252,812,461	235,729,220	93.2	45.0	47.3
Instituto Nacional de Cultura	4,750,500	3,176,604	7,927,104	6,866,562	86.6	1.4	1.4
Instituto Nacional de Formación Profesional y Cap. para el Des. Humano	34,039,700	2,570,765	36,610,465	24,961,022	68.2	6.5	5.0
Instituto Panameño de Deportes	3,500,000	4,010,309	7,510,309	4,575,103	60.9	1.3	0.9
Instituto Panameño de Rehabilitación Especial	1,116,000	514,300	1,630,300	1,616,710	99.2	0.3	0.3
Ministerio de Desarrollo Social	797,000	879,505	1,676,505	1,488,901	88.8	0.3	0.3
Ministerio de Economía y Finanzas	250,000	550,000	800,000	800,000	100.0	0.1	0.2
Ministerio de Educación	149,096,650	77,464,186	226,560,836	200,734,608	88.6	40.4	40.3
Ministerio de la Presidencia	100,000	232,920	332,920	351,146	99.5	0.1	0.1
Sistema Estatal de Radio y Televisión	480,000	258,250	738,250	705,008	95.5	0.1	0.1
Universidad Autónoma de Chiriquí	2,430,500	0	2,430,500	2,034,302	83.7	0.4	0.4
Universidad de Panamá	2,067,000	11,263,089	13,330,089	12,431,285	93.3	2.4	2.5
Universidad Especializada de las Américas	2,747,700	0	2,747,700	2,150,831	78.6	0.5	0.4
Universidad Marítima Internacional de Panamá	557,500	0	557,500	357,223	64.1	0.1	0.1
Universidad Tecnológica de Panamá	3,462,000	1,000,000	4,462,000	2,666,603	59.8	0.8	0.5
Zona Libre de Colón	0	36,942	36,942	36,942	100.0	0.0	0.0
Energía	12,387,750	13,305,053	25,692,803	19,819,960	77.1	100.0	100.0
Empresa de Generación Eléctrica	1,000,000	0	1,000,000	262,941	26.3	3.9	1.3
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	87,750	37,565	125,315	100,640	80.3	0.5	0.5
Ministerio de la Presidencia	11,300,000	13,267,488	24,567,488	19,456,379	79.2	95.6	98.2
Finanzas	70,968,300	1,038,015	72,006,315	35,319,814	49.1	100.0	100.0
Banco de Desarrollo Agropecuario	61,904,000	-2,040,000	59,864,000	25,613,244	42.8	83.1	72.5
Banco Hipotecario Nacional	5,453,800	-257,985	5,195,815	3,265,110	62.8	7.2	9.2
Instituto de Seguro Agropecuario	3,610,500	3,336,000	6,946,500	6,441,460	92.4	9.6	18.2
Industria, Comercio y Turismo	252,853,249	74,704,459	327,557,708	294,603,203	89.9	100.0	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	1,150,000	0	1,150,000	457,660	39.8	0.4	0.2
Autoridad de la Micro, Mediana y Pequeña Empresa	19,916,000	-188,225	19,727,775	18,169,496	92.1	6.0	6.2
Autoridad de Turismo de Panamá	28,075,900	15,108,482	43,184,382	35,565,925	82.4	13.2	12.1
Instituto de Mercadeo Agropecuario	29,545,600	21,398,152	50,943,752	49,701,014	97.6	15.6	16.9
Ministerio de Comercio e Industrias	12,700,000	7,774,892	20,474,892	18,287,358	89.3	6.3	6.2
Ministerio de la Presidencia	156,750,000	27,319,818	184,069,818	168,602,348	91.6	56.2	57.2
Zona Libre de Colón	4,715,749	3,291,340	8,007,089	3,819,402	47.7	2.4	1.3
Justicia	66,303,255	38,437,855	104,741,110	75,410,018	72.0	100.0	100.0
Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG)	1,400,000	-42,070	1,357,930	1,313,918	96.8	1.3	1.7
Ministerio de Gobierno	36,725,000	32,554,802	69,279,802	48,535,183	70.1	66.1	64.4
Órgano Judicial	19,301,100	3,732,248	23,033,348	15,146,897	65.8	22.0	20.1
Procuraduría de la Administración	19,405	217,087	236,492	236,272	99.9	0.2	0.3

Procuraduría de la Nación	8,495,000	1,901,288	10,396,288	9,775,999	94.0	9.9	13.0
Tribunal de Cuentas	362,750	74,500	437,250	401,749	91.9	0.4	0.5
Minería	32,500	168,107	200,607	107,361	53.5	100.0	100.0
Ministerio de Comercio e Industrias	32,500	168,107	200,607	107,361	53.5	100.0	100.0
Protección ciudadana	128,026,550	85,736,422	213,762,972	177,943,803	83.2	100.0	100.0
Defensoría del Pueblo	282,500	0	282,500	208,115	73.7	0.1	0.1
Ministerio de Gobierno	3,500,000	0	3,500,000	2,845,430	81.3	1.6	1.6
Ministerio de la Presidencia	760,250	15,886,479	16,646,729	16,256,128	97.7	7.8	9.1
Ministerio de Seguridad Pública	123,483,800	67,213,943	190,697,743	158,634,130	83.2	89.2	89.1
Ministerio de Vivienda	0	2,636,000	2,636,000	0	0.0	1.2	0.0
Salud	678,519,351	196,823,028	875,342,379	641,274,155	73.3	100.0	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	3,598,800	0	3,598,800	368,542	10.2	0.4	0.1
Autoridad de Aseo Urbano Domiciliario (AAUD)	22,750,000	0	22,750,000	16,420,408	72.2	2.6	2.6
Caja del Seguro Social	98,766,100	127,163,331	225,929,431	127,640,413	56.5	25.8	19.9
CENETIM	6,000	-4,000	2,000	0	0.0	0.0	0.0
Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudio de la Salud	1,263,000	0	1,263,000	1,136,059	89.9	0.1	0.2
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales	90,338,700	-5,274,326	85,064,374	56,990,482	67.0	9.7	8.9
Ministerio de Economía y Finanzas	270,000	0	270,000	266,382	98.7	0.0	0.0
Ministerio de Educación	11,895,550	9,167,310	21,062,860	20,434,593	97.0	2.4	3.2
Ministerio de la Presidencia	80,409,200	16,874,541	97,283,741	97,259,161	100.0	11.1	15.2
Ministerio de Salud	367,780,250	46,956,322	414,736,572	317,620,618	76.6	47.4	49.5
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT)	1,000,000	1,500,000	2,500,000	2,500,000	100.0	0.3	0.4
Zona Libre de Colón	441,751	439,851	881,602	637,495	72.3	0.1	0.1
Telecomunicaciones	665,000	2,082,199	2,747,199	2,563,673	93.3	100.0	100.0
Ministerio de Gobierno	175,000	121,175	296,175	138,588	46.8	10.8	5.4
Sistema Estatal de Radio y Televisión	490,000	1,961,024	2,451,024	2,425,085	98.9	89.2	94.6
Trabajo y Bienestar Social	304,678,730	476,478,916	781,157,645	763,147,098	97.7	100.0	100.0
Caja del Seguro Social	1,285,000	2,446,992	3,731,992	1,888,539	50.6	0.5	0.2
Instituto Nacional de la Mujer	172,000	-2,541	169,459	129,966	76.7	0.0	0.0
Ministerio de Desarrollo Social	178,041,530	-2,271,937	175,769,593	168,916,800	96.1	22.5	22.1
Ministerio de Economía y Finanzas	67,460,000	138,860,596	206,320,596	198,366,508	96.1	26.4	26.0
Ministerio de Gobierno	5,000,000	-2,429,483	2,570,517	2,564,147	99.8	0.3	0.3
Ministerio de la Presidencia	47,798,400	337,740,203	385,538,603	384,895,105	99.8	49.4	50.4
Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral	1,394,500	0	1,394,500	1,289,890	92.5	0.2	0.2
Secretaría Nacional de la Discapacidad	1,893,000	275,552	2,168,552	1,915,612	88.3	0.3	0.3
Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia	752,600	265,000	1,017,600	811,580	79.8	0.1	0.1
Tribunal Electoral	0	26,000	26,000	26,000	100.0	0.0	0.0
Universidad Especializada de las Américas	41,700	290,000	331,700	224,418	67.7	0.0	0.0
Zona Libre de Colón	840,000	1,278,533	2,118,533	2,118,532	100.0	0.3	0.3
Transporte	1,821,816,146	109,177,844	1,930,993,990	1,773,141,839	91.8	100.0	100.0
Agencia del Área Panamá Pacífico	578,000	0	578,000	0	0.0	0.0	0.0

Autoridad Aeronáutica Civil	21,451,150	26,787,801	43,238,951	38,624,230	80.1	2.5	2.2
Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre	27,807,650	63,695,815	91,503,465	85,490,632	93.4	4.7	4.8
Autoridad Marítima de Panamá	14,233,450	2,758,006	16,991,456	13,145,771	77.4	0.9	0.7
Ministerio de Desarrollo Agropecuario	2,610,218	-102,735	2,507,483	1,960,483	78.2	0.1	0.1
Ministerio de Economía y Finanzas	7,724,800	88,785,341	96,510,141	55,700,349	57.7	10.0	3.1
Ministerio de la Presidencia	1,045,760,000	-320,786,702	724,973,298	696,851,152	96.1	37.5	39.3
Ministerio de Obras Públicas	697,648,378	246,829,669	944,478,047	877,721,579	92.9	48.9	49.5
Zona Libre de Colón	4,002,500	1,210,649	5,213,149	3,647,643	70.0	0.3	2.0
Vivienda	52,132,200	75,518,274	127,650,474	121,413,002	95.1	100.0	100.0
Banco Hipotecario Nacional	300,000	542,185	842,185	41,400	4.9	0.7	0.0
Ministerio de Economía y Finanzas	500,000	0	500,000	464,112	92.8	0.4	40.0
Ministerio de Vivienda	51,332,200	74,976,089	126,308,289	120,907,490	95.7	98.9	99.6
Total general	4,135,339,103	1,408,805,611	5,544,144,714	4,795,277,362	86.5		

Fuente: Dirección de Programación de Inversiones. Ministerio de Economía y Finanzas.

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICAS

Cuadros

Cuadro N° 1 Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Vigencias Comprendidas entre los Años 1995 y 2013. Según Períodos de Gestión, en miles de Balboas y porcentaje de ejecución.

Cuadro N° 2 Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras. Según los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones Vigencias del 2010 al 2013, en miles de Balboas.

Cuadro N° 3 Distribución de Ajustes Presupuestarios de Inversiones Públicas No Financieras. Según Área Institucional e Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 4 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Distribución de Ajustes Presupuestarios, según Sector. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 5 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Distribución de Ajustes Presupuestarios, Según Ubicación Geográfica. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 6 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Distribución de Ajustes Presupuestarios, según Objeto del Gasto. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 7 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Distribución de Ajustes Presupuestarios, según Fuente de Financiamiento. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 8 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Área Institucional. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 9 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Instituciones del Gobierno Central I. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 10 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Instituciones Descentralizadas. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 11 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Empresas Públicas. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 12 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Intermediarios Financieros. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 13 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Clasificación del Gasto según su Objeto. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 14 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Fuente de Financiamiento. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 15 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Participación Porcentual en el Presupuesto Ejecutado y Fuentes de Financiamiento. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 16 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Tipo de Inversión. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 17 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Proyectos de Infraestructura. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 18 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Proyectos de Equipamiento. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 19 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Tipo de Préstamo Financiero. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 20 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Por Sector Económico. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 21 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Salud según Institución. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 22 Ejecución Física del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Proyectos más significativos del Sector Salud. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 23 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Alimentos entregados en centros escolares. Porcentaje de ejecución al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 24 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Educación y Cultura según por Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 25 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Vivienda - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 26 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 27 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Transporte - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 28 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Energía - Según Instituciones Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 29 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Telecomunicaciones - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 30 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Agropecuario - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 31 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 32 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Finanzas - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 33 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Administración y Servicios Generales - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 34 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Justicia - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 35 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Minería- Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 36 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sector Protección Ciudadana - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 37 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Sector Ambiente - Según Instituciones. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 38 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Según Ubicación Geográfica. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 39 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Provincia de Bocas Del Toro. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 40 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Provincia de Coclé. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 41 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Provincia de Colon. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 42 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Provincia de Chiriquí. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 43 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Provincia de Darién. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 44 Ejecución del Presupuesto de Inversiones No Financieras Por Sector - Provincia de Herrera. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 45 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Provincia de Los Santos. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 46 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Provincia de Los Panamá. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 47 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Provincia de Veraguas. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 48 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Comarca Emberá Wounaan. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 49 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Comarca Madugandi. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 50 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Comarca Wargandi. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 51 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Comarca Guna Yala. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 52 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector - Comarca Ngöbe Buglé. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 53 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Misiones atendidas por etapa de los Proyectos. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 54 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Proyectos en Formulación. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 55 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Proyectos en Ejecución por Organismo Financiero. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 56 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Organismo Financiero. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 57 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Distribución de Financiamiento Externo, según Sector. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 58 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Avances de Obras del Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 59 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sub-sector Agua y Saneamiento - Proyecto PASAP. Construcción de Letrinas por Provincia. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 60 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Sub-sector Agua y Saneamiento Proyecto PASAP. Construcción de Acueductos por Provincia. Al 31 de diciembre de 2013.

Cuadro N° 61 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Obras del Programa Unificado de Desarrollo en el Sector de Agua y Saneamiento. Al 31 de diciembre de 2013.

Gráficas

Gráfica N° 1 Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Presupuesto modificado vs Ejecutado. Vigencias Comprendidas entre los Años 1995 y 2013. Según Periodos de Gestión, en miles de Balboas y porcentaje de ejecución.

Gráfica N° 2 Ejecución del Programa de Inversiones Públicas No Financieras. Según los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones Vigencias del 2010 al 2013.

Gráfica N° 3 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Según Área Institucional. Al 31 de diciembre de 2013.

Gráfica N° 4 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Clasificación del Gasto según su Objeto. Al 31 de diciembre de 2013.

Gráfica N° 5 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Según Tipo de Inversión. Al 31 de diciembre de 2013.

Gráfica N° 6 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Proyectos de Infraestructura. Al 31 de diciembre de 2013.

Gráfica N° 7 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Proyectos de Equipamiento. Al 31 de diciembre de 2013.

Gráfica N° 8 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras. Según Tipo de Préstamo Financiero. Al 31 de diciembre de 2013.

Gráfica N° 9 Ejecución del Presupuesto de Inversiones Públicas No Financieras Por Sector Económico. Al 31 de diciembre de 2013.

Gráfica N° 10 Inversión Per cápita por provincia. Al 31 de diciembre del 2013.

GLOSARIO

AAC	Autoridad Aeronáutica Civil
APP	Agencia Panamá Pacífico
AAUD	Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario
AMPYME	Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
ARAP	Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá
ACODECO	Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
ATTT	Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre
ATP	Autoridad de Turismo de Panamá
AMP	Autoridad Marítima de Panamá
ANATI	Autoridad Nacional de Administración de Tierras
ANA	Autoridad Nacional de Aduanas
ASEP	Autoridad Nacional de los Servicios Públicos
ANAM	Autoridad Nacional del Ambiente
AIG	Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental
BEI	Banco Europeo de Inversiones
BDA	Banco de Desarrollo Agropecuario
BHN	Banco Hipotecario Nacional
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CSS	Caja de Seguro Social
DGCP	Dirección General de Contrataciones Públicas
EGESA	Empresa de Generación Eléctrica, S.A.
ENA	Empresa Nacional de Autopistas
ICGES	Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud
IDAAN	Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales
IDIAP	Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá
IMA	Instituto de Mercadeo Agropecuario
ISA	Instituto de Seguro Agropecuario
INAC	Instituto Nacional de Cultura
INADEH	Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano
INAMU	Instituto Nacional de la Mujer
IPACOOOP	Instituto Panameño Autónomo Cooperativo
IPHE	Instituto Panameño de Rehabilitación Especial
IFARHU	Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos
JICA	Agencia de Cooperación Internacional del Japón
LNB	Lotería Nacional de Beneficencia
MIDA	Ministerio de Desarrollo Agropecuario
MIDES	Ministerio de Desarrollo Social
MEDUCA	Ministerio de Educación
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas

MOP	Ministerio de Obras Públicas
MINSA	Ministerio de Salud
MIRE	Ministerio de Relaciones Exteriores
MITRADEL	Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
MIVIOT	Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial
OJ	Órgano Judicial
PA	Procuraduría de la Administración
PANDEPORTES	Instituto Panameño de Deportes
PGN	Procuraduría General de la Nación
SENACYT	Secretaría Nacional de Ciencias, Tecnología e Innovación
SENADIS	Secretaría Nacional de Discapacidad
SENNIAF	Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia
SPF	Sector Público Financiero
SPNF	Sector Público No Financiero
SERTV	Secretaría Estatal de Radio y Televisión
TACP	Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas
TE	Tribunal Electoral
UNACHI	Universidad Autónoma de Chiriquí
UP	Universidad de Panamá
UDELAS	Universidad Especializada de Las Américas
UMP	Universidad Marítima de Panamá
UTP	Universidad Tecnológica de Panamá

